

Portfólio de Projetos de TIC

Maio de 2018


A white line graphic consisting of several connected line segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

TRT8
Pará e Amapá

Visão geral dos Projetos de TIC

Projetos MGP-TI
3,9%

Em Aprovação
6,9%

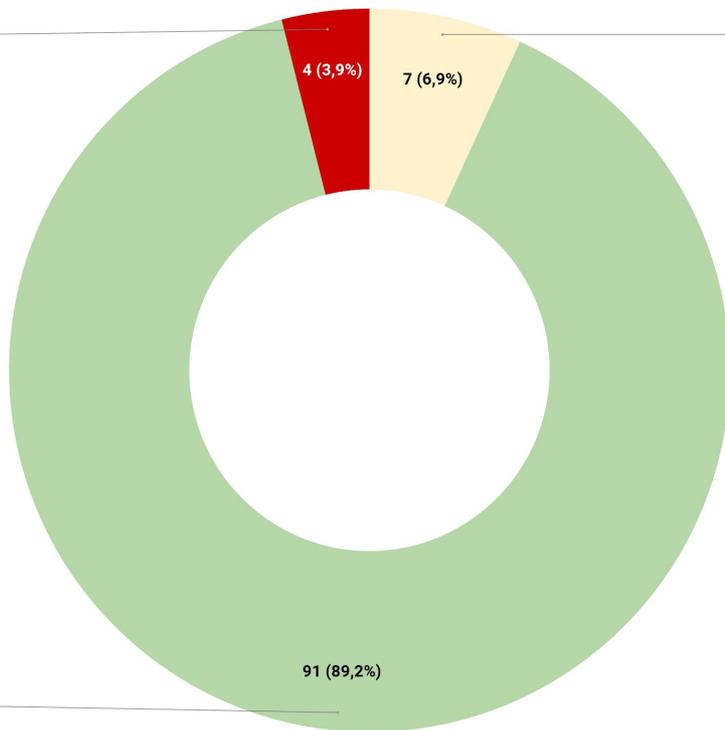


Projeto Simplificado
89,2%

Projetos em aprovação: projetos que ainda aguardam autorização do Comitê de Governança de TIC.

Projetos MGP-TI: projetos autorizados que seguem o processo de Gestão de Projetos definido na Metodologia de Gestão de Projetos de TI da SETIN.

Projetos simplificados: projetos autorizados que seguem o processo simplificado de Gestão de Projetos.

Composição do Portfólio de Projetos de TIC

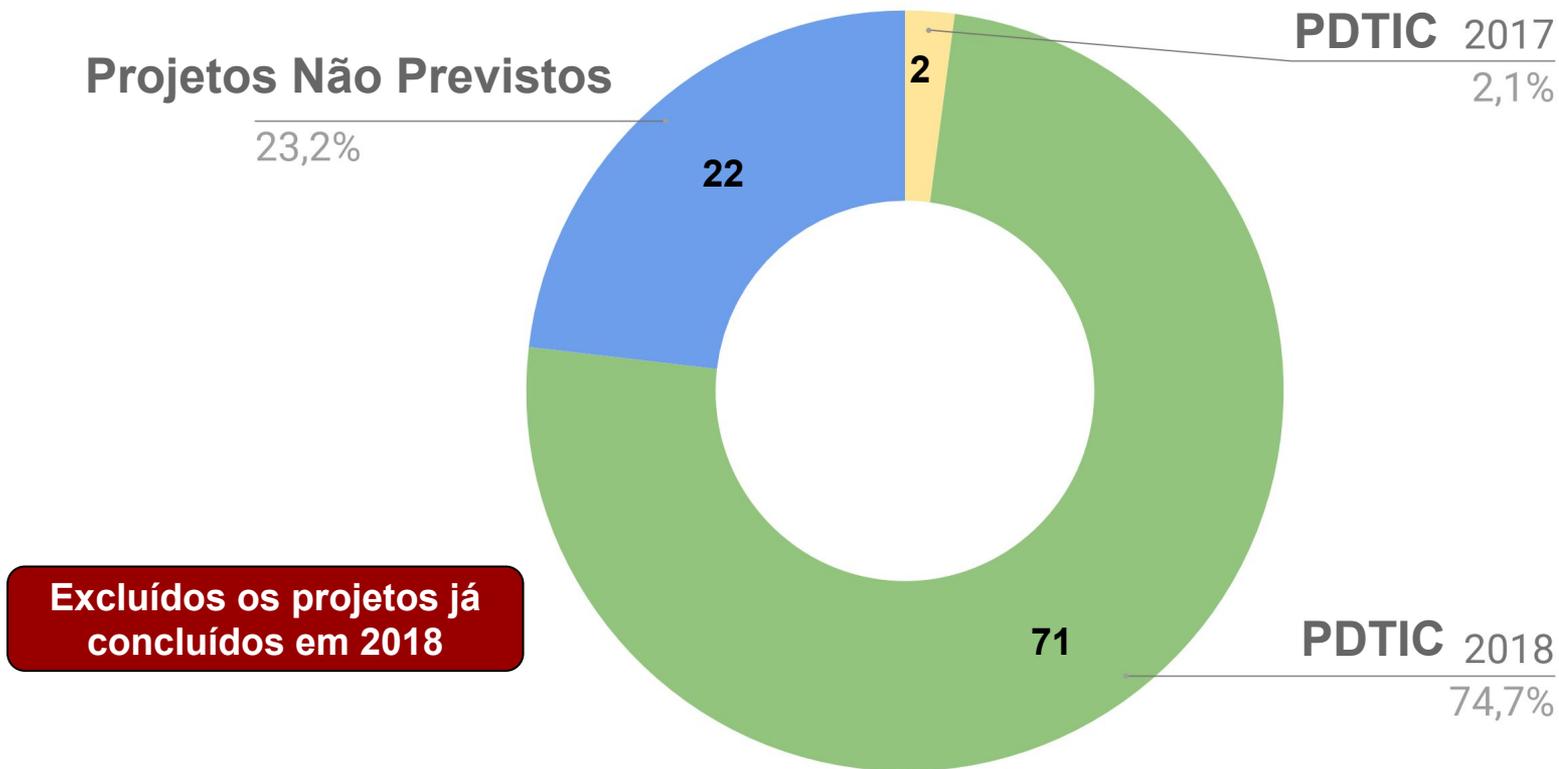

Projetos do PDTIC 2018

**Total de Projetos
do PDTIC 2018**

85

PROJETOS

**Projetos CONCLUÍDOS
do PDTIC 2018**

14

PROJETOS

**Completude do
PDTIC 2018**

16%

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
EXECUTADOS em 2018

31

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
CONCLUÍDOS em 2018

9

PROJETOS

Restam a concluir

22

PROJETOS

Projetos da SETIN

**Concluídos ATÉ
maio de 2018**

40

PROJETOS

**Concluídos EM
maio de 2018**

10

PROJETOS

**Restam a
concluir**

95

PROJETOS

Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Segurança

11,6%

Governança


17,9%

COINS

20,0%

COSIS

50,5%

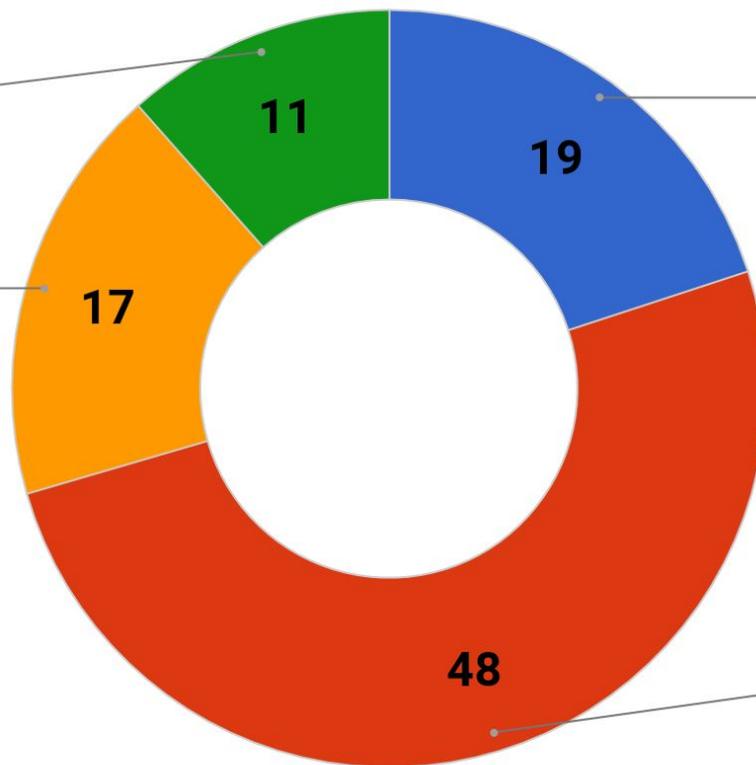

Projetos Concluídos em maio de 2018

Projetos Simplificados

PDTIC	Projeto	Grupo	Situação atual	Gerente	Analista	Executor
2017	TI2006164: [PJe] Implantar o projeto CCLE e auto	COSIS	Concluído	Diego V.	Victor G.	Marcos O.
2018	TI2115202: Instituir formalmente o processo de monitoramento dos	COINS	Concluído	Geraldo D.	Simonne C.	Thiago A.
Nenhum	TI2210289: [CEJUSC] Requerimento de agendamento audiência de conciliação	COSIS	Concluído	Diego V.	Victor G.	Rogério P.
2018	TI2115201: Instituir formalmente o processo de capacidade de	COINS	Concluído	Rafael C.	Rafael C.	Rafael C.
2018	TI2115200: Instituir formalmente o processo de disponibilidade de	COINS	Concluído	Rafael C.	Rafael C.	Rafael C.
2018	TI2210450: [CEJUSC] Implementar solução para publicação de um	COSIS	Concluído	Estillac F.	Aline S.	Estillac F.
2018	TI2107192: Elaborar o Relatório de Execução do Plano	GOV	Concluído	Diego M.	Diego M.	Diego M.
Nenhum	TI2182825: [GEPREC] Atualização de Cálculo e pagamento de	COSIS	Concluído	Diego V.	Victor G.	Renato S.
Nenhum	TI2249189: Implantação da ferramenta de relatoria de acesso	SI	Concluído	Alfredo G.	Alfredo G.	Alfredo G.

Projetos aguardando aprovação e priorização

Em Aprovação

Projeto	↑↓ Situação atual	↓↑ Responsável	↑↓ Demandante
2211007: [ASCOM] Sustentabilidade pelo Hórus	Parecer técnico	COSIS	ASCOM
2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos órgãos colegiados no Portal	Parecer técnico	COSIS	SEJUD
2244472: Integração PJe x SAPIENS via MNI	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2252727: PAINEL DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES UTILIZADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL	Parecer técnico	COSIS	COMAT
2257987: PROJETO DE ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ELETRÔNICA CORREICIONAL - GEC	Parecer técnico	COSIS	COR08
2263129: Progecom - v3.0.0 - Módulo do SIGEP para Gestão de Competências	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2283089: Implantação de solução de ponto eletrônico no TRT da 8ª Região	Parecer técnico	COSIS	DIGER

Metodologia de Desenvolvimento de Software

Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:

Victor Gonçalves

Parecer gerencial:

Após realização da última reunião para validação da metodologia de sustentação, algumas modificações foram sugeridas, para contemplar a realidade institucional de sustentação de software da COSIS. Tais modificações foram realizadas e a metodologia encontra-se em processo de validação por parte dos gestores da COSIS. Após a validação, será dado andamento a publicação da Metodologia de Sustentação.

Devido à importância das atividades restantes e da dificuldade de alocar equipe no projeto, não é aconselhável realizar encurtamentos no cronograma.

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.1
Cronograma	v1.0
Entrega da Metodologia	04/04/2018
Término do Projeto	18/04/2018

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto	75%
Cumprimento de Prazo	0,50 50% de atraso
Término do Projeto	03/09/2018

Implantação de Controles ISO 27001

Segurança de Informação

Gerente do Projeto:

Márcel Mota

Parecer gerencial:

Conforme apresentado na Reunião de Análise da Estratégia (RAE), até o momento foram implantados 22 controles da ISO 27001.

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.0
Cronograma	v1.0
Data de Término	20/02/2018

Desempenho do Projeto

Compleitude do Projeto	80%
Cumprimento de Prazo	0,68 38% de atraso
Término Previsto	07/06/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto	Término Previsto
2018	TI2115197: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de ativos de TIC	Média	Geraldo Durães	03/08/2018
2018	TI2115198: Revisão 2018 do catálogo com os acordos de nível de serviços essenciais de TIC	Baixa	Geraldo Durães	18/09/2018
2018	TI2115354: Renovação do parque de ativos de rede corporativa	Baixa	Rafael Cruz	27/11/2018
2018	TI2115357: Implantação de infraestrutura do prédio Gaspar Viana	Baixa	Gilmara Silva	27/11/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2115295: Implantação da Rede Wireless	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	 22/05/2018
2018	TI2115190: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de central de serviços	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	 13/06/2018
2018	TI2115192: Revisão 2018 do processo de gerenciamento do catálogo de serviços	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	 13/06/2018
2018	TI2115193: Revisão 2018 do processo de gerenciamento dos acordos de nível	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	 13/06/2018
2018	TI2115194: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de requisições	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	 13/06/2018
2018	TI2115195: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de incidentes	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	 13/06/2018
2018	TI2115356: Modernização da infraestrutura de acesso ao PJe nas salas de	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	21/06/2018
2018	TI2115343: Segregação das Redes dos Ambientes de Produção, Homologação, Desenvolvimento e	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	04/07/2018
2018	TI2115345: Virtualização dos Desktops Corporativos	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	01/08/2018
2018	TI2006221: Elaboração do Plano de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços de	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	22/08/2018
2018	TI2006205: Implantação do site backup corporativo em nuvem	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	21/09/2018
2018	TI2115350: Implantação da nova rede de dados corporativa de interligação da	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	25/09/2018
2018	TI2006213: Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	17/10/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2017	TI2009452: Implantar o Gerenciamento de Catálogo de Serviço e Gerenciamento de	Simonne Callegario	Validação da Entrega Final	
2018	TI2115203: Instituir formalmente o processo de backup e restore de dados	Rafael Cruz	Execução	 30/05/2018

Coordenadoria de Sistemas

Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto	Término Previsto
Nenhum	TI2196623: [GEPREC] Mudança de status - Beneficiário de prioridade processual.	Alta	Diego Valdez	15/08/2018
2018	TI2118645: PostgreSQL - Separar o cluster de dados do PJe	Média	Anderson Maia	30/11/2018
2018	TI2118652: SEBAD - Documentar procedimentos de restauração	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118660: SEBAD - Elaborar planos de contingência	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118657: SEBAD - Elaborar política de desligamento / religamento das máquinas	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118653: [SEBAD] Elaborar / Documentar estratégia de manutenção	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2179617: [ConectorPJe] Implantação da solução	Média	Herbet Silva	Não Planejado
Nenhum	TI2179916: [NUGEP] Implantação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes	Alta	Herbet Silva	Não Planejado
Nenhum	TI2261388: [PROAD] Implantação da Consulta Externa de Processos Administrativos	Média	Mônica Guimaraes	Não Planejado
Nenhum	TI2266143: [SILC] Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Média	Geraldo Barros	Não Planejado
Nenhum	TI2255945: [RECAD] Migração dos Dados RECAD para MentoRH	Alta	Mônica Guimaraes	Não Planejado
Nenhum	TI2260126: [COSIS] - Catálogo de Sistema	Média	Mônica Guimaraes	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2082740: [SAM] Integração com o e-gestão para o cálculo do índice	Estillac Filho	Especificação de requisitos	 18/06/2018
2018	TI2118173: [SAM] Padronização do mecanismo de autenticação	Renan Ferreira	Especificação de requisitos	 18/06/2018
2018	TI2115507: [GEPREC] Aprimoramento do registro de pagamentos fora do precatórioREC	Diego Valdez	Especificação de requisitos	23/07/2018
2018	TI2154016: [GEPREC] Prazo de Suspensão	Diego Valdez	Especificação de requisitos	30/07/2018
2018	TI2040406: [SeCAD] Certidão de aprovação em concurso público	Estillac Filho	Na Fila para Execução	06/08/2018
2018	TI2023546: [COAPP] Indenização de transporte	Estillac Filho	Na Fila para Execução	27/08/2018
2018	TI2036632: [Intranet] Padronização de logins de sistemas	Diego Valdez	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2118647: [Oracle] Migrar RAC de produção para Hiperconvergência, na versão 12	Anderson Maia	Na Fila para Execução	30/11/2018
2018	TI2006202: [SEBAD] Estabelecimento de política de teste, manutenção, desligamento/religamento e plano	Anderson Maia	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2118269: [e-Corr] Solução de integração dos sistemas da Corregedoria	Estillac Filho	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2119157: [FolhaWeb] Implantação do sistema para homologação	Geraldo Barros	Na Fila para Execução	19/12/2018
2018	TI2210223: [SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	Geraldo Barros	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2117027: [COSIS] Revisão do catálogo dos sistemas	Victor Gonçalves	Paralisado por pendência	

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
Nenhum	TI2210262: [e-Gestão] Evolução do extrator do legado para versão 2.0	Diego Valdez	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2228509: [PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau	Diego Valdez	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do 2º grau	Diego Valdez	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2250413: [COSIS] Implantação de trabalho baseada em tarefas	Renan Ferreira	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2254521: [RECAD] Recadastramento de Estagiários, Prestadores e Cedidos	Mônica Guimaraes	Em Detalhamento Técnico	Não Planejado
Nenhum	TI2238097: [GECJ] GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO - GECJ POR	Mônica Guimaraes	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2242981: Subportal da Ouvidoria TRT8	Reinaldo Carvalho	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência	Reinaldo Carvalho	Aprovação do Escopo	Não Planejado
Nenhum	TI2228483: Alteração de Estrutura e Design do Campus Virtual do TRT8	Jose Tarrío	Especificação de requisitos	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2006194: [MySQL] Implantação do novo cluster de dados de produção	Anderson Maia	Execução	29/06/2018
2018	TI2118276: [APP TRT8] Evolução do aplicativo	Estillac Filho	Execução	03/09/2018
2018	TI2119184: [SIGEP] Migração de dados do MENTORH	Daniel Carvalho	Execução	31/12/2018
2018	TI2118533: [Oracle] Restaurar, via rman, backup set físico dos bancos ADMDB	Anderson Maia	Execução	31/07/2018
2018	TI2118541: [PostgreSQL] Restaurar monitoramento através do Zabbix	Anderson Maia	Execução	29/06/2018
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	Estillac Filho	Execução	18/12/2018
2018	TI2136976: [CAPE] Canal de atendimento ao público externo	Diego Valdez	Execução	02/07/2018
2018	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS,	Mônica Guimaraes	Execução	02/07/2018
Nenhum	TI2188681: [PJe-Calc] Implementação da reforma trabalhista	Renan Ferreira	Homologação	16/07/2018
Nenhum	TI2182846: [GEPREC] Certidão de Quitação de RP	Diego Valdez	Execução	20/06/2018
Nenhum	TI2252526: [e-Gestão] Manutenção de itens de pessoal	Diego Valdez	Execução	01/07/2018

Governança de TIC

Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto	Término Previsto
2018	TI2106668: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2018	Alta	Leonardo Feliciano	30/08/2018
2018	TI2107173: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019	Alta	Diego Moraes	28/09/2018
2018	TI2108954: Análise quantitativa e qualitativa dos servidores em 2018	Alta	Flávio Ramos	16/10/2018
2018	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Alta	Flávio Ramos	17/10/2018
2018	TI2107172: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2019	Alta	Flávio Ramos	16/11/2018
2018	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019	Alta	Flávio Ramos	22/11/2018
2018	TI2005293: Revisão 2018 do Processo de Gerenciamento de Mudança	Média	Leonardo Feliciano	29/11/2018
2018	TI2107189: Revisão 2018 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	Média	Raphael Vilela	29/11/2018
2018	TI2069917: Publicar os Estudos Técnicos Preliminares das Contratações de Soluções de TIC na Intranet	Média	Diego Moraes	19/12/2018
2018	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2018	Alta	Leonardo Feliciano	19/12/2018

Governança de TIC

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2107177: Definir formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e	Raphael Vilela	Na Fila para Execução	29/06/2018
2018	TI2106677: Revisão 2018 do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	Diego Moraes	Especificação de requisitos	02/07/2018
2018	TI2107194: Instituir formalmente o plantão na área de TI	Flávio Ramos	Paralisado por pendência	
2018	TI2107190: Novo portal de Governança e Gestão de TIC na Intranet	Leonardo Feliciano	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2244339: LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA AUDITORIA CNJ/COAUD	Leonardo Feliciano	Aprovação do Escopo	Não Planejado

Governança de TIC

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2069948: Implantar o processo de Planejamento de Tecnologia da Informação.	Flávio Ramos	Execução	 30/05/2018
2018	TI2107175: Instituir formalmente a Metodologia de processos de trabalho BPM	Raphael Vilela	Execução	28/06/2018

Segurança de Informação

Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto	Término Previsto
2018	TI2119243: Instituir formalmente processo de ger. de continuidade de serviços essenciais de TIC	Média	Thiago Gilla	18/07/2018
2018	TI2119191: Reorganizar a estrutura de pastas, políticas e tarefas do ePO	Média	Márcel Mota	31/08/2018
2018	TI2119225: Implantar Monitoramento de eventos de segurança	Baixa	Alfredo Gonçalves	16/11/2018
2018	TI2119204: Definir conformidade dos controles da ISO 27001 já implantados	Baixa	Márcel Mota	19/12/2018

Segurança de Informação

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2062187: Gestão de Riscos de TI	Thiago Gilla	Na Fila para Execução	31/07/2018
2018	TI2119222: Migrar regras e configurações o novo Firewall camada 7	Alfredo Gonçalves	Especificação de requisitos	27/08/2018
2018	TI2119216: Realizar a Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos	Thiago Gilla	Na Fila para Execução	30/09/2018
2018	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	Márcel Mota	Especificação de requisitos	19/12/2018

Segurança de Informação

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2119212: Instituir formalmente processo de ger. de controle de ativos de	Thiago Gilla	Execução	30/06/2018
Nenhum	TI2243117: Aplicação dos controles da Res. 8/2018	Alfredo Gonçalves	Execução	 15/06/2018

Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
 - <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente=Geraldo%20Duraes>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
