


# Portfólio de Projetos de TIC

Maio de 2022

# Planejamento e Execução dos Projetos do PDTIC 2021-2022


## Planejamento

PDTIC 2021-2022

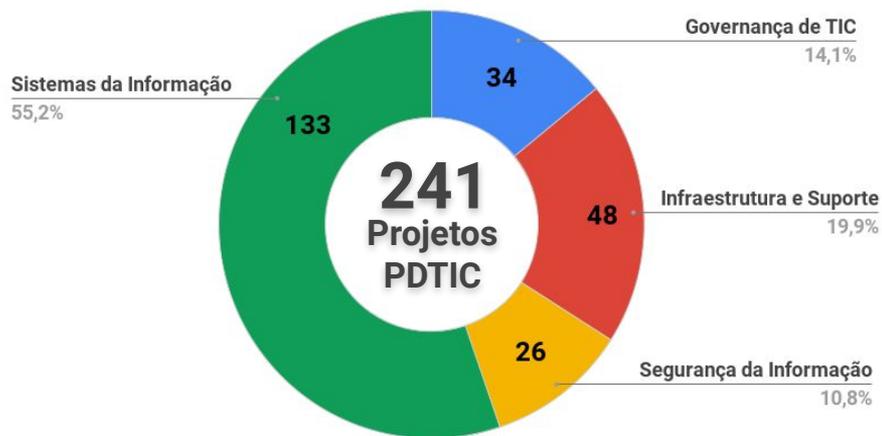

## Execução

Situação Atual

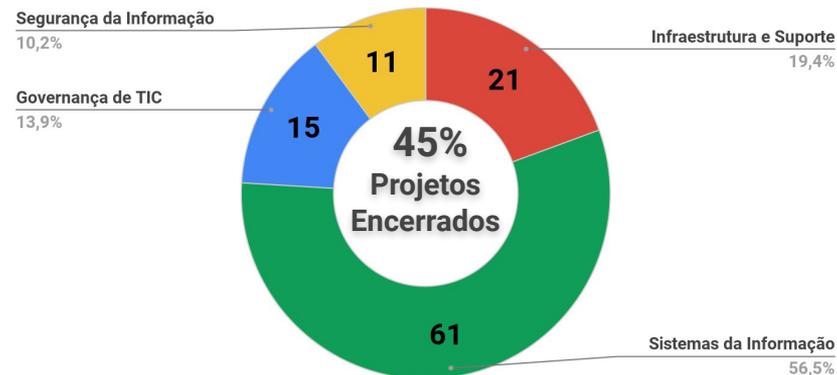

Área/Situação	Encerrados	Para Execução
Sistemas da Informação	61	72
Infraestrutura e Suporte	21	27
Segurança da Informação	11	15
Governança de TIC	15	19
SETIN (Total)	108	133

# Meta PDTIC 2021-2022

**Execução**

Mês Anterior

**41** %

**PROJETOS  
ENCERRADOS**

**Execução**

Mês Atual

**45** %

**PROJETOS  
ENCERRADOS**

**Meta PDTIC**

2021-2022

**60** %

**PROJETOS  
ENCERRADOS**

# Projetos Inicialmente Não Previstos no PDTIC

Total de Projetos  
Não Previstos

10

PROJETOS

Total de Projetos  
Não Previstos  
Encerrados

3

PROJETOS


Restam a finalizar

7

PROJETO

# Backlog de Projetos de TIC

## Situação atual

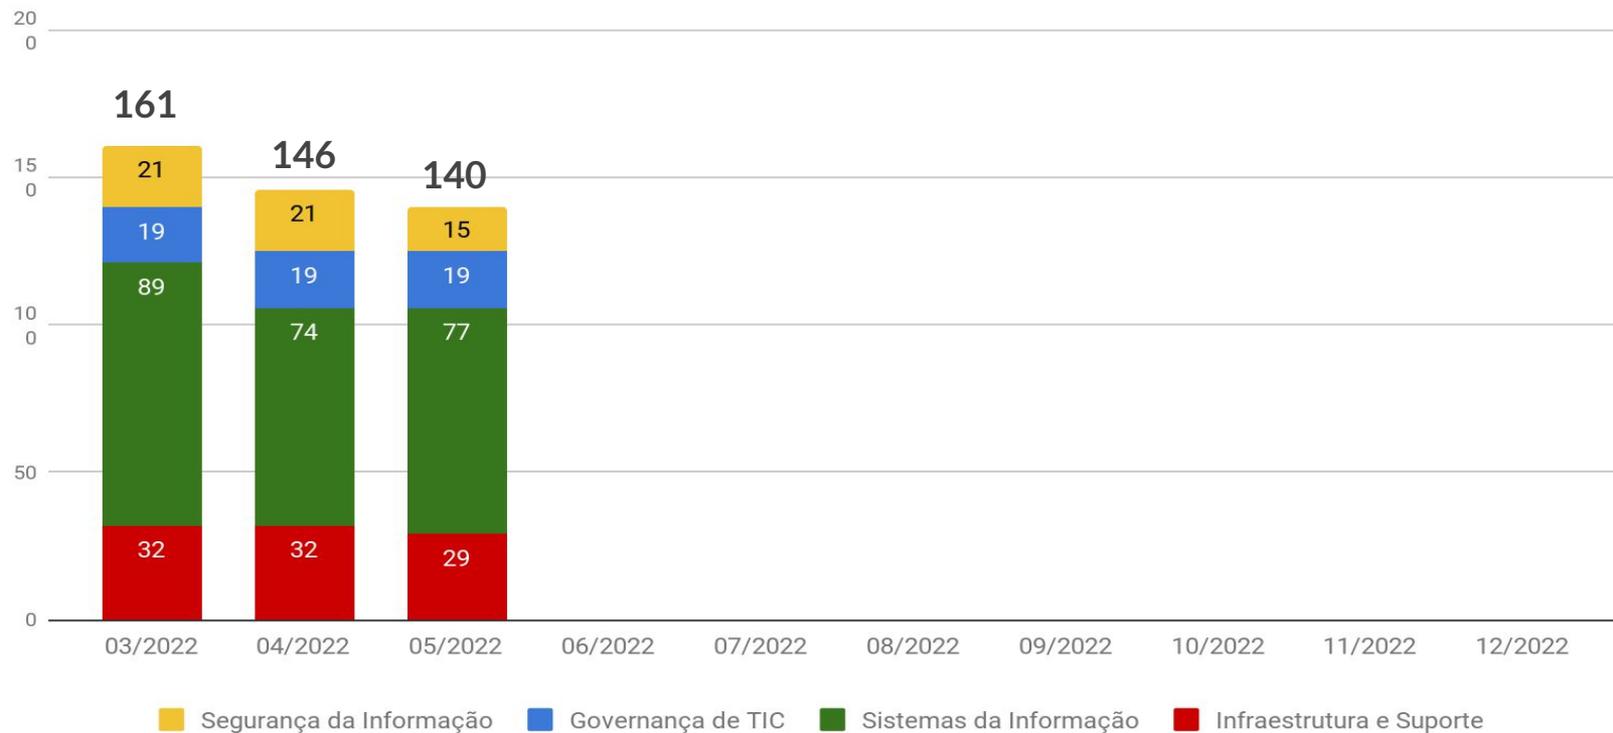

# Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



Informação obtida através da ferramenta Strategic Adviser

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# COSIS

Código	Projeto	Gerente do Projeto	Situação Atual	Término Previsto
TI2999050	[SIGEP-Estagiários] Implantação do Módulo Estagiários	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	10/12/2021
TI2995353	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos periódicos (Folha) - FASE III	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	08/04/2022
TI2995340	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos não periódicos - FASE II	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	08/11/2021
TI2210223	[SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	31/03/2021
TI2995335	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos de tabela - FASE I	ROGÉRIO PIMENTEL	Em Execução	08/07/2021
TI2903246	[GCERT] implantação do Sistema de Levantamento de Certificado Digital	ROGÉRIO PIMENTEL	Em Execução	30/04/2021
TI2927874	[PROAD] Atualização do sistema para a versão 4.0 em Containers	ROGÉRIO PIMENTEL	Na Fila para Execução	30/04/2021
TI2252727	[Painel de Consumo] Desenvolvimento de dashboards de materiais de consumo e permanentes	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	30/06/2021
TI2999045	[SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	31/05/2021
TI2999040	[SIGEP-SIGS] Implantação do Sistema de Gestão em Saúde	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	15/10/2021
TI2993568	[ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE II	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	17/12/2021
TI2986166	[SEGEPE] Desenvolvimento e automatização dos relatórios de gestão	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	29/04/2022
TI2995240	[COSIS] Revisão anual do Processo de Sustentação de Software - 2021	DIEGO VALDEZ	Em Execução	27/05/2022
TI2839992	[ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE I	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	30/07/2021
TI2228509	[PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau	HERBET SILVA	Na Fila para Execução	29/04/2022
TI2842440	[PJe] Integração PJe x SAJ via MNI (PGE-Pa)	HERBET SILVA	Especificação de Requisitos	31/05/2022
TI3014717	[Robô TRT9] Implantação de solução para agendamento de audiências no Zoom e as atividades complementares de secretaria	HERBET SILVA	Aguardando Planejamento	31/05/2022
TI2903770	[NUDES] Definição de Template Padrão de Projeto no Redmine	ESTILLAC FILHO	Em Execução	03/06/2022
TI2945765	[PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.10.0	ESTILLAC FILHO	Homologado - Preparar Validação	27/05/2022

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

GOV

Código	Projeto	Gerente do Projeto	Situação Atual	Término Previsto
TI3003764	IGGP - TCU 2022	FLAVIO RAMOS	Aguardando Planejamento	11/04/2022

# Projetos Encerrados

Maio/2022

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Analista de Req.	Executor 1	Executor 2	Situação Atual	Encerramento
TI0000838	[ID-PJ] Sistema de Identificação da Polícia Judicial	COSIS	ESTILLAC FILHO	ALINE SILVA	LIVIO DOURADO		Concluído	19/05/2022
TI2995210	[DataJud] Automatização de atualização da base local das TPU's	COSIS	DIEGO VALDEZ	DIEGO VALDEZ	LIVIO CARNEIRO	REINALDO CARVALHO	Concluído	09/05/2022
TI0000710	Implementação de política de acesso para a solução do PAM (Cyberark) para Endpoints	SI	ALFREDO GONÇALVES	MÁRCIO SILVA	MÁRCEL MOTA		Concluído	13/05/2022
TI2991162	Implantação da Solução de PAM	SI	ALFREDO GONÇALVES	MÁRCEL MOTA	MÁRCEL MOTA		Concluído	10/05/2022
TI2730127	Avaliação de Riscos de TIC	SI	ALFREDO GONÇALVES	THIAGO GILLA	THIAGO GILLA		Concluído	13/05/2022
TI2991170	Elaboração e Revisão 2021 de Políticas e Normas de Segurança da Informação	SI	ALFREDO GONÇALVES	THIAGO GILLA	THIAGO GILLA		Concluído	13/05/2022
TI3000231	Elaboração e Revisão 2021 dos Processos da Segurança da Informação	SI	ALFREDO GONÇALVES	THIAGO GILLA	THIAGO GILLA		Concluído	13/05/2022
TI2991182	Conformidade da SETIN à LGPD no processo do TRT8	SI	ALFREDO GONÇALVES	THIAGO GILLA	THIAGO GILLA		Concluído	13/05/2022

# Projetos Encerrados

Abril/2022

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Situação Atual	Encerramento
TI2552393	[Moodle] Atualização da ferramenta para a versão mais estável e conformidade de layout	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ	REINALDO CARVALHO			Concluído	27/04/2022
TI2305680	[APT] Desenvolvimento do cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ				Cancelado	27/04/2022
TI2703382	[e-Gestão] Reformulação da Carga de Litigantes	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ	ALEXSANDRO SANTOS			Concluído	27/04/2022
TI2988812	[Painel de Produtividade] Desenvolvimento de Painel de Produtividade COVID-19	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ				Cancelado	11/04/2022
TI2995207	[DataJud] Aprimoramento da rotina de carga de dados do APT para base de dados local	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ	ALEXSANDRO SANTOS	DIEGO VALDEZ	REINALDO CARVALHO	Concluído	01/04/2022
TI2486277	[COSIS] Migração dos serviços do servidor Arara	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	RENAN FERREIRA			Concluído	28/04/2022
TI2720685	[GPREC] Desenvolvimento do ofício requisitório de RPV	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI3033064	[FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase IV	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	LIVIO DOURADO			Concluído	28/04/2022
TI2945760	[COSIS] Revisão Anual do Processo de Sustentação - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI2763537	[GPREC] Integração com o PJe - Geração de Ofício Requisitório	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI2551538	[CEJUSC] Ajustes no painel eletrônico - Implementação de Salas de Apoio	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI2999285	[APP-TRT8] Refatoração do aplicativo	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	PAULO CARVALHO			Concluído	28/04/2022
TI2945759	[COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	ESTILLAC FILHO			Concluído	28/04/2022
TI2945764	[PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.9.0	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	ESTILLAC FILHO	SANDRO MONTEIRO		Concluído	28/04/2022

# Projetos Encerrados

Abril/2022

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Situação	
							Atual	Encerramento
TI2968818	[GPREC] Melhorias Arquitetural (Docker/Wildfly/Sonar)	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	SOLIMAR SILVA	FELIPE MAIA		Concluído	28/04/2022
TI3011875	[PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.14.0	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI3033182	[TRT8] Iniciativa de inovação - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	SANDRO MONTEIRO	AVELINO PENA		Concluído	28/04/2022
TI2998816	Revisão 2021 da base de conhecimento da SeSUP	Infraestrutura e Suporte	SIMONNE CALLEGARIO	SIMONNE CALLEGARIO			Concluído	06/04/2022
TI3003746	Relatório Anual 2021 de Gestão (Prestação de contas TCU)	Governança de TIC	DIEGO MORAES	DIEGO MORAES	LEONARDO FELICIANO	FLAVIO RAMOS	Concluído	01/04/2022

# Projetos

- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **10/06/2022**
