

Portfólio de Projetos de TIC

junho de 2019

A white line graphic consisting of several connected line segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

TRT8
Pará e Amapá

Planejamento dos Projetos de TIC


Acumulado no ano

Não Previstos

14,6%

Planejados para 2020

7,9%

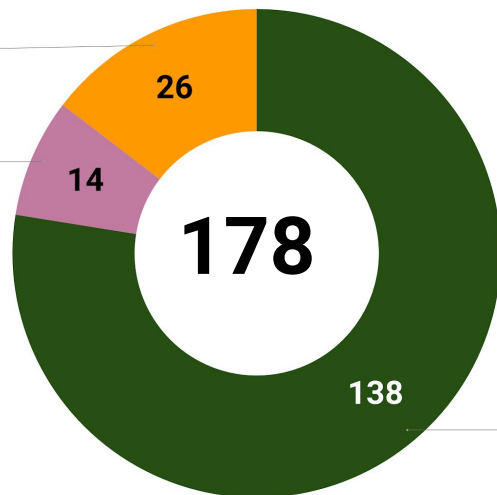

PDTIC 2019

77,5%


PDTIC 2019: projetos autorizados para serem executados em 2019 que constam na Portaria PRESI nº 186/2019

Planejados para 2020: projetos autorizados, mas que estão planejados para iniciar apenas em 2020.

Não Previstos: projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2019 e que irão ser iniciados em 2019. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura “Nenhum”.

Visão geral dos Projetos de TIC

Acumulado no ano

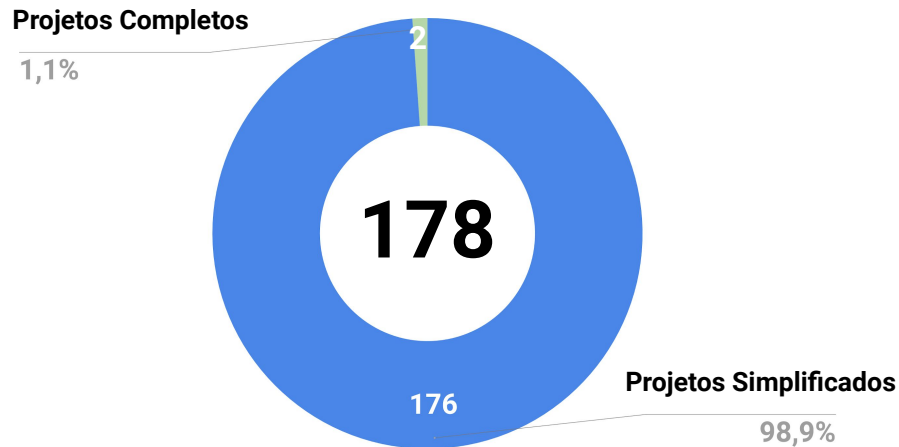

Projetos Completos: projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida completo de Gestão de Projetos.

Projetos Simplificados: projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida simplificado de Gestão de Projetos.

Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Acumulado no ano

SI

21,3%

38

COINS

14,6%

26

GOV

14,6%


26

COSIS


49,4%

88

178

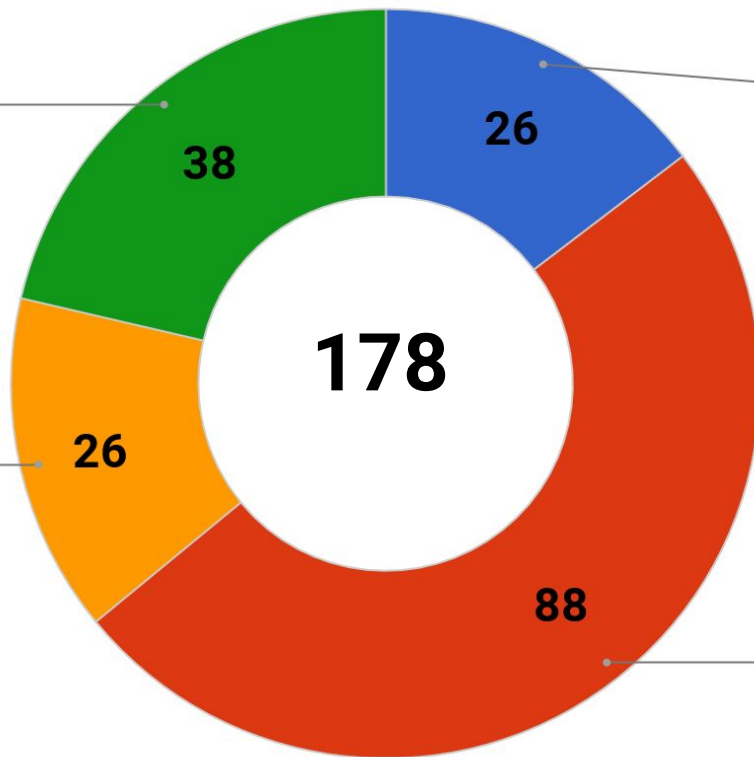

Backlog de projetos de TIC

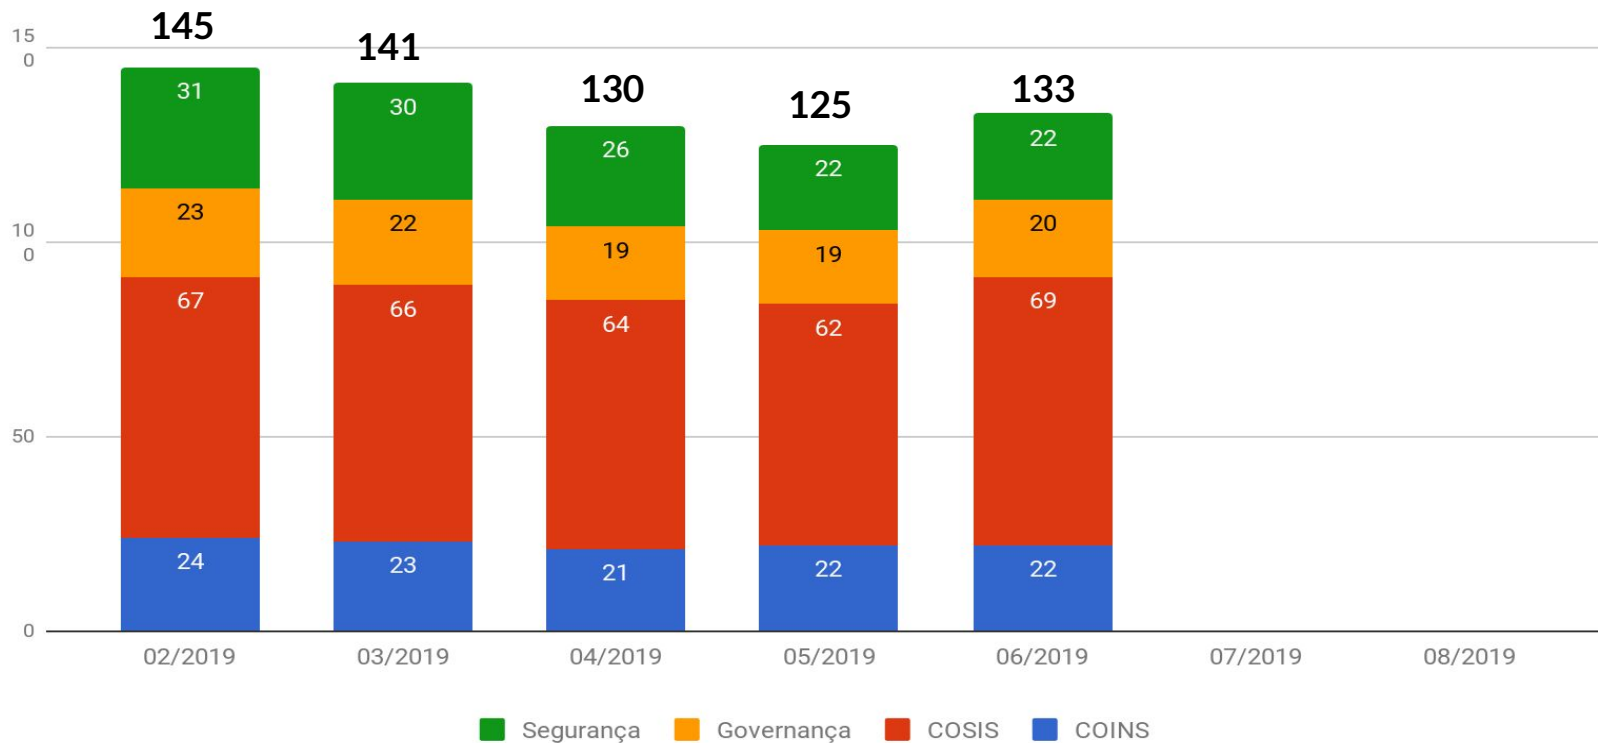

Projetos do PDTIC 2019

Total de Projetos
do PDTIC 2019

138

PROJETOS

Projetos FINALIZADOS
do PDTIC 2019

36

PROJETOS

Completo do
PDTIC 2019

26%

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
INCLUÍDOS em 2019

26

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
FINALIZADOS em 2019

8

PROJETOS

Restam a finalizar

18

PROJETOS

Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ
junho de 2019**

45

PROJETOS

**FINALIZADOS EM
junho de 2019**

0

PROJETOS

**Restam a
finalizar**

133

PROJETOS

Observação: São contabilizados também os projetos do PDTIC 2020.

Entrada e Saída de Projetos no Backlog da SETIN

Quantidade de Projetos Não Previstos
que entraram:
8 projetos

maio/2019



Quantidade de Projetos que saíram:
0 projetos Finalizados



junho/2019

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



Informação obtida através da ferramenta Sydle Seed (*Previsão de Término do Projeto*)

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados

PDTIC	Projeto	Grupo	Situação atual	Término Previsto	Gerente
2019	TI2238097: [GEC] Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GEC] por	COSIS	Paralisado por pendência	16/06/2019	Avelino P.
2019	TI2006205: Implantação do site backup corporativo em nuvem	COINS	Em Execução	28/06/2019	Rafael C.
2020	TI2115343: Segregação das Redes dos Ambientes de Produção, Homologação, Desenvolvimento e	COINS	Em Execução	28/06/2019	Rafael C.
2019	TI2386863: Revisão 2019 da Política de Controle de Ativos de TI	SI	Na Fila para Execução	28/06/2019	Thiago G.
2019	TI2386865: Revisão 2019 da Política de Controle de Acesso aos Recursos	SI	Na Fila para Execução	28/06/2019	Thiago G.
2019	TI2386870: Revisão 2019 da Política de Segurança da Informação	SI	Na Fila para Execução	28/06/2019	Thiago G.
2019	TI2432883: Revisão 2019 do processo de gerenciamento de ATIVOS/RISCOS de segurança	SI	Na Fila para Execução	28/06/2019	Thiago G.
2019	TI2445450: Instituir o processo de Gerenciamento da Elaboração, Acompanhamento e Revisão	SI	Na Fila para Execução	28/06/2019	Thiago G.

Projetos Finalizados Neste Mês (junho de 2019)

Nenhuma ocorrência.

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2465197: Configurar VPN client to site TRT8	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	21/05/2019
Nenhum	TI2481272: Aquisição de certificado digital A1 - ICP-Brasil	Cancelado	SI	Márcel M.	Márcel M.	16/05/2019
2019	TI2437292: Migração das regras do proxy para o	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	15/05/2019
2019	TI2433888: [GPREC] Nacionalização do sistema de Gestão de	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	10/05/2019
2019	TI2432506: [MySQL] Customização e implantação do template MySQL	Concluído	COSIS	Abnatal J.	Daniel O.	Abnatal J.	10/05/2019
2019	TI2378115: [PostgreSQL] - Disponibilização de cluster	Concluído	COSIS	Anderson M.	Anderson M.	Anderson M.	08/05/2019
2019	TI2465192: Implantar o sistema de relatoria e logs	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Alfredo G.	06/05/2019
2019	TI2436330: Revisão anual do processo de Gestão do	Concluído	GOV	Diego M.	Diego M.	Diego M.	25/04/2019
2020	TI2115345: Virtualização dos Desktops Corporativos	Cancelado	COINS	Rafael C.	Victor B.	Rafael C.	Victor B.	Alison S.	Lindalvo N.	.	22/04/2019
2019	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Diego M.	Leonardo F.	Flávio R.	.	.	08/04/2019
2019	TI2228483: [EJUD] Customização da estrutura e design do	Concluído	COSIS	Jose T.	Victor G.	Jose T.	08/04/2019
2019	TI2465273: Configurar no WAF proteção dos sistemas MentoRH	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	05/04/2019
2019	TI2465275: Configurar no WAF proteção dos sistemas Pje	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	05/04/2019
2019	TI2465320: Configurar no WAF proteção dos sistemas que	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	05/04/2019
2019	TI2465274: Configurar no WAF proteção dos sistemas Pje	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	05/04/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2347977: [CSJT] Descentralização dos Atendimentos do PJe para	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	Ramon R.	Diego V.	Alexandre A.	Thiago A.	03/04/2019
2019	TI2383406: [PostgreSQL] Aferir desempenho das operações	Cancelado	COSIS	Anderson M.	Anderson M.	Anderson M.	Abnatal J.	.	.	.	03/04/2019
Nenhum	TI2509612: Atualização do Sistema de Gerenciamento de Repositório	Concluído	COINS	George F.	George F.	George F.	01/04/2019
2019	TI2380043: [PJe-Calc] Implementação de acesso à tela de	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	27/03/2019
2019	TI2380046: [PJe-Calc] Nó de Liquidação Prévia de Sentença	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Victor G.	26/03/2019
2019	TI2394151: [GPREC] Documentação da base de dados	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Renato S.	26/03/2019
2019	TI2433890: [PJe-Calc] Links para o PJe-Calc no PJe	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Victor G.	26/03/2019
2019	TI2437147: Estruturação da base de conhecimento na Wiki	Concluído	COINS	Geraldo D.	Cesar T.	Joao L.	Cesar T.	.	.	.	22/03/2019
2019	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019.	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	19/03/2019
2019	TI2465183: Limitador de banda de internet através do	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	19/03/2019
Nenhum	TI2495704: Criação de servidor SVN	Concluído	COINS	George F.	Diego V.	George F.	15/03/2019
2019	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do	Concluído	COSIS	Diego V.	Victor G.	Ronald P.	13/03/2019
2019	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS	Concluído	COSIS	Mônica G.	Aline S.	Avelino P.	25/02/2019
2019	TI2479549: Estudo técnico relacionado a demanda de certificados	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Márcel M.	25/02/2019
2019	TI2465187: Implantar o WAF	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Alfredo G.	22/02/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Cancelado	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Leonardo F.	14/02/2019
2019	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	Reinaldo C.	14/02/2019
2019	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Márcel M.	13/02/2019
2019	TI2119222: Implantar o Next Generation (Firewall) adquirido pelo	Cancelado	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	11/02/2019
Nenhum	TI2507759: Implantar o NG Firewall adquirido pelo TRT8	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	11/02/2019
2019	TI2399974: GECJ - Rotina de cálculo de retroativo	Concluído	COSIS	Diego V.	Avelino P.	Avelino P.	07/02/2019
Nenhum	TI2481436: Relatório Anual 2018 de Gestão (Prestação de	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	07/02/2019
Nenhum	TI2244472: [PJe] Integração PJe x SAPIENS via MNI	Concluído	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Adevaldo S.	04/02/2019
2019	TI2348886: [PJe-Calc] Anexar PJC no PJe	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	29/01/2019
Nenhum	TI2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	Reinaldo C.	29/01/2019
2019	TI2386849: Planejamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Thiago G.	24/01/2019
2019	TI2386854: Elaboração e conformidade da Norma de Utilização	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	24/01/2019
2019	TI2401095: [MySQL] Atualização do ambiente de desenvolvimento	Concluído	COSIS	Anderson M.	Abnatal J.	Abnatal J.	24/01/2019
2019	TI2394172: [GPREC] Acoplar funcionalidade de Remessa CNJ no	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	22/01/2019
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Estillac F.	08/01/2019

Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS&gerente=Geraldo%20Dur%C3%AAs>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **08/07/2019**
- Data de ponto de corte do PRÓXIMO relatório: **05/08/2019**
