

Portfólio de Projetos de TIC


Julho de 2018

A white line graphic consisting of several connected line segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

TRT8
Pará e Amapá

Visão geral dos Projetos de TIC

Projetos MGP-TI
4,3%

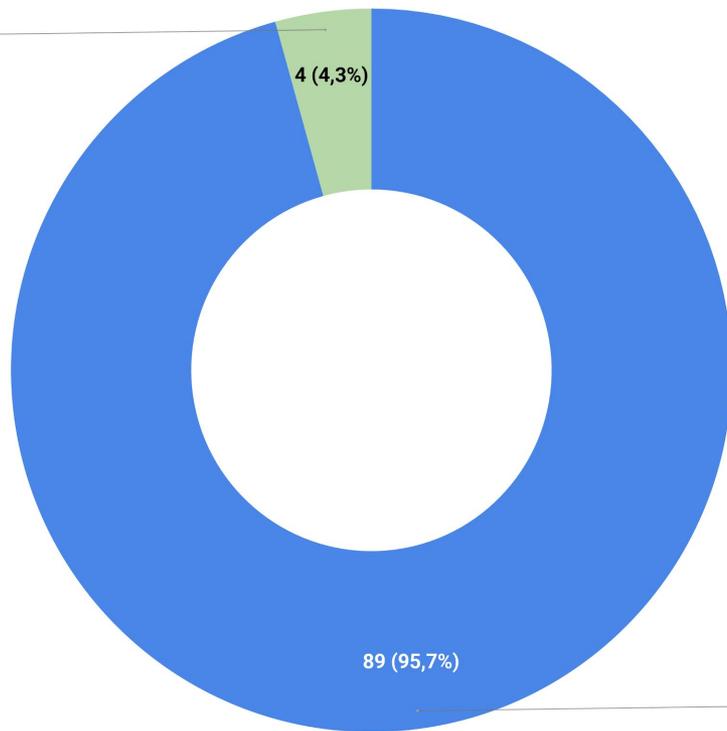


Projeto Simplificado
95,7%

Projetos MGP-TI: projetos autorizados que seguem o processo de Gestão de Projetos definido na Metodologia de Gestão de Projetos de TI da SETIN.

Projetos simplificados: projetos autorizados que seguem o processo simplificado de Gestão de Projetos.

Composição do Portfólio de Projetos de TIC

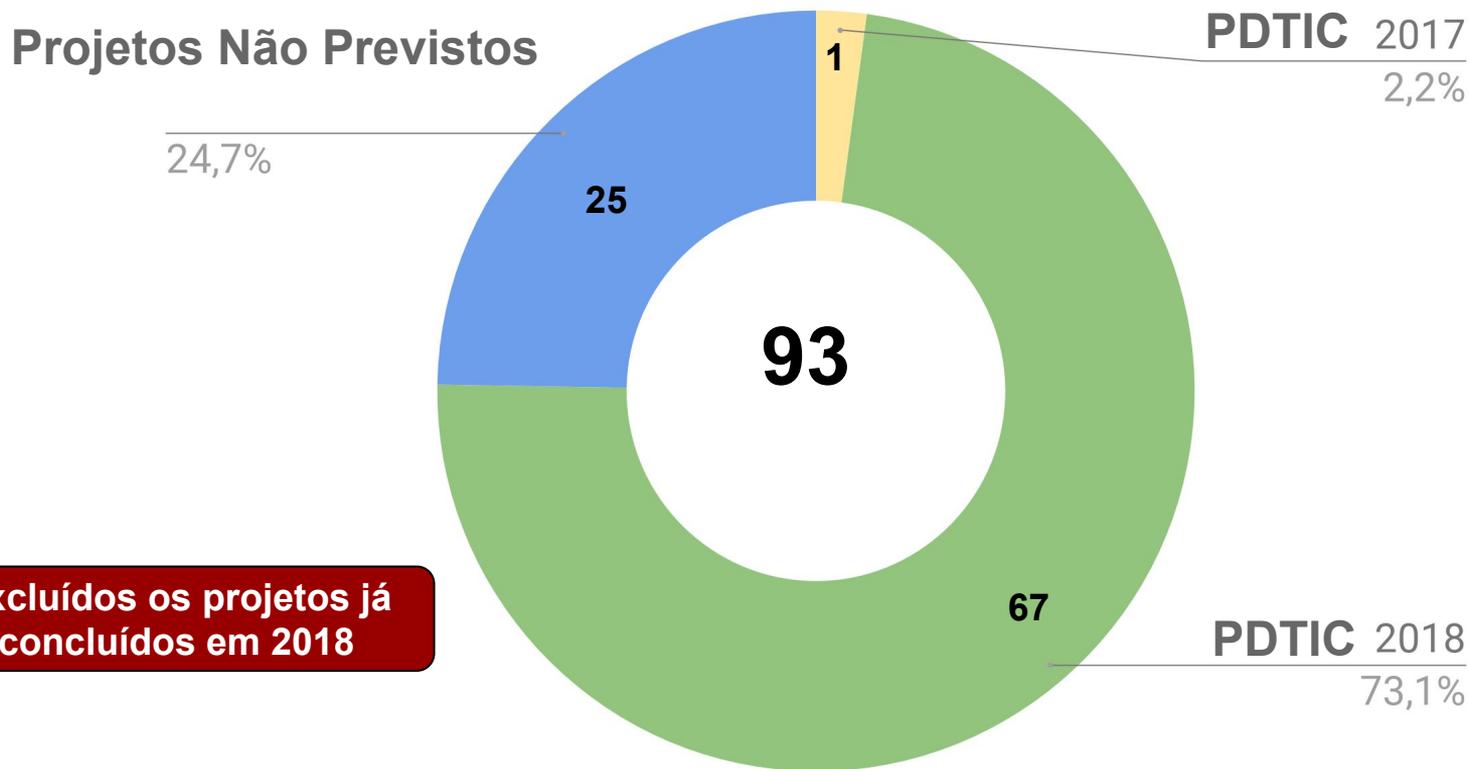

Excluídos os projetos já concluídos em 2018

Projetos do PDTIC 2018

**Total de Projetos
do PDTIC 2018**

85

PROJETOS

**Projetos CONCLUÍDOS
do PDTIC 2018**

18

PROJETOS

**Completo do
PDTIC 2018**

21 %

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
EXECUTADOS em 2018

38

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
CONCLUÍDOS em 2018

13

PROJETOS

Restam a concluir

25

PROJETOS

Projetos da SETIN

Concluídos ATÉ
junho de 2018

48

PROJETOS

Concluídos EM
junho de 2018

4

PROJETOS

Restam a
concluir

93

PROJETOS

Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Segurança

10,8%

Governança


19,4%

COINS

19,4%

COSIS

50,5%

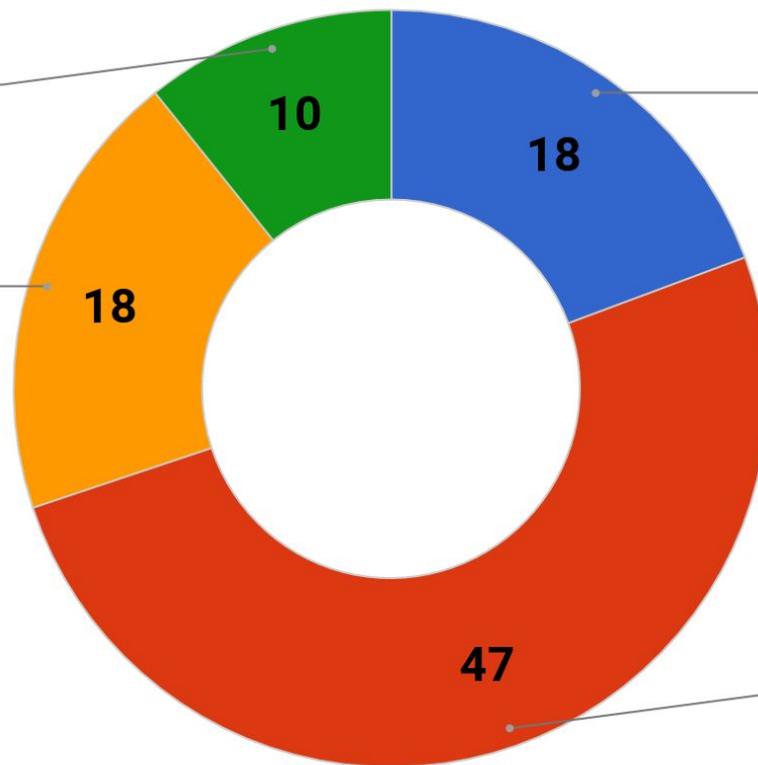

Projetos Concluídos em julho de 2018

Projetos Simplificados

PDTIC	Projeto	Grupo	Situação atual	Término Previsto	Gerente	Analista	Executor
2018	TI2115203: Instituir formalmente o processo de backup e	COINS	Concluído	30/05/2018	Rafael C.	George F.	Rafael C.
Nenhum	TI2244339: LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA AUDITORIA CNJ/COAUD	GOV	Concluído	29/06/2018	Leonardo F.	Leonardo F.	Flávio R.
Nenhum	TI2250413: [COSIS] Implantação de trabalho baseada em tarefas	COSIS	Concluído	30/07/2018	Renan F.	Aline S.	Aline S.
2018	TI2006194: [MySQL] Implantação do novo cluster de dados	COSIS	Concluído	10/08/2018	Anderson M.	Abnatal J.	Abnatal J.

Projetos aguardando aprovação e priorização

Em Aprovação

Projeto	Situação atual	Responsável	Demandante
2252727: PAINEL DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES UTILIZADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL	Análise pelo Comitê de Governança de TIC	COSIS	COMAT
2283089: Implantação de solução de ponto eletrônico no TRT da 8ª Região	Parecer da Coordenadoria	COSIS	DIGER
2289215: [GEPREC] Implementar Recursos de Acessibilidade	Parecer da Coordenadoria	COSIS	DIPRE
2211007: [ASCOM] Sustentabilidade pelo Hórus	Parecer técnico	COSIS	ASCOM
2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos órgãos colegiados no Portal	Parecer técnico	COSIS	SEJUD
2244472: Integração Pje x SAPIENS via MNI	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2257987: PROJETO DE ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ELETRÔNICA CORREICIONAL - GEC	Parecer técnico	COSIS	COR08
2263129: Progecom - v3.0.0 - Módulo do SIGEP para Gestão de Competências	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2288931: [GEPREC] Relatório de Pagamento Federal CFIN/CSJT - 2018	Parecer técnico	COSIS	DIPRE
2305680: [APT] Cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos	Parecer técnico	COSIS	SeDOC
2311173: Instituir a Política de Gestão de Pessoas de TIC	Parecer técnico	GOV	SETIN

Metodologia de Desenvolvimento de Software

Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:

Victor Gonçalves

Parecer gerencial:

A metodologia de sustentação de software já foi concluída. Atualmente está sendo revisada a minuta da Portaria que institui formalmente no âmbito do Tribunal a metodologia e o processo de sustentação de software. A partir do momento em que Portaria for publicada, será iniciado o trabalho para treinamento da equipe na nova metodologia de sustentação de software.

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.1
Cronograma	v1.0
Entrega da Metodologia	04/04/2018
Término do Projeto	18/04/2018

Desempenho do Projeto

Completeness do Projeto	81%
Cumprimento de Prazo	0,50 50% de atraso
Término do Projeto	03/09/2018

Implantação de Controles ISO 27001

Segurança de Informação

Gerente do Projeto:

Márcel Mota

Parecer gerencial:

Conforme deliberação do Comitê Gestor de Segurança da Informação, ficou definido que este projeto será encerrado pois dará lugar a outros projetos específicos que seguirão como o fluxo de projetos simplificados.

Controles concluídos:

- Implantar o controle 5.1.1 - Políticas para segurança da informação.
- Implantar o controle 7.2.2 - Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação.
- Implantar o controle 8.1.3 - Uso aceitável dos ativos.
- Implantar o controle 17.1.1 - Planejando a continuidade da segurança da informação.

Controles que viraram novos projetos:

- Implantar o controle 17.1.2 - Implementando a continuidade da segurança da informação: Foi criado um Projeto formal gerenciado pelo Rafael Cruz, que tem por objetivo determinar os procedimentos de continuidade dos sistemas essenciais do Tribunal.
- Manter 11 controles da ISO 27001 já implantados: Este controle foi desmembrado nestes projetos e estão em fase inicial:
 - Revisão e Conformidade da Política de Segurança da Informação;
 - Revisão e Conformidade da Política de Controle de Acesso aos Recursos de TI;
 - Revisão e Conformidade da Política de Controle de Ativos de TI;
 - Revisão e Conformidade da Política de Backup de Dados.

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos aguardando início

PDTIC ↕	Projeto	↕ Prioridade ↕	Gerente do Projeto ↕	Término Previsto ↕
2018	TI2115197: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de ativos de TIC	Média	Geraldo Durães	03/08/2018
2018	TI2115198: Revisão 2018 do catálogo com os acordos de nível de serviços essenciais de TIC	Baixa	Geraldo Durães	18/09/2018
2018	TI2115354: Renovação do parque de ativos de rede corporativa	Baixa	Rafael Cruz	27/11/2018
2018	TI2115357: Implantação de infraestrutura do prédio Gaspar Viana	Baixa	Gilmara Silva	27/11/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2115190: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de central de serviços	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	13/06/2018
2018	TI2115192: Revisão 2018 do processo de gerenciamento do catálogo de serviços	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	13/06/2018
2018	TI2115193: Revisão 2018 do processo de gerenciamento dos acordos de nível	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	13/06/2018
2018	TI2115194: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de requisições	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	13/06/2018
2018	TI2115195: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de incidentes	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	13/06/2018
2018	TI2115356: Modernização da infraestrutura de acesso ao PJe nas salas de	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	21/06/2018
2018	TI2115343: Segregação das Redes dos Ambientes de Produção, Homologação, Desenvolvimento e	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	04/07/2018
2018	TI2115345: Virtualização dos Desktops Corporativos	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	01/08/2018
2018	TI2006221: Elaboração do Plano de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços de	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	22/08/2018
2018	TI2006205: Implantação do site backup corporativo em nuvem	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	21/09/2018
2018	TI2115350: Implantação da nova rede de dados corporativa de interligação da	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	25/09/2018
2018	TI2115295: Implantação da Rede Wireless	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	28/09/2018
2018	TI2006213: Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	17/10/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos em execução

PDTIC Projeto

Gerente do Projeto Situação atual

Término Previsto

2017 TI2009452: Implantar o Gerenciamento de Catálogo de Serviço e Gerenciamento de

Simonne Callegario Validação da Entrega Final

Coordenadoria de Sistemas

Projetos aguardando início

PDTIC ↕	Projeto	↕ Prioridade ↕	Gerente do Projeto ↕	Término Previsto ↕
Nenhum	TI2288161: [GEPREC] Tratar RP de forma individualizada por beneficiário	Alta	Renato Sousa	26/09/2018
Nenhum	TI2196623: [GEPREC] Mudança de status - Beneficiário de prioridade processual.	Alta	Diego Valdez	01/10/2018
2018	TI2118645: [PostgreSQL] Separação do cluster de dados do PJe	Média	Anderson Maia	30/11/2018
2018	TI2118652: [SEBAD] Elaboração de documentação de procedimentos de restauração	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118660: [SEBAD] Elaborar planos de contingência	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118657: [SEBAD] Elaborar política de desligamento / religamento das máquinas	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118653: [SEBAD] Elaborar / Documentar estratégia de manutenção	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2179617: [ConectorPJe] Implantação da solução	Média	Herbet Silva	Não Planejado
Nenhum	TI2179916: [NUGEP] Implantação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes	Alta	Herbet Silva	Não Planejado
Nenhum	TI2261388: [PROAD] Implantação da Consulta Externa de Processos Administrativos	Média	Mônica Guimaraes	Não Planejado
Nenhum	TI2266143: [SILC] Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Média	Geraldo Barros	Não Planejado
Nenhum	TI2255945: [RECAD] Migração dos Dados RECAD para MentoRH	Alta	Mônica Guimaraes	Não Planejado
Nenhum	TI2260126: [COSIS] - Catálogo de Sistema	Média	Mônica Guimaraes	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2118173: [SAM] Padronização do mecanismo de autenticação	Renan Ferreira	Na Fila para Execução	18/06/2018
2018	TI2023546: [COAPP] Indenização de transporte	Estillac Filho	Na Fila para Execução	27/08/2018
2018	TI2115507: [GEPREC] Aprimoramento do registro de pagamentos fora do precatórioREC	Diego Valdez	Especificação de requisitos	04/09/2018
2018	TI2154016: [GEPREC] Prazo de Suspensão	Diego Valdez	Especificação de requisitos	22/10/2018
2018	TI2036632: [Intranet] Padronização de logins de sistemas	Diego Valdez	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2118647: [Oracle] Migrar RAC de produção para Hiperconvergência, na versão 12	Anderson Maia	Na Fila para Execução	30/11/2018
2018	TI2006202: [SEBAD] Estabelecimento de política de teste, manutenção, desligamento/religamento e plano	Anderson Maia	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2118269: [e-Corr] Solução de integração dos sistemas da Corregedoria	Estillac Filho	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2119157: [FolhaWeb] Implantação do sistema para homologação	Geraldo Barros	Na Fila para Execução	19/12/2018
2018	TI2210223: [SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	Geraldo Barros	Na Fila para Execução	19/12/2018
2018	TI2082740: [SAM] Integração com o e-gestão para o cálculo do índice	Estillac Filho	Paralisado por pendência	
2018	TI2117027: [COSIS] Revisão do catálogo dos sistemas	Victor Gonçalves	Paralisado por pendência	
2018	TI2118533: [Oracle] Restaurar, via rman, backup set físico dos bancos ADMDB	Anderson Maia	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2210262: [e-Gestão] Evolução do extrator do legado para versão 2.0	Diego Valdez	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2228509: [PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau	Diego Valdez	Na Fila para Execução	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
Nenhum	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do 2º grau	Diego Valdez	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2254521: [RECAD] Recadastramento de Estagiários, Prestadores e Cedidos	Mônica Guimaraes	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2238097: [GECJ] Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ por	Mônica Guimaraes	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2307910: [Wiki] - Criação de Wiki para comportar todos os manuais	Diego Valdez	Na Fila para Execução	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2040406: [SeCAD] Certidão de aprovação em concurso público	Estillac Filho	Execução	20/08/2018
2018	TI2118276: [APP TRT8] Evolução do aplicativo	Estillac Filho	Execução	03/09/2018
2018	TI2119184: [SIGEP] Migração de dados do MENTORH	Daniel Carvalho	Execução	31/12/2018
2018	TI2118541: [PostgreSQL] Restaurar monitoramento através do Zabbix	Anderson Maia	Execução	31/08/2018
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	Estillac Filho	Execução	18/12/2018
2018	TI2136976: [CAPE] Canal de atendimento ao público externo	Diego Valdez	Em Verificação	06/08/2018
2018	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS,	Mônica Guimaraes	Homologação	03/08/2018
Nenhum	TI2188681: [PJe-Calc] Implementação da reforma trabalhista	Renan Ferreira	Validação da Entrega Final	
Nenhum	TI2242981: [OUVID] Subportal da Ouvidoria TRT8	Reinaldo Carvalho	Execução	30/08/2018
Nenhum	TI2252526: [e-Gestão] Manutenção de itens de pessoal	Diego Valdez	Execução	31/07/2018
Nenhum	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência	Reinaldo Carvalho	Execução	31/08/2018
Nenhum	TI2228483: [EJUD] Customização da estrutura e design do Campus Virtual do	Jose Tarrío	Execução	20/08/2018

Governança de TIC

Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto	Término Previsto
2018	TI2108954: Análise quantitativa e qualitativa dos servidores em 2018	Alta	Flávio Ramos	16/10/2018
2018	TI2107172: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2019	Alta	Flávio Ramos	16/11/2018
2018	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019	Alta	Flávio Ramos	22/11/2018
2018	TI2005293: Revisão 2018 do Processo de Gerenciamento de Mudança	Média	Leonardo Feliciano	29/11/2018
2018	TI2107189: Revisão 2018 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	Média	Raphael Vilela	29/11/2018
2018	TI2069917: Publicar os Estudos Técnicos Preliminares das Contratações de Soluções de TIC na Intranet	Média	Diego Moraes	19/12/2018
2018	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2018	Alta	Leonardo Feliciano	19/12/2018

Governança de TIC

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2107190: Novo portal de Governança e Gestão de TIC na Intranet	Leonardo Feliciano	Paralisado por pendência	
2018	TI2107177: Definir formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e	Raphael Vilela	Na Fila para Execução	31/07/2018
2018	TI2106668: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2018	Leonardo Feliciano	Especificação de requisitos	30/08/2018
2018	TI2107173: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019	Diego Moraes	Aprovação do Escopo	28/09/2018
2018	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Flávio Ramos	Especificação de requisitos	17/10/2018
Nenhum	TI2293264: Questionário iGOV-TCU	Flávio Ramos	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2311183: iGov - CNJ 2018	Leonardo Feliciano	Aprovação do Escopo	Não Planejado
Nenhum	TI2328663: Política de Gestão de Pessoas de TIC	Flávio Ramos	Na Fila para Execução	Não Planejado

Governança de TIC

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2069948: Implantar o processo de Planejamento de Tecnologia da Informação.	Flávio Ramos	Execução	31/08/2018
2018	TI2106677: Revisão 2018 do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	Diego Moraes	Execução	10/08/2018

Segurança de Informação

Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto	Término Previsto
2018	TI2119243: Instituir formalmente processo de ger. de continuidade de serviços essenciais de TIC	Média	Thiago Gilla	18/07/2018
2018	TI2119191: Reorganizar a estrutura de pastas, políticas e tarefas do ePO	Média	Márcel Mota	31/08/2018
2018	TI2119225: Implantar Monitoramento de eventos de segurança	Baixa	Alfredo Gonçalves	16/11/2018
2018	TI2119204: Definir conformidade dos controles da ISO 27001 já implantados	Baixa	Márcel Mota	19/12/2018

Segurança de Informação

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2062187: Gestão de Riscos de TI	Thiago Gilla	Na Fila para Execução	31/07/2018
2018	TI2119222: Migrar regras e configurações o novo Firewall camada 7	Alfredo Gonçalves	Especificação de requisitos	27/08/2018
2018	TI2119216: Realizar a Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos	Thiago Gilla	Na Fila para Execução	30/09/2018
2018	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	Márcel Mota	Especificação de requisitos	19/12/2018

Segurança de Informação

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2119212: Instituir formalmente processo de ger. de controle de ativos de	Thiago Gilla	Execução	30/06/2018

Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
 - <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente=Geraldo%20Duraes>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
