


Portfólio de Projetos de TIC

Agosto de 2018

Visão geral dos Projetos de TIC

Projetos MGP-TI

3,3%

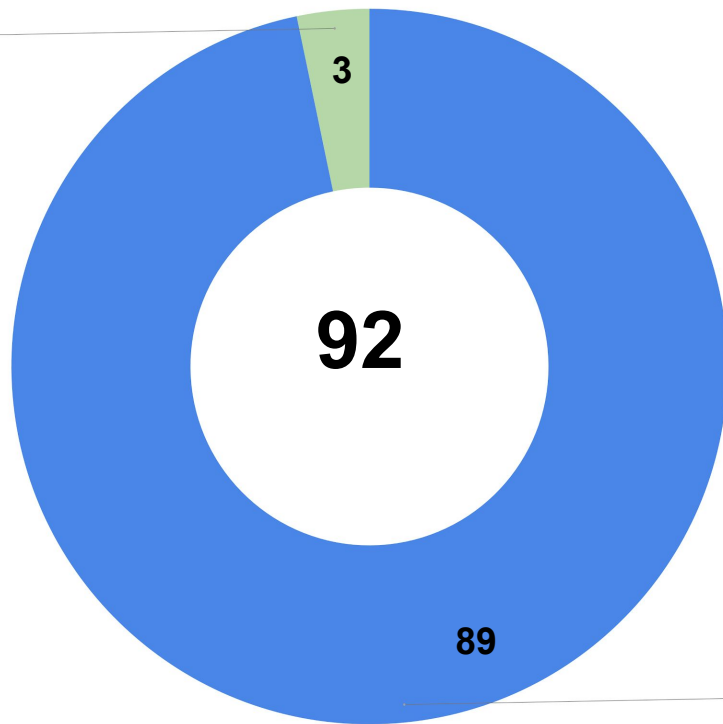


Projetos MGP-TI: projetos autorizados que seguem o processo de Gestão de Projetos definido na Metodologia de Gestão de Projetos de TI da SETIN.

Projetos simplificados: projetos autorizados que seguem o processo simplificado de Gestão de Projetos.

Projeto Simplificado

96,7%

Composição do Portfólio de Projetos de TIC

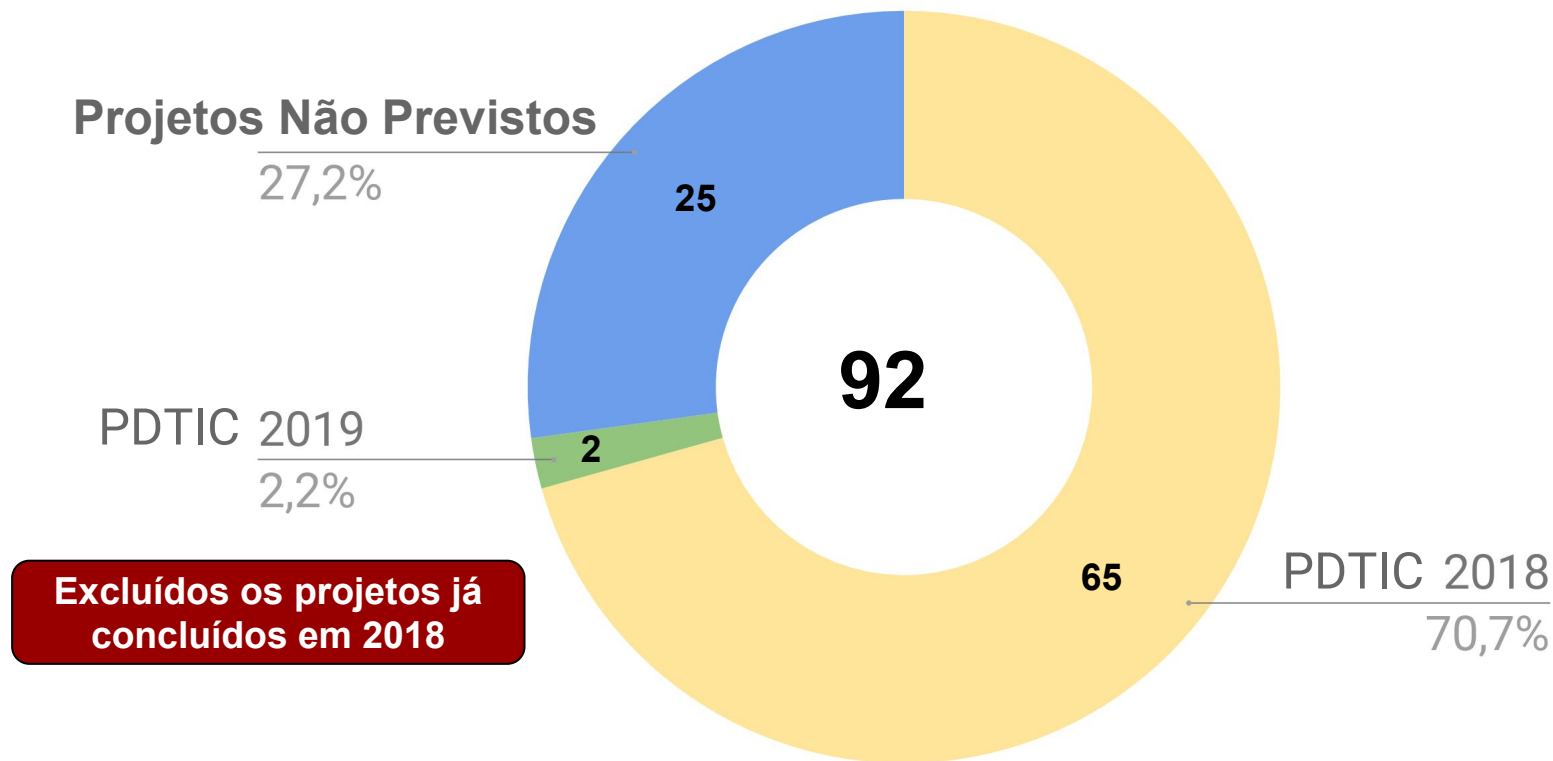

Projetos do PDTIC 2018

**Total de Projetos
do PDTIC 2018**

85

PROJETOS

**Projetos CONCLUÍDOS
do PDTIC 2018**

20

PROJETOS

**Compleitude do
PDTIC 2018**

23%

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
EXECUTADOS em 2018

42

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
CONCLUÍDOS em 2018

17

PROJETOS

Restam a concluir

25

PROJETOS

Projetos da SETIN

**Concluídos ATÉ
agosto de 2018**

37

PROJETOS

**Concluídos EM
agosto de 2018**

7

PROJETOS

**Restam a
concluir**

(Não Previstos + PDTIC 2018 + PDTIC 2019)

92

PROJETOS

Entrada e Saída de Projetos no Portfólio

Quantidade de Projetos Não Previstos
que entraram:
6 projetos para Execução



julho/2018



Quantidade de Projetos que saíram:
7 projetos Concluídos



agosto/2018

Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Segurança

9,8%

Governança


17,4%

COINS

20,7%

COSIS

52,2%

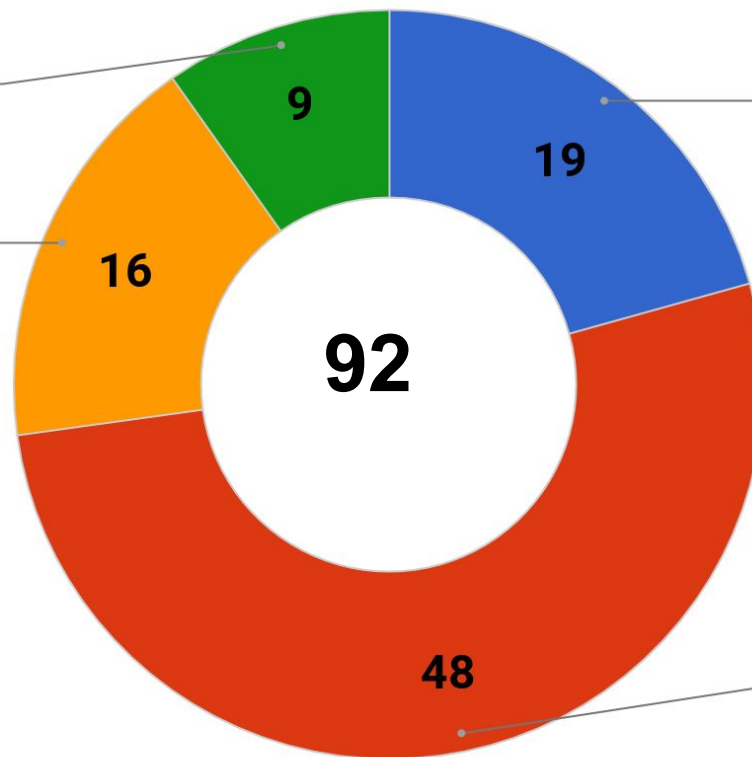

Projetos Concluídos em agosto de 2018

Projetos Simplificados

PDTIC	Projeto	Grupo	Situação atual	Término Previsto	Gerente	Analista	Executor
2017	TI2009452: Implantar o Gerenciamento de Catálogo de Serviço	COINS	Concluído	11/05/2018 ⓘ	Simonne C.	Simonne C.	Simonne C.
2018	TI2107194: Instituir formalmente o plantão na área de	GOV	Concluído	30/05/2018 ⓘ	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.
Nenhum	TI2293264: Questionário IGOV-TCU	GOV	Concluído	30/06/2018	Flávio R.	Leonardo F.	Flávio R.
Nenhum	TI2188681: [PJe-Calc] Implementação da reforma trabalhista	COSIS	Concluído	16/07/2018 ⓘ	Renan F.	Victor G.	Estillac F.
Nenhum	TI2311183: iGov - CNJ 2018	GOV	Concluído	31/07/2018	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.
2018	TI2106677: Revisão 2018 do Processo de Planejamento de	GOV	Concluído	24/08/2018 ⓘ	Diego M.	Diego M.	Diego M.
Nenhum	TI2179916: [NUGEP] Implantação do Núcleo de Gerenciamento de	COSIS	Concluído	31/08/2018	Adevaldo S.	Victor G.	Adevaldo S.

Projetos aguardando aprovação e priorização

Em Aprovação

Projeto	Situação atual	Responsável	Demandante
2283089: [DIGER] Implantação de solução de ponto eletrônico no TRT da 8ª Região	Parecer da Coordenadoria	COSIS	DIGER
2211007: [ASCOM] Sustentabilidade pelo Hórus	Parecer técnico	COSIS	ASCOM
2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos órgãos colegiados no Portal	Parecer técnico	COSIS	SEJUD
2244472: Integração Pje x SAPIENS via MNI	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2257987: PROJETO DE ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ELETRÔNICA CORREICIONAL - GEC	Parecer técnico	COSIS	COR08
2263129: Progecom - v3.0.0 - Módulo do SIGEP para Gestão de Competências	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2288931: [GEPREC] Relatório de Pagamento Federal CFIN/CSJT - 2018	Parecer técnico	COSIS	DIPRE
2305680: [APT] Cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos	Parecer técnico	COSIS	SeDOC
2311173: Instituir a Política de Gestão de Pessoas de TIC	Parecer técnico	GOV	SETIN
2339257: FROTA - Sistema de Controle de Carros	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2348886: [PJe-Calc] Anexar PJC no PJe	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2355994: TV Corporativa	Parecer técnico	COSIS	ASCOM

Metodologia de Desenvolvimento de Software

Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:

Victor Gonçalves

Parecer gerencial:

A metodologia e o processo de sustentação de software foram instituídos formalmente através da Portaria PRESI nº 770/2018. Na etapa seguinte será iniciado o trabalho para treinamento da equipe na nova metodologia de sustentação de software.

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.1
Cronograma	v1.0
Entrega da Metodologia	04/04/2018
Término do Projeto	18/04/2018

Desempenho do Projeto

Compleitude do Projeto	84%
Cumprimento de Prazo	0,50 50% de atraso
Término do Projeto	25/09/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos aguardando início

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
2019	TI2342464: (PDTI-2018) Virtualização dos Desktops Corporativos	Baixa	Rafael Cruz	Não Planejado
Nenhum	TI2347977: [CSJT] Descentralização dos Atendimentos do PJe para os TRTs	Alta	Geraldo Durães	Não Planejado
Nenhum	TI2344155: Implantação da Central de Serviços no ambiente de TIC do TRT8.	Média	Geraldo Durães	Não Planejado

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos na fila para execução

PDTIC ⇅	Projeto	⇅ Gerente do Projeto ⇅	Situação atual	⇅ Término Previsto ⇅
2018	TI2006221: Elaboração do Plano de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços de	Rafael Cruz	Aprovação do Escopo	22/08/2018
2018	TI2115198: Revisão 2018 do catálogo com os acordos de nível de	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	18/09/2018
2018	TI2006205: Implantação do site backup corporativo em nuvem	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	21/09/2018
2018	TI2115350: Implantação da nova rede de dados corporativa de interligação da	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	25/09/2018
2018	TI2006213: Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	17/10/2018
2018	TI2115190: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de central de serviços	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115192: Revisão 2018 do processo de gerenciamento do catálogo de serviços	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115193: Revisão 2018 do processo de gerenciamento dos acordos de nível	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115194: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de requisições	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115195: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de incidentes	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115197: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de Configuração e Ativos	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115356: Modernização da infraestrutura de acesso ao PJe nas salas de	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	19/12/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos na fila para execução

PDTIC ↕	Projeto	↕ Gerente do Projeto ↕	Situação atual	↕ Término Previsto ↕
2018	TI2115343: Segregação das Redes dos Ambientes de Produção, Homologação, Desenvolvimento e	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2115295: Implantação da Rede Wireless	Rafael Cruz	Paralisado por pendência	
2018	TI2115354: Renovação do parque de ativos de rede corporativa	Rafael Cruz	Paralisado por pendência	
2018	TI2115357: Implantação de infraestrutura do prédio Gaspar Viana	Gilmara Silva	Paralisado por pendência	

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos em execução

Nenhuma Ocorrência.

Coordenadoria de Sistemas

Projetos aguardando início

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
Nenhum	TI2196623: [GEPREC] Mudança de status - Beneficiário de prioridade processual.	Alta	Diego Valdez	14/11/2018
2018	TI2118645: [PostgreSQL] Separação do cluster de dados do PJe	Média	Anderson Maia	30/11/2018
2018	TI2118652: [SEBAD] Elaboração de documentação de procedimentos de restauração	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118660: [SEBAD] Elaborar planos de contingência	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118657: [SEBAD] Elaborar política de desligamento / religamento das máquinas	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2118653: [SEBAD] Elaborar / Documentar estratégia de manutenção	Baixa	Anderson Maia	19/12/2018
2018	TI2179617: [ConectorPJe] Implantação da solução	Média	Herbet Silva	Não Planejado
Nenhum	TI2261388: [PROAD] Implantação da Consulta Externa de Processos Administrativos	Média	Mônica Guimaraes	Não Planejado
Nenhum	TI2266143: [SILC] Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Média	Geraldo Barros	Não Planejado
Nenhum	TI2255945: [RECAD] Migração dos Dados RECAD para MentoRH	Alta	Mônica Guimaraes	Não Planejado
Nenhum	TI2260126: [COSIS] - Catálogo de Sistema	Média	Mônica Guimaraes	Não Planejado
Nenhum	TI2289215: [GEPREC] Implementar Recursos de Acessibilidade	Média	Renato Sousa	Não Planejado
Nenhum	TI2252727: [SCMP] PAINEL DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES UTILIZADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL	Muita alta	Geraldo Barros	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC 	Projeto	 Gerente do Projeto 	Situação atual 	Término Previsto 
2018	TI2118173: [SAM] Padronização do mecanismo de autenticação	Renan Ferreira	Na Fila para Execução	18/06/2018
2018	TI2107177: Definir formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e	Diego Valdez	Na Fila para Execução	31/07/2018
2018	TI2023546: [COAPP] Indenização de transporte	Estillac Filho	Na Fila para Execução	27/08/2018
2018	TI2154016: [GEPREC] Prazo de Suspensão	Diego Valdez	Especificação de requisitos	15/10/2018
2018	TI2115507: [GEPREC] Aprimoramento do registro de pagamentos fora do precatórioREC	Diego Valdez	Especificação de requisitos	22/10/2018
2018	TI2036632: [Intranet] Padronização de logins de sistemas	Diego Valdez	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2118647: [Oracle] Migrar RAC de produção para Hiperconvergência, na versão 12	Anderson Maia	Na Fila para Execução	30/11/2018
2018	TI2006202: [SEBAD] Estabelecimento de política de teste, manutenção, desligamento/religamento e plano	Anderson Maia	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2118269: [e-Corr] Solução de integração dos sistemas da Corregedoria	Estillac Filho	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2119157: [FolhaWeb] Implantação do sistema para homologação	Geraldo Barros	Na Fila para Execução	19/12/2018
2018	TI2210223: [SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	Geraldo Barros	Na Fila para Execução	19/12/2018
2018	TI2082740: [SAM] Integração com o e-gestão para o cálculo do índice	Estillac Filho	Paralisado por pendência	

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC ↕	Projeto	↕	Gerente do Projeto ↕	Situação atual ↕	↕	Término Previsto ↕
2018	TI2117027: [COSIS] Revisão do catálogo dos sistemas		Victor Gonçalves	Paralisado por pendência		
2018	TI2118533: [Oracle] Restaurar, via rman, backup set físico dos bancos ADMDB		Anderson Maia	Paralisado por pendência		
Nenhum	TI2210262: [e-Gestão] Evolução do extrator do legado para versão 2.0		Diego Valdez	Paralisado por pendência		
Nenhum	TI2228509: [PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau		Diego Valdez	Na Fila para Execução		Não Planejado
Nenhum	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do 2º grau		Diego Valdez	Na Fila para Execução		Não Planejado
Nenhum	TI2254521: [RECAD] Recadastramento de Estagiários, Prestadores e Cedidos		Mônica Guimaraes	Na Fila para Execução		Não Planejado
Nenhum	TI2238097: [GECJ] Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ por		Mônica Guimaraes	Paralisado por pendência		
Nenhum	TI2307910: [Wiki] - Criação de Wiki para comportar todos os manuais		Diego Valdez	Na Fila para Execução		Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2040406: [SeCAD] Certidão de aprovação em concurso público	Estillac Filho	Realizando Entrega Final	06/08/2018
2018	TI2118276: [APP TRT8] Evolução do aplicativo	Estillac Filho	Execução	03/09/2018
2018	TI2119184: [SIGEP] Migração de dados do MENTORH	Daniel Carvalho	Execução	31/12/2018
2018	TI2118541: [PostgreSQL] Restaurar monitoramento através do Zabbix	Anderson Maia	Execução	31/08/2018
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	Estillac Filho	Execução	18/12/2018
2018	TI2136976: [CAPE] Canal de atendimento ao público externo	Diego Valdez	Em Verificação	31/08/2018
2018	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS,	Mônica Guimaraes	Homologação	03/08/2018
Nenhum	TI2242981: [OUVID] Subportal da Ouvidoria TRT8	Reinaldo Carvalho	Execução	30/08/2018
Nenhum	TI2252526: [e-Gestão] Manutenção de itens de pessoal	Diego Valdez	Homologação	31/07/2018
Nenhum	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência	Reinaldo Carvalho	Execução	31/08/2018
Nenhum	TI2228483: [EJUD] Customização da estrutura e design do Campus Virtual do	Jose Tarrio	Execução	20/08/2018
Nenhum	TI2288161: [GEPREC] Tratar RP de forma individualizada por beneficiário	Renato Sousa	Execução	01/10/2018

Governança de TIC

Projetos aguardando início

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
2018	TI2108954: Análise quantitativa e qualitativa dos servidores em 2018	Alta	Flávio Ramos	16/10/2018
2018	TI2107172: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2019	Alta	Flávio Ramos	16/11/2018
2018	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019	Alta	Flávio Ramos	22/11/2018
2018	TI2107189: Revisão 2018 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	Média	Leonardo Feliciano	29/11/2018
2018	TI2069917: Publicar os Estudos Técnicos Preliminares das Contratações de Soluções de TIC na Intranet	Média	Diego Moraes	19/12/2018
Nenhum	TI2350896: [CSJT] Proposta de Simplificação de Documentos da Metodologia de Projetos do CSJT	Muita alta	Leonardo Feliciano	Não Planejado
2019	TI2356924: 3º Encontro de Governança de TIC da JT- 2019	Média	Flávio Ramos	Não Planejado

Governança de TIC

Projetos na fila para execução

PDTIC ↕	Projeto	Gerente do Projeto ↕	Situação atual ↕	Término Previsto ↕
2018	TI2005293: Revisão 2018 do Processo de Gerenciamento de Mudança	Leonardo Feliciano	Especificação de requisitos	29/11/2018
2018	TI2107190: Novo portal de Governança e Gestão de TIC na Intranet	Leonardo Feliciano	Paralisado por pendência	
2018	TI2106668: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2018	Leonardo Feliciano	Aprovação do Escopo	31/08/2018
2018	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Flávio Ramos	Especificação de requisitos	17/10/2018
2018	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2018	Leonardo Feliciano	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2339080: Elaboração do Processo de Planejamento Estratégico de TIC	Flávio Ramos	Na Fila para Execução	Não Planejado

Governança de TIC

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2069948: Elaborar Processo do PDTIC.	Flávio Ramos	Execução	31/08/2018
2018	TI2107173: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019	Diego Moraes	Execução	28/09/2018
Nenhum	TI2328663: Política de Gestão de Pessoas de TIC	Flávio Ramos	Execução	14/09/2018

Segurança de Informação

Projetos aguardando início

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
2018	TI2119243: Instituir formalmente processo de ger. de continuidade de serviços essenciais de TIC	Média	Thiago Gilla	18/07/2018
2018	TI2119191: Reorganizar a estrutura de pastas, políticas e tarefas do ePO	Média	Márcel Mota	31/08/2018
2018	TI2119225: Implantar Monitoramento de eventos de segurança	Baixa	Alfredo Gonçalves	16/11/2018
2018	TI2119204: Definir conformidade dos controles da ISO 27001 já implantados	Baixa	Márcel Mota	19/12/2018

Segurança de Informação

Projetos na fila para execução

PDTIC 	Projeto	 Gerente do Projeto 	 Situação atual 	Término Previsto 
2018	TI2062187: Gestão de Riscos de TI	Thiago Gilla	Na Fila para Execução	31/07/2018
2018	TI2119222: Migrar regras e configurações o novo Firewall camada 7	Alfredo Gonçalves	Especificação de requisitos	27/08/2018
2018	TI2119216: Realizar a Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos	Thiago Gilla	Na Fila para Execução	30/09/2018
2018	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	Márcel Mota	Especificação de requisitos	19/12/2018

Segurança de Informação

Projetos em execução

PDTIC Projeto		Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2119212: Instituir formalmente processo de ger. de controle de ativos de	Thiago Gilla	Execução	30/06/2018

Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente=Geraldo%20Duraes>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
