


Portfólio de Projetos de TIC

Setembro de 2018

Visão geral dos Projetos de TIC

Projetos MGP-TI

3,5%

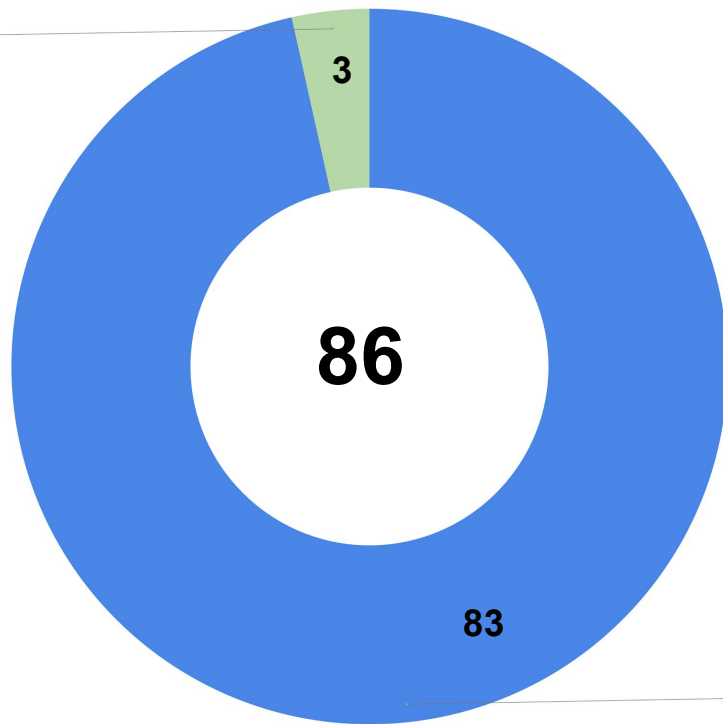


Projeto Simplificado

96,5%

Projetos MGP-TI: projetos autorizados que seguem o processo de Gestão de Projetos definido na Metodologia de Gestão de Projetos de TI da SETIN.

Projetos simplificados: projetos autorizados que seguem o processo simplificado de Gestão de Projetos.

Composição do Portfólio de Projetos de TIC

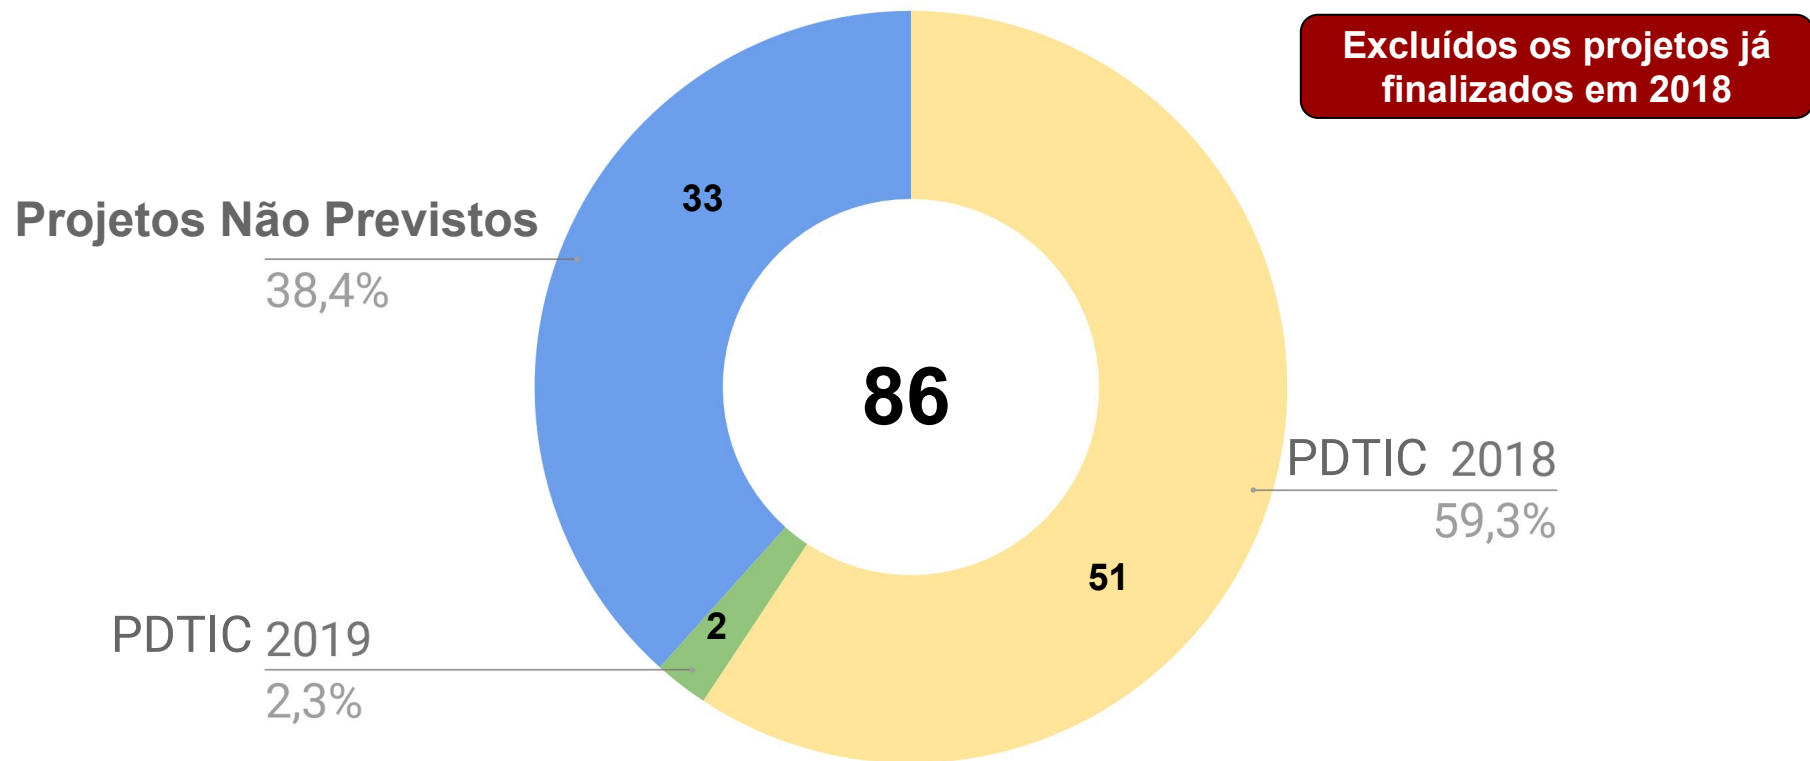

Projetos do PDTIC 2018

**Total de Projetos
do PDTIC 2018**

85

PROJETOS

**Projetos FINALIZADOS
do PDTIC 2018**

34

PROJETOS

**Compleitude do
PDTIC 2018**

40%

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
EXECUTADOS em 2018

53

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
FINALIZADOS em 2018

20

PROJETOS

Restam a concluir

33

PROJETOS

Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ
setembro de 2018**

54

PROJETOS

**FINALIZADOS EM
setembro de 2018**

17

PROJETOS

**Restam a
concluir**

(Não Previstos + PDTIC 2018 + PDTIC 2019)

86

PROJETOS

Entrada e Saída de Projetos no Portfólio

Quantidade de Projetos Não Previstos
que entraram:
11 projetos para Execução



agosto/2018



Quantidade de Projetos que saíram:
17 projetos Finalizados



setembro/2018

Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Segurança

5,8%

Governança


15,1%

COINS

20,9%

COSIS

58,1%

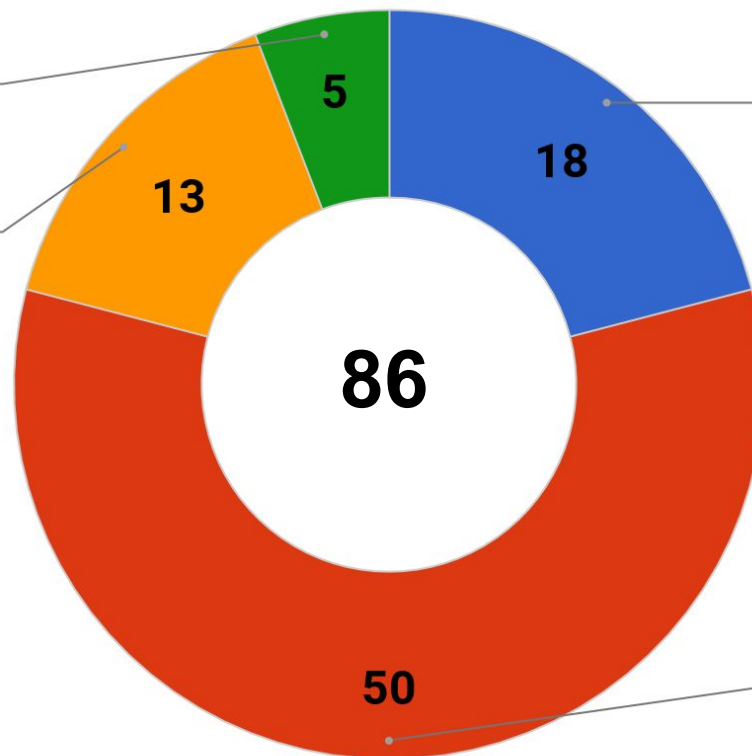

Projetos aguardando aprovação e priorização

Projeto	↕ Situação atual	↕ Responsável	↕ Demandante
2283089: [DIGER] Implantação de solução de ponto eletrônico no TRT da 8ª Região	Parecer da Coordenadoria	COSIS	DIGER
2211007: [ASCOM] Sustentabilidade pelo Hórus	Parecer técnico	COSIS	ASCOM
2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos órgãos colegiados no Portal	Parecer técnico	COSIS	SEJUD
2244472: Integração PJe x SAPIENS via MNI	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2257987: PROJETO DE ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ELETRÔNICA CORREICIONAL ? GEC	Parecer técnico	COSIS	COR08
2263129: Progecom - v3.0.0 - Módulo do SIGEP para Gestão de Competências	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2288931: [GEPREC] Relatório de Pagamento Federal CFIN/CSJT - 2018	Parecer técnico	COSIS	DIPRE
2305680: [APT] Cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos	Parecer técnico	COSIS	SeDOC
2339257: FROTA - Sistema de Controle de Carros	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2355994: [ASCOM] TV Corporativa	Parecer técnico	COSIS	ASCOM
2373417: [Projeto - 2018] [SEBAD] Elaboração de documentação de procedimentos de restauração	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2373451: [Projeto - 2018] [SEBAD] Elaborar plano de contingência para cada ambiente de produção	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2373453: [Projeto - 2018][SEBAD] Elaborar política de desligamento / religamento das máquinas	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2373458: [Projeto - 2018] [SEBAD] Elaborar / Documentar estratégia de manutenção	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2373463: [Projeto - 2018] [PostgreSQL] Separação do cluster de dados do PJe	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2380032: [PJe-Calc] Homologação de Cálculo	Parecer técnico	COSIS	COSIS

Projetos aguardando aprovação e priorização

2380037: [PJe-Calc] Assinatura de Sentença Líquida	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2380043: [PJe-Calc] Acesso à Tela de Cálculos e Links para PJe-Calc	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2380046: [PJe-Calc] Nó de Liquidação Prévia de Sentença Líquida	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2380061: [PJe-Calc] Serviço Exibição de Valor Atualizado Estimado	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2383392: Protocolo on line do malote	Parecer técnico	COSIS	VTMCP.07
2386849: Planejamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	Parecer técnico	SI	SETIN
2386854: Elaboração e conformidade da Norma de Utilização de Recursos de TIC	Parecer técnico	SI	SETIN
2386863: Revisão da Política de Controle de Ativos de TI	Parecer técnico	SI	SETIN
2386865: Revisão da Política de Controle de Acesso aos Recursos de TI	Parecer técnico	SI	SETIN
2386870: Revisão da Política de Segurança da Informação	Parecer técnico	SI	SETIN
2386873: Conformidade da Política de Controle de Acesso aos Recursos de TI	Parecer técnico	SI	SETIN
2386878: Conformidade da Política de Controle de Ativos de TI	Parecer técnico	SI	SETIN
2386881: Conformidade e Revisão da Política de Backup de Dados	Parecer técnico	SI	SETIN
2386884: Instituir formalmente processo de controle de acesso aos recursos de TI	Parecer técnico	SI	SETIN

Metodologia de Desenvolvimento de Software

Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:

Victor Gonçalves

Parecer gerencial:

A metodologia e o processo de sustentação de software foram instituídos formalmente através da Portaria PRESI nº 770/2018. Na etapa seguinte será iniciado o trabalho para treinamento da equipe na nova metodologia de sustentação de software.

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.1
Cronograma	v1.0
Entrega da Metodologia	04/04/2018
Término do Projeto	18/04/2018

Desempenho do Projeto

Compleitude do Projeto	84%
Cumprimento de Prazo	0,70 70% de atraso
Término do Projeto	25/09/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos não iniciados

PDTIC 	Projeto 	Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
2019	TI2342464: [Projeto - 2018] Virtualização dos Desktops Corporativos	Baixa	Rafael Cruz	Não Planejado
Nenhum	TI2344155: Operacionalização dos serviços de N1 e N2 (Central de Serviços) da empresa vencedora da licitação.	Média	Geraldo Durães	Não Planejado

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos na fila para execução

PDTIC ⇅	Projeto	⇅ Gerente do Projeto ⇅	Situação atual ⇅	Término Previsto ⇅
2018	TI2115350: Implantação da nova rede de dados corporativa de interligação da	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	25/10/2018
2018	TI2115190: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de central de serviços	Geraldo Durães	Aprovação do Escopo	31/10/2018
2018	TI2115192: Revisão 2018 do processo de gerenciamento do catálogo de serviços	Geraldo Durães	Aprovação do Escopo	31/10/2018
2018	TI2115193: Revisão 2018 do processo de gerenciamento dos acordos de nível	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115194: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de requisições	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115195: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de incidentes	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	31/10/2018
2018	TI2115345: Virtualização dos Desktops Corporativos (PDTI - 2019)	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2115356: Modernização da infraestrutura de acesso ao PJe nas salas de	Geraldo Durães	Aprovação do Escopo	19/12/2018
2018	TI2115198: Revisão 2018 do catálogo com os acordos de nível de	Geraldo Durães	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2115197: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de Configuração e Ativos	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2115354: Renovação do parque de ativos de rede corporativa	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	31/12/2018
2018	TI2006205: Implantação do site backup corporativo em nuvem	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	28/06/2019
2018	TI2115343: Segregação das Redes dos Ambientes de Produção, Homologação, Desenvolvimento e	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	28/06/2019
2018	TI2115295: Implantação da Rede Wireless	Rafael Cruz	Paralisado por pendência	
2018	TI2115357: Implantação de infraestrutura do prédio Gaspar Viana	Gilmara Silva	Paralisado por pendência	

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos em execução

PDTIC Projeto		Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2006213: Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais	Rafael Cruz	Validação da Entrega Final	

Coordenadoria de Sistemas

Projetos não iniciados

PDTIC ⇅	Projeto	⇅	Prioridade ⇅	Gerente do Projeto ⇅	Término Previsto ⇅
Nenhum	TI2196623: [GEPREC] Mudança de status - Beneficiário de prioridade processual.		Alta	Diego Valdez	14/11/2018
Nenhum	TI2261388: [PROAD] Implantação da Consulta Externa de Processos Administrativos		Média	Mônica Guimaraes	29/03/2019
2018	TI2118652: [SEBAD] Elaboração de documentação de procedimentos de restauração (PDTI - 2019)		Baixa	Anderson Maia	19/12/2019
2018	TI2118660: [SEBAD] Elaborar plano de contingência para cada ambiente de produção (PDTI 2019)		Baixa	Anderson Maia	19/12/2019
2018	TI2118657: [SEBAD] Elaborar política de desligamento / religamento das máquinas (PDTI - 2019)		Baixa	Anderson Maia	19/12/2019
2018	TI2118653: [SEBAD] Elaborar / Documentar estratégia de manutenção dos bancos de produção (PDTI - 2019)		Baixa	Anderson Maia	19/12/2019
2018	TI2118645: [PostgreSQL] Separaração do cluster de dados do PJe (PDTI - 2019)		Média	Anderson Maia	19/12/2019
Nenhum	TI2260126: [COSIS] - Sistema de Catálogo de Sistemas		Média	Mônica Guimaraes	19/12/2019
Nenhum	TI2289215: [GEPREC] Implementar Recursos de Acessibilidade		Média	Renato Sousa	19/12/2019
Nenhum	TI2377097: Modificações nos Relatórios do BANEX		Média	Diego Valdez	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC ⇅	Projeto	⇅	Gerente do Projeto ⇅	Situação atual ⇅	Término Previsto ⇅
Nenhum	TI2255945: [RECAD] Migração dos Dados RECAD para MentoRH - Inativos e		Mônica Guimaraes	Especificação de requisitos	11/10/2018
Nenhum	TI2154016: [GEPREC] Prazo de Suspensão		Diego Valdez	Aprovação do Escopo	15/10/2018
2018	TI2115507: [GEPREC] Aprimoramento do registro de pagamentos fora do precatórioREC		Diego Valdez	Especificação de requisitos	22/10/2018
Nenhum	TI2266143: [SILC] Implantação do Sistema de Licitações e Contratos		Geraldo Barros	Aprovação do Escopo	31/10/2018
Nenhum	TI2252727: [SCMP] PAINEL DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES		Geraldo Barros	Aprovação do Escopo	31/10/2018
Nenhum	TI2378115: [PostgreSQL] - Disponibilização de cluster de dados próprio		Anderson Maia	Na Fila para Execução	10/12/2018
Nenhum	TI2383406: [PostgreSQL] Aferir desempenho das operações de manutenção do		Anderson Maia	Na Fila para Execução	24/12/2018
2018	TI2023546: [COAPP] Indenização de transporte		Estillac Filho	Na Fila para Execução	01/01/2019
2018	TI2118173: [SAM] Padronização do mecanismo de autenticação		Renan Ferreira	Na Fila para Execução	01/01/2019
2018	TI2118269: [e-Corr] Solução de integração dos sistemas da Corregedoria		Estillac Filho	Especificação de requisitos	01/01/2019

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC 	Projeto	 Gerente do Projeto 	 Situação atual 	 Término Previsto 
2018	TI2036632: [Intranet] Padronização de logins de sistemas	Diego Valdez	Especificação de requisitos	17/01/2019
Nenhum	TI2228509: [PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau	Diego Valdez	Na Fila para Execução	17/01/2019
Nenhum	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do 2º grau	Diego Valdez	Na Fila para Execução	17/01/2019
2018	TI2082740: [SAM] Integração com o e-gestão para o cálculo do índice	Estillac Filho	Paralisado por pendência	
2018	TI2117027: [COSIS] Revisão do catálogo dos sistemas	Victor Gonçalves	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2210262: [e-Gestão] Evolução do extrator do legado para versão 2.0	Diego Valdez	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2254521: [RECAD] Recadastramento de Estagiários, Prestadores e Cedidos	Mônica Guimaraes	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2238097: [GECJ] Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ por	Mônica Guimaraes	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2383380: [SEBAD] Criar repositório próprio para as senhas dos bancos de	Abnatal Junior	Na Fila para Execução	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2107177: Definir formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e	Diego Valdez	Execução	31/10/2018
2018	TI2119157: [FolhaWeb] Implantação do sistema	Geraldo Barros	Realizando Entrega Final	31/12/2018
2018	TI2118276: [APP TRT8] Evolução do aplicativo	Estillac Filho	Execução	22/10/2018
2018	TI2119184: [SIGEP] Migração de dados do MENTORH	Daniel Carvalho	Execução	19/12/2018
2018	TI2118533: [Oracle] Restaurar, via rman, backup set físico dos bancos ADMDB	Anderson Maia	Execução	30/11/2018
2018	TI2118541: [PostgreSQL] Restaurar monitoramento através do Zabbix	Anderson Maia	Execução	30/11/2018
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	Estillac Filho	Em Verificação	18/12/2018
Nenhum	TI2136976: [CAPE] Canal de atendimento ao público externo	Diego Valdez	Realizando Entrega Final	15/10/2018
Nenhum	TI2179617: [ConectorPJe] Implantação da solução	Herbet Silva	Realizando Entrega Final	28/09/2018
Nenhum	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS,	Mônica Guimaraes	Homologação	15/10/2018

Coordenadoria de Sistemas

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
Nenhum	TI2210223: [SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	Geraldo Barros	Execução	19/12/2018
Nenhum	TI2242981: [OUVID] Subportal da Ouvidoria TRT8	Reinaldo Carvalho	Em Verificação	03/10/2018
Nenhum	TI2252526: [e-Gestão] Manutenção de itens de pessoal	Diego Valdez	Validação da Entrega Final	
Nenhum	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência	Reinaldo Carvalho	Realizando Entrega Final	14/11/2018
Nenhum	TI2228483: [EJUD] Customização da estrutura e design do Campus Virtual do	Jose Tarrio	Execução	15/10/2018
Nenhum	TI2288161: [GEPREC] Tratar RP de forma individualizada por beneficiário	Renato Sousa	Realizando Entrega Final	09/10/2018
Nenhum	TI2307910: [Wiki] - Criação de Wiki para comportar todos os manuais	Diego Valdez	Execução	14/12/2018
Nenhum	TI2348886: [PJe-Calc] Anexar PJC no PJe	Estillac Filho	Em Verificação	18/12/2018

Governança de TIC

Projetos não iniciados

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
2018	TI2069917: Publicar os Estudos Técnicos Preliminares das Contratações de Soluções de TIC na Intranet	Média	Diego Moraes	19/12/2018
Nenhum	TI2350896: [CSJT] Proposta de Simplificação de Documentos da Metodologia de Projetos do CSJT	Muita alta	Leonardo Feliciano	Não Planejado

Governança de TIC

Projetos na fila para execução

PDTIC ↕	Projeto	↕	Gerente do Projeto ↕	Situação atual ↕	Término Previsto ↕
2018	TI2106668: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2018		Leonardo Feliciano	Aprovação do Escopo	31/10/2018
2018	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019		Flávio Ramos	Aprovação do Escopo	22/11/2018
2018	TI2107189: Revisão 2018 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio		Leonardo Feliciano	Especificação de requisitos	29/11/2018
2018	TI2005293: Revisão 2018 do Processo de Gerenciamento de Mudança (PDTI -		Leonardo Feliciano	Especificação de requisitos	28/06/2019
2019	TI2356924: 3º Encontro de Governança de TIC da JT- 2019		Flávio Ramos	Na Fila para Execução	30/09/2019
2018	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2018		Leonardo Feliciano	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2347977: [CSJT] Descentralização dos Atendimentos do Pje para os TRTs		Leonardo Feliciano	Em Detalhamento Técnico	Não Planejado

Governança de TIC

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2107173: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019	Diego Moraes	Execução	28/09/2018
2018	TI2107172: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2019	Flávio Ramos	Execução	16/11/2018
2018	TI2108954: Análise quantitativa e qualitativa dos servidores em 2018	Flávio Ramos	Execução	16/10/2018
2018	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Flávio Ramos	Execução	14/11/2018

Segurança de Informação

Projetos não iniciados

Nenhuma ocorrência.

Segurança de Informação

Projetos na fila para execução

PDTIC 	Projeto	 Gerente do Projeto 	Situação atual 	Término Previsto 
2018	TI2119225: Implantar Monitoramento de eventos de segurança (PDTI - 2019)	Alfredo Gonçalves	Especificação de requisitos	16/11/2018
2018	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	Márcel Mota	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2119222: Migrar regras e configurações o novo Firewall camada 7 (PDTI	Alfredo Gonçalves	Especificação de requisitos	31/01/2019
2018	TI2119216: Realizar a Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos	Thiago Gilla	Na Fila para Execução	31/10/2019
2018	TI2119243: Instituir formalmente processo de ger. de continuidade de serviços essenciais	Thiago Gilla	Especificação de requisitos	19/12/2019

Segurança de Informação

Projetos em execução

Nenhuma ocorrência.

Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente=Geraldo%20Duraes>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **04/10/2018**
