

Portfólio de Projetos de TIC


Outubro de 2018

A white line graphic consisting of several connected line segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

TRT8
Pará e Amapá

Visão geral dos Projetos de TIC

Projetos MGP-TI
3,3%

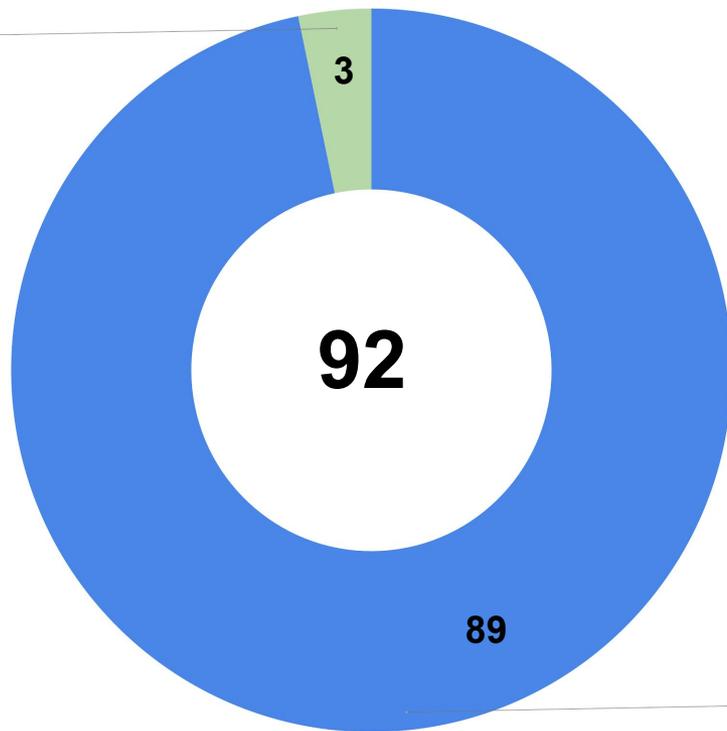

Projeto Simplificado
96,7%

Projetos MGP-TI: projetos autorizados que seguem o processo de Gestão de Projetos definido na Metodologia de Gestão de Projetos de TI da SETIN.

Projetos simplificados: projetos autorizados que seguem o processo simplificado de Gestão de Projetos.

Projetos do PDTIC 2018

**Total de Projetos
do PDTIC 2018**

85

PROJETOS

**Projetos FINALIZADOS
do PDTIC 2018**

40

PROJETOS

**Completude do
PDTIC 2018**

47 %

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
EXECUTADOS em 2018

69

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
FINALIZADOS em 2018

24

PROJETOS

Restam a concluir

45

PROJETOS

Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ
outubro de 2018**

64

PROJETOS

**FINALIZADOS EM
outubro de 2018**

10

PROJETOS

**Restam a
concluir**

(Não Previstos + PDTIC 2018 + PDTIC 2019)

92

PROJETOS

Entrada e Saída de Projetos no Portfólio

Quantidade de Projetos Não Previstos
que entraram:
16 projetos para Execução

setembro/2018



Quantidade de Projetos que saíram:
10 projetos Finalizados



outubro/2018

Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Segurança

13,0%

Governança


13,0%

COINS

22,8%

COSIS

51,1%

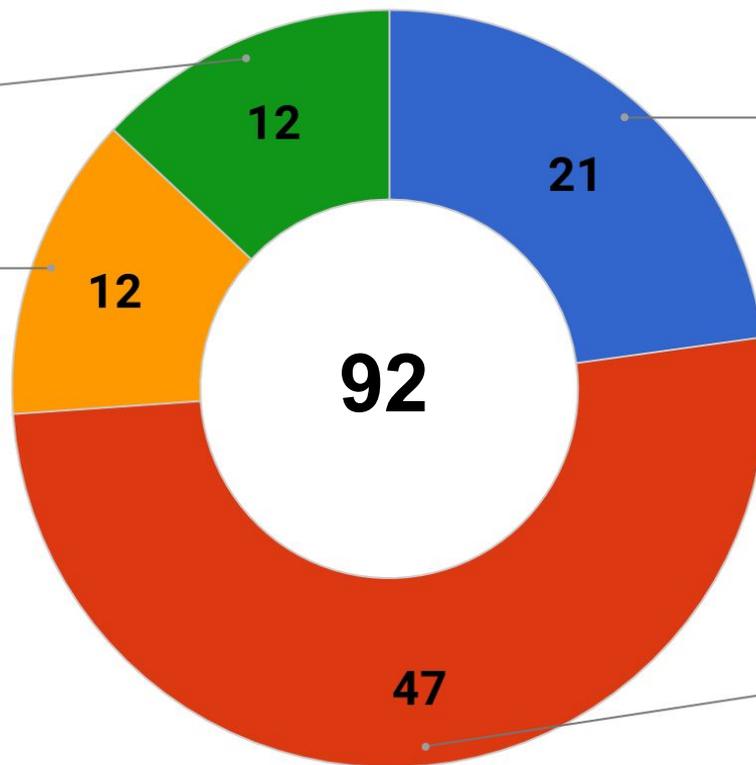

Projetos aguardando aprovação e priorização

Projeto	Situação atual	Responsável	Demandante
2211007: [ASCOM] Sustentabilidade pelo Hórus	Parecer técnico	COSIS	ASCOM
2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos órgãos colegiados no Portal	Parecer técnico	COSIS	SEJUD
2244472: Integração PJe x SAPIENS via MNI	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2257987: PROJETO DE ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ELETRÔNICA CORREICIONAL ? GEC	Parecer técnico	COSIS	COR08
2263129: [SIGEP-PROGECOM] Implantação do Módulo para Gestão de Competências - v3.0.0	Parecer da Coordenadoria	COSIS	COSIS
2283089: [DIGER] Implantação de solução de ponto eletrônico no TRT da 8ª Região	Parecer da Coordenadoria	COSIS	DIGER
2288931: [GEPREC] Relatório de Pagamento Federal CFIN/CSJT - 2018	Parecer técnico	COSIS	DIPRE
2305680: [APT] Cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos	Parecer técnico	COSIS	SeDOC
2339257: [FROTA] Sistema de Controle de Carros	Parecer da Coordenadoria	COSIS	COSIS
2355994: [ASCOM] TV Corporativa	Parecer técnico	COSIS	ASCOM
2373417: [Projeto - 2018] [SEBAD] Elaboração de documentação de procedimentos de restauração	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2373451: [Projeto - 2018] [SEBAD] Elaborar plano de contingência para cada ambiente de produção	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2373453: [Projeto - 2018][SEBAD] Elaborar política de desligamento / religamento das máquinas	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2373458: [Projeto - 2018] [SEBAD] Elaborar / Documentar estratégia de manutenção	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2373463: [Projeto - 2018] [PostgreSQL] Separação do cluster de dados do PJe	Parecer técnico	COSIS	COSIS

Projetos aguardando aprovação e priorização

Projeto	Situação atual	Responsável	Demandante
2380032: [PJe-Calc] Homologação de Cálculo	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2380037: [PJe-Calc] Assinatura de Sentença Líquida	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2380043: [PJe-Calc] Acesso à Tela de Cálculos e Links para PJe-Calc	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2380046: [PJe-Calc] Nó de Liquidação Prévia de Sentença Líquida	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2380061: [PJe-Calc] Serviço Exibição de Valor Atualizado Estimado	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2383392: Protocolo on line do malote	Parecer técnico	COSIS	VTMCP.07
2386878: Conformidade da Política de Controle de Ativos de TI (PDTIC - 2019)	Parecer técnico	SI	SETIN
2386881: Conformidade e Revisão da Política de Backup de Dados (PDTIC - 2019)	Parecer técnico	SI	SETIN
2391463: - Instituir formalmente processo de Segurança da Informação	Parecer técnico	SI	SETIN
2391470: Migração da execução dos antivírus dos servidores da máquina virtual para a física	Parecer técnico	SI	SETIN
2391475: Realizar a análise de vulnerabilidade dos servidores do PJe com o Nexpose	Parecer técnico	SI	SETIN
2391630: Vigilância eletrônica no prédio da Gaspar Viana	Parecer técnico	COINS	DIGER
2394151: [GEPREC] Documentação da Base de Dados	Parecer técnico	COSIS	SeSIC
2394172: [GEPREC] Conversão e usabilidade do aplicativo de submissão de Remessa de Precatórios para o CNJ	Parecer técnico	COSIS	SeSIC

Projetos aguardando aprovação e priorização

Projeto	Situação atual	Responsável	Demandante
2394735: [GEPREC] Geração automática do OFÍCIO REQUISITÓRIO""	Parecer técnico	COSIS	DIPRE
2395767: [GEPREC] Auditoria do Período de Atualização de Cálculos	Parecer técnico	COSIS	DIPRE
2396981: Integração do Google com o AD	Parecer técnico	COINS	SETIN
2401095: MySQL - Atualização do ambiente de Desenvolvimento	Parecer técnico	COSIS	COSIS
2408309: [PortalCOPAS] - Portal do Plano de Saúde do TRT da 8ª Região	Parecer técnico	COSIS	SETIN
2428044: [e-Gestão] Implementação de solução para carga de dados de pessoal oriundos do SIGEP	Parecer técnico	COSIS	NUPJE

Metodologia de Desenvolvimento de Software

Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:

Victor Gonçalves

Parecer gerencial:

A metodologia e o processo de sustentação de software foram instituídos formalmente através da Portaria PRESI nº 770/2018. Na etapa seguinte será iniciado o trabalho para treinamento da equipe na nova metodologia de sustentação de software.

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.1
Cronograma	v1.0
Entrega da Metodologia	04/04/2018
Término do Projeto	18/04/2018

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto	84%
Cumprimento de Prazo	0,70 70% de atraso
Término do Projeto	25/09/2018

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos não iniciados

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
2019	TI2342464: [Projeto - 2018] Virtualização dos Desktops Corporativos	Baixa	Rafael Cruz	Não Planejado
Nenhum	TI2344155: Operacionalização dos serviços de N1 e N2 (Central de Serviços) da empresa vencedora da licitação.	Média	Geraldo Durães	Não Planejado

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2115345: Virtualização dos Desktops Corporativos (PDTI - 2019)	Rafael Cruz	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2115356: Modernização da infraestrutura de acesso ao PJe nas salas de	Geraldo Durães	Na Fila para Execução	19/12/2018
2018	TI2115197: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de Configuração e Ativos	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	19/12/2018
2018	TI2115354: Renovação do parque de ativos de rede corporativa	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	31/12/2018
2018	TI2006205: Implantação do site backup corporativo em nuvem	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	28/06/2019
2018	TI2115343: Segregação das Redes dos Ambientes de Produção, Homologação, Desenvolvimento e	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	28/06/2019
2018	TI2115295: Implantação da Rede Wireless	Rafael Cruz	Paralisado por pendência	
2018	TI2115350: Implantação da nova rede de dados corporativa de interligação da	Rafael Cruz	Paralisado por pendência	
2018	TI2115357: Implantação de infraestrutura do prédio Gaspar Viana	Gilmara Silva	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2407978: Renovação do parque de servidores de rede fora da Sede	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2408005: Implantação da infraestrutura de Telecom do Anexo V	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2408028: Modernização da solução de backup (Appliance de disco + backup	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2408054: Implantação do servidor de backup para os serviços de rede	Rafael Cruz	Na Fila para Execução	Não Planejado

Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2115190: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de central de serviços	Geraldo Durães	Execução	30/11/2018
2018	TI2115192: Revisão 2018 do processo de gerenciamento do catálogo de serviços	Geraldo Durães	Execução	30/11/2018
2018	TI2115193: Revisão 2018 do processo de gerenciamento dos acordos de nível	Geraldo Durães	Execução	30/11/2018
2018	TI2115194: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de requisições	Geraldo Durães	Execução	30/11/2018
2018	TI2115195: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de incidentes	Geraldo Durães	Execução	30/11/2018

Coordenadoria de Sistemas

Projetos não iniciados

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
Nenhum	TI2261388: [PROAD] Implantação da Consulta Externa de Processos Administrativos	Média	Mônica Guimaraes	29/03/2019
2018	TI2118652: [SEBAD] Elaboração de documentação de procedimentos de restauração (PDTI - 2019)	Baixa	Anderson Maia	19/12/2019
2018	TI2118660: [SEBAD] Elaborar plano de contingência para cada ambiente de produção (PDTI 2019)	Baixa	Anderson Maia	19/12/2019
2018	TI2118657: [SEBAD] Elaborar política de desligamento / religamento das máquinas (PDTI - 2019)	Baixa	Anderson Maia	19/12/2019
2018	TI2118653: [SEBAD] Elaborar / Documentar estratégia de manutenção dos bancos de produção (PDTI - 2019)	Baixa	Anderson Maia	19/12/2019
2018	TI2118645: [PostgreSQL] Separaração do cluster de dados do PJe (PDTI - 2019)	Média	Anderson Maia	19/12/2019
Nenhum	TI2260126: [COSIS] - Sistema de Catálogo de Sistemas	Média	Mônica Guimaraes	19/12/2019

Coordenadoria de Sistemas

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
Nenhum	TI2252727: [SCMP] PAINEL DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES	Geraldo Barros	Especificação de requisitos	31/10/2018
Nenhum	TI2196623: [GEPREC] Mudança de status - Beneficiário de prioridade processual.	Renato Sousa	Especificação de requisitos	14/11/2018
2018	TI2115507: [GEPREC] Aprimoramento do registro de pagamentos fora do precatórioREC	Renato Sousa	Especificação de requisitos	10/12/2018
Nenhum	TI2266143: [SILC] Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Geraldo Barros	Aprovação do Escopo	19/12/2018
2018	TI2023546: [COAPP] Indenização de transporte	Estillac Filho	Na Fila para Execução	01/01/2019
2018	TI2118173: [SAM] Padronização do mecanismo de autenticação	Renan Ferreira	Na Fila para Execução	01/01/2019
2018	TI2118269: [e-Corr] Solução de integração dos sistemas da Corregedoria	Estillac Filho	Especificação de requisitos	01/01/2019
2018	TI2036632: [Intranet] Padronização de logins de sistemas	Diego Valdez	Especificação de requisitos	17/01/2019
Nenhum	TI2228509: [PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau	Diego Valdez	Na Fila para Execução	17/01/2019
Nenhum	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do 2º grau	Diego Valdez	Na Fila para Execução	17/01/2019
2018	TI2082740: [SAM] Integração com o e-gestão para o cálculo do índice	Estillac Filho	Paralisado por pendência	
2018	TI2117027: [COSIS] Revisão do catálogo dos sistemas	Victor Gonçalves	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2238097: [GECJ] Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ por	Mônica Guimaraes	Paralisado por pendência	
Nenhum	TI2377097: [BANEX] Modificações nos Relatórios do BANEX	Diego Valdez	Na Fila para Execução	Não Planejado
Nenhum	TI2403058: [GEPREC] Alteração regra de fixação de limite para pagamento de	Renato Sousa	Aprovação do Escopo	Não Planejado

Coordenadoria de Sistemas

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2107177: Definir formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e	Diego Valdez	Execução	19/12/2018
2018	TI2119157: [FolhaWeb] Implantação do sistema	Geraldo Barros	Realizando Entrega Final	31/12/2018
2018	TI2118276: [APP TRT8] Evolução do aplicativo	Estillac Filho	Homologação	19/12/2018
2018	TI2119184: [SIGEP] Migração de dados do MENTORH	Daniel Carvalho	Execução	19/12/2018
2018	TI2118533: [Oracle] Restaurar, via rman, backup set físico dos bancos ADMDB	Anderson Maia	Execução	30/11/2018
2018	TI2118541: [PostgreSQL] Restaurar monitoramento através do Zabbix	Anderson Maia	Execução	30/11/2018
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	Estillac Filho	Realizando Entrega Final	18/12/2018
Nenhum	TI2179617: [ConectorPJe] Implantação da solução	Herbet Silva	Realizando Entrega Final	19/12/2018
Nenhum	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS,	Mônica Guimaraes	Homologação	19/12/2018
Nenhum	TI2210223: [SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	Rogério Pimentel	Execução	19/12/2018
Nenhum	TI2242981: [OUVID] Subportal da Ouvidoria TRT8	Reinaldo Carvalho	Em Verificação	19/12/2018
Nenhum	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência	Reinaldo Carvalho	Realizando Entrega Final	19/12/2018
Nenhum	TI2228483: [EJUD] Customização da estrutura e design do Campus Virtual do	Jose Tarrío	Homologação	19/12/2018
Nenhum	TI2307910: [Wiki] - Criação de Wiki para comportar todos os manuais	Diego Valdez	Execução	31/01/2019
Nenhum	TI2289215: [GEPREC] Implementar Recursos de Acessibilidade	Renato Sousa	Execução	04/02/2019
Nenhum	TI2348886: [PJe-Calc] Anexar PJC no PJe	Estillac Filho	Realizando Entrega Final	18/12/2018

Coordenadoria de Sistemas

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
Nenhum	TI2378115: [PostgreSQL] - Disponibilização de cluster de dados próprio	Anderson Maia	Execução	19/12/2018
Nenhum	TI2383406: [PostgreSQL] Aferir desempenho das operações de manutenção do	Anderson Maia	Execução	31/12/2018
Nenhum	TI2399974: GECJ - Rotina de cálculo de retroativo para Desembargadores	Diego Valdez	Em Verificação	19/12/2018

Governança de TIC

Projetos não iniciados

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
2018	TI2069917: Publicar os Estudos Técnicos Preliminares das Contratações de Soluções de TIC na Intranet	Média	Diego Moraes	19/12/2018

Governança de TIC

Projetos na fila para execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019	Flávio Ramos	Na Fila para Execução	22/11/2018
2018	TI2107189: Revisão 2018 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio	Leonardo Feliciano	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2018	Leonardo Feliciano	Na Fila para Execução	19/12/2018
2018	TI2005293: Revisão 2018 do Processo de Gerenciamento de Mudança (PDTI -	Leonardo Feliciano	Especificação de requisitos	28/06/2019
2019	TI2356924: 3º Encontro de Governança de TIC da JT- 2019	Flávio Ramos	Na Fila para Execução	30/09/2019
Nenhum	TI2347977: [CSJT] Descentralização dos Atendimentos do PJe para os TRTs	Leonardo Feliciano	Em Detalhamento Técnico	Não Planejado

Governança de TIC

Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2018	TI2107173: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019	Diego Moraes	Realizando Entrega Final	28/09/2018
2018	TI2107172: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2019	Flávio Ramos	Execução	16/11/2018
2018	TI2106668: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2018	Leonardo Feliciano	Validação da Entrega Final	
2018	TI2108954: Análise quantitativa e qualitativa dos servidores em 2018	Flávio Ramos	Execução	16/10/2018
2018	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Flávio Ramos	Execução	14/11/2018

Segurança de Informação

Projetos não iniciados

PDTIC 	Projeto	 Prioridade 	Gerente do Projeto 	Término Previsto 
Nenhum	TI2386849: Planejamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	Alta	Thiago Gilla	Não Planejado
Nenhum	TI2386854: Elaboração e conformidade da Norma de Utilização de Recursos de TIC	Alta	Thiago Gilla	Não Planejado
Nenhum	TI2386863: Revisão da Política de Controle de Ativos de TI	Alta	Thiago Gilla	Não Planejado
Nenhum	TI2386865: Revisão da Política de Controle de Acesso aos Recursos de TI	Média	Thiago Gilla	Não Planejado
Nenhum	TI2386870: Revisão da Política de Segurança da Informação	Média	Thiago Gilla	Não Planejado
Nenhum	TI2386873: Conformidade da Política de Controle de Acesso aos Recursos de TI	Média	Thiago Gilla	Não Planejado
Nenhum	TI2386884: Instituir formalmente processo de controle de acesso aos recursos de TI	Média	Thiago Gilla	Não Planejado

Segurança de Informação

Projetos na fila para execução

PDTIC ↑↓	Projeto	Gerente do Projeto ↑↓	Situação atual	Término Previsto ↓
2018	TI2119225: Implantar Monitoramento de eventos de segurança (PDTI - 2019)	Alfredo Gonçalves	Especificação de requisitos	16/11/2018
2018	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	Márcel Mota	Especificação de requisitos	19/12/2018
2018	TI2119222: Migrar regras e configurações o novo Firewall camada 7 (PDTI	Alfredo Gonçalves	Especificação de requisitos	31/01/2019
2018	TI2119216: Realizar a Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos	Thiago Gilla	Na Fila para Execução	31/10/2019
2018	TI2119243: Instituir formalmente processo de ger. de continuidade de serviços essenciais	Thiago Gilla	Especificação de requisitos	19/12/2019

Segurança de Informação

Projetos em execução

Nenhuma ocorrência.

Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
 - <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente=Geraldo%20Duraes>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **07/11/2018**
