


Portfólio de Projetos de TIC

novembro de 2019

Planejamento dos Projetos de TIC

Acumulado no ano

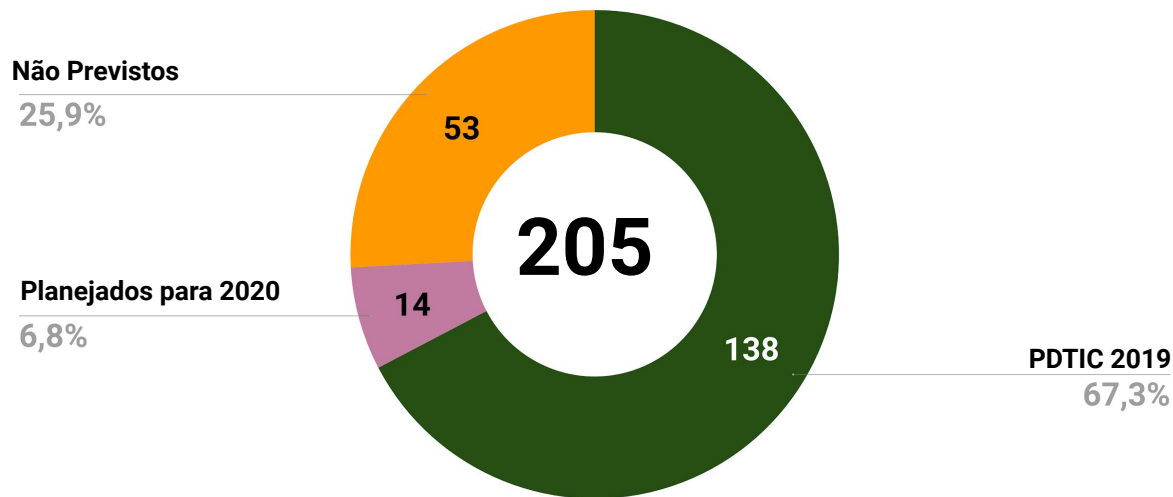


PDTIC 2019: projetos autorizados para serem executados em 2019 que constam na Portaria PRESI nº 186/2019

Planejados para 2020: projetos autorizados, mas que estão planejados para iniciar apenas em 2020.

Não Previstos: projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2019 e que irão ser iniciados em 2019. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura “Nenhum”.

Visão geral dos Projetos de TIC

Acumulado no ano

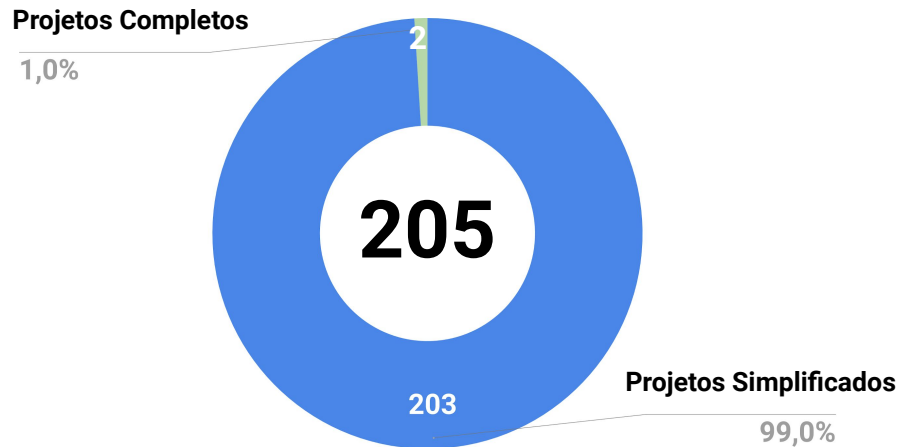


Projetos Completos: projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida completo de Gestão de Projetos.

Projetos Simplificados: projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida simplificado de Gestão de Projetos.


Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Acumulado no ano

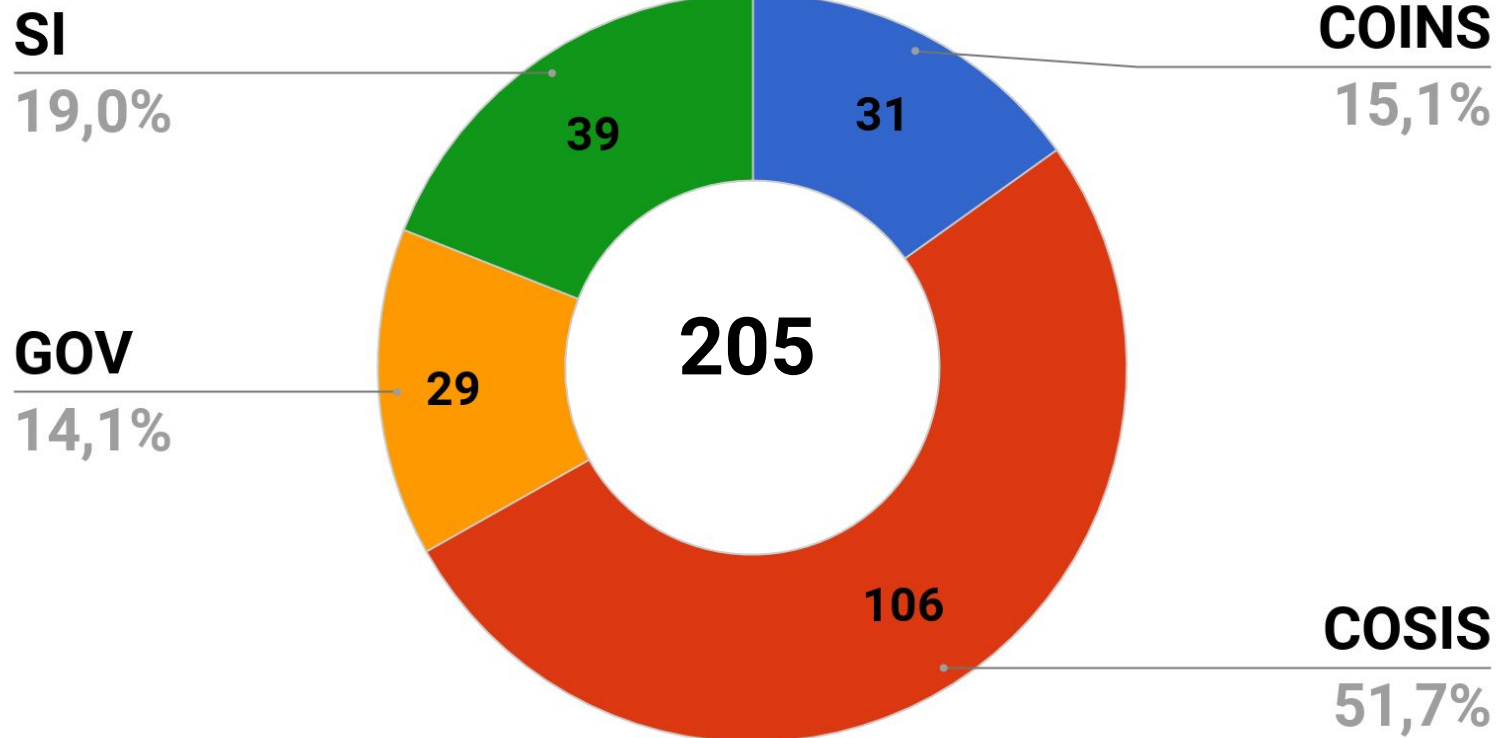

Backlog de Projetos de TIC

Situação atual

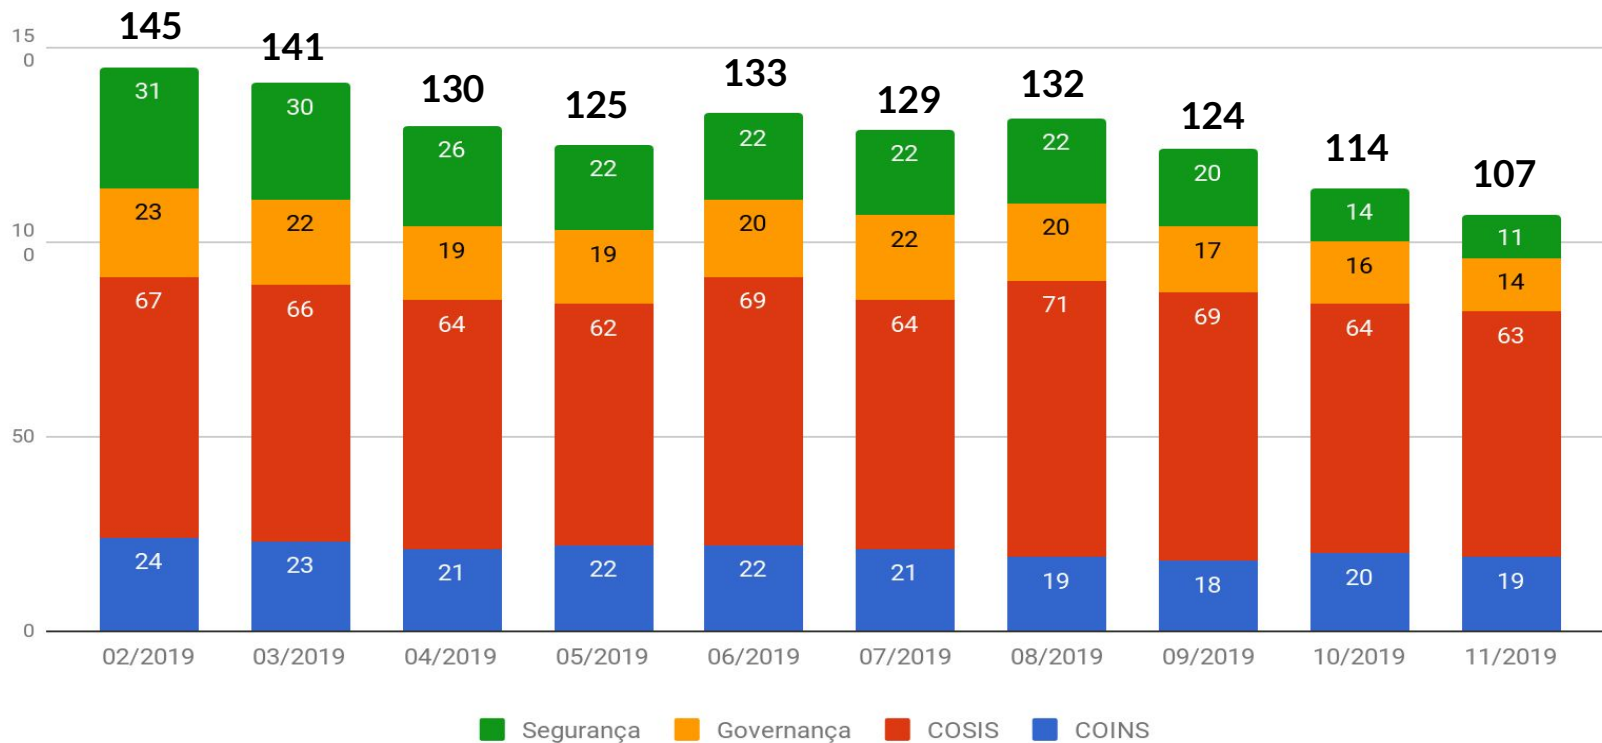

Projetos do PDTIC 2019

**Total de Projetos
do PDTIC 2019**

138

PROJETOS

**Projetos FINALIZADOS
do PDTIC 2019**

77

PROJETOS

**Compleitude do
PDTIC 2019**

56%

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
INCLUÍDOS em 2019

53

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
FINALIZADOS em 2019

17

PROJETOS

Restam a finalizar

36

PROJETOS

Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ
novembro de 2019**

94

PROJETOS

**FINALIZADOS EM
novembro de 2019**

7

PROJETOS

**Restam a
finalizar**

107

PROJETOS

Observação: São contabilizados também os projetos do PDTIC 2020.

Entrada e Saída de Projetos no Backlog da SETIN

Quantidade de Projetos Não Previstos
que entraram:
0 projetos

outubro/2019



Quantidade de Projetos que saíram:
7 projetos Finalizados



novembro/2019

Projetos Finalizados Neste Mês (novembro de 2019)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2119225: Implantar Monitoramento de eventos de segurança	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	24/11/2019
2019	TI2386881: Conformidade e Revisão da Política de Backup de Dados	Concluído	SI	Marco R.	Thiago G.	Thiago G.	.	.	.	.	20/11/2019
2019	TI2444280: Revisão 2019 do processo de gerenciamento de Catálogo de Serviços e	Concluído	COINS	Geraldo D.	Thiago A.	Geraldo D.	.	.	.	.	10/11/2019
2019	TI2196623: [GPPEC] Desenvolvimento de mudança de status - Beneficiário de prioridade processual	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	07/11/2019
2019	TI2432516: Revisão 2019 do PETIC	Concluído	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Flávio R.	Diego M.	Leonardo F.	.	.	05/11/2019
2019	TI2432530: Revisão do Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC	Concluído	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Flávio R.	Leonardo F.	Diego M.	.	.	05/11/2019
2019	TI2465205: Configurar IPS no Firewall	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	05/11/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2119225: Implantar Monitoramento de eventos de segurança	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	24/11/2019
2019	TI2386881: Conformidade e Revisão da Política de Backup de Dados	Concluído	SI	Marco R.	Thiago G.	Thiago G.	.	.	.	.	20/11/2019
2019	TI2444280: Revisão 2019 do processo de gerenciamento de Catálogo de Serviços e	Concluído	COINS	Geraldo D.	Thiago A.	Geraldo D.	.	.	.	.	10/11/2019
2019	TI2196623: [GPPEC] Desenvolvimento de mudança de status - Beneficiário de prioridade processual	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	07/11/2019
2019	TI2432516: Revisão 2019 do PETIC	Concluído	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Flávio R.	Diego M.	Leonardo F.	.	.	05/11/2019
2019	TI2432530: Revisão do Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC	Concluído	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Flávio R.	Leonardo F.	Diego M.	.	.	05/11/2019
2019	TI2465205: Configurar IPS no Firewall	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	05/11/2019
2019	TI2445450: Instituir o processo de Gerenciamento da Elaboração, Acompanhamento e Revisão da	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	.	.	.	.	31/10/2019
2019	TI2119243: Instituir formalmente processo de ger. de continuidade de serviços essenciais de	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	.	.	.	.	22/10/2019
2019	TI2386863: Revisão 2019 da Política de Controle de Ativos de TI	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	.	.	.	.	22/10/2019
2019	TI2386865: Revisão 2019 da Política de Controle de Acesso aos Recursos de	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	.	.	.	.	22/10/2019
2019	TI2432883: Revisão 2019 do processo de gerenciamento de ATIVOS/RISCOS de segurança da	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	.	.	.	.	22/10/2019
2019	TI2117027: [COSIS] Revisão do catálogo dos sistemas	Concluído	COSIS	Mônica G.	Victor G.	Victor G.	.	.	.	.	20/10/2019
2019	TI2118657: [SEBAD] Elaborar política de desligamento / religamento das máquinas	Cancelado	COSIS	Anderson M.	Abnatal J.	.	.	.	.	.	20/10/2019
2019	TI2465299: Conformidade das instalações dos antivírus nas estações de trabalhos e nos	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	15/10/2019
Nenhum	TI2576271: [Wiki] Desenvolvimento da Wiki técnica da COSIS	Cancelado	COSIS	Victor G.	Vitor P.	.	.	.	.	.	15/10/2019
2019	TI2432886: Revisão 2019 do processo de gerenciamento de incidentes de segurança da	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	.	.	.	.	11/10/2019
Nenhum	TI2616858: Sistema de Gestão de Projetos relacionados a Pessoas	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	11/10/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
Nenhum	TI2503335: [INTRANET] Atualização da Infraestrutura do Servidor Intranet	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Ronald P.	.	.	.	.	04/10/2019
2019	TI2466042: Renovação do parque de computadores no Tribunal	Concluído	COINS	Geraldo D.	Francisco S.	Francisco S.	.	.	.	.	03/10/2019
2020	TI2023546: [COAPP] Indenização de transporte	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Aline S.	.	.	.	.	.	02/10/2019
2019	TI2395767: [GPPEC] Desenvolvimento de Auditoria do período de atualização de cálculos	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Felipe M.	.	.	.	.	02/10/2019
2019	TI2437507: [GPPEC] Desenvolvimento de alterações na definição de prioridade de pagamento	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	02/10/2019
Nenhum	TI2570128: [GPPEC] Desenvolvimento de Listagem de RPV Municipal, Estadual e Federal e	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Felipe M.	.	.	.	.	01/10/2019
2019	TI2481327: Implementação de Infraestrutura Baseada em Contêiner	Concluído	COINS	George F.	George F.	Marcelo A.	George F.	.	.	.	26/09/2019
Nenhum	TI2556688: Sistema de Ordens de Serviço para a SEGEP	Cancelado	COINS	Paulo L.	Geraldo D.	.	.	.	.	.	25/09/2019
2019	TI2432529: iGov - CNJ 2019.	Concluído	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Flávio R.	Diego M.	Leonardo F.	.	.	24/09/2019
2019	TI2432526: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2019	Concluído	GOV	Diego M.	Diego M.	Diego M.	Flávio R.	.	Leonardo F.	.	23/09/2019
2019	TI2356924: 3º Encontro de Governança de TIC da JT- 2019	Cancelado	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Diego M.	Leonardo F.	Marco R.	.	13/09/2019
2019	TI2436320: IGGP - TCU 2019	Cancelado	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Leonardo F.	Diego M.	.	.	13/09/2019
2019	TI2465204: Configurar serviço de controle de aplicações no firewall	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	12/09/2019
2019	TI2465280: Configurar host IPS através do ePO	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	.	.	.	.	.	12/09/2019
Nenhum	TI2485800: [Selo Justiça em Número] Adaptação da rotina de remessa de dados	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexandre A.	.	.	.	.	11/09/2019
2019	TI2115295: Implantação da Rede Wireless	Concluído	COINS	Rafael C.	Marcelo O.	Jadiel M.	Claúdio S.	Alison S.	.	.	06/09/2019
2019	TI2432488: [PostgreSQL] Retirada dos binários das bases de documentos processuais	Cancelado	COSIS	Anderson M.	Abnatal J.	Abnatal J.	Anderson M.	.	.	.	04/09/2019
Nenhum	TI2652268: [Portal] Adequação do Portal à identidade visual da JT	Cancelado	COSIS	Reinaldo C.	Aline S.	.	.	.	.	.	04/09/2019
2019	TI2408309: [Portal PAS] Desenvolvimento do Portal do Plano de Saúde do TRT	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Aline S.	Reinaldo C.	Jose T.	.	.	.	03/09/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
Nenhum	TI2542943: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Automação da Atualização das Tabelas de Índices	Concluído	COSIS	Renan F.	Victor G.	Sandro M.	.	.	.	.	02/09/2019
2019	TI2242981: [OUVID] Desenvolvimento do subportal da Ouvidoria TRT8	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Aline S.	Reinaldo C.	Jose T.	.	.	.	23/08/2019
2019	TI2433929: [SIMVIDA] Customização para Nacionalização da Solução	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Aline S.	.	.	.	.	.	22/08/2019
2019	TI2432553: Proposta de substituição da suite de escritório desktop (opneoffice) pela plataforma	Concluído	COINS	Rafael C.	Lindalvo N.	Lindalvo N.	Fernando S.	Fabricio P.	.	.	20/08/2019
2020	TI2118173: [SAM] Padronização do mecanismo de autenticação	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Victor G.	.	.	.	.	.	14/08/2019
2019	TI2115354: Renovação do parque de ativos de rede corporativa	Concluído	COINS	Rafael C.	Allison S.	Jadiel M.	Marcelo O.	Claúdio S.	.	.	14/08/2019
2019	TI2437462: [SAM] Elaboração de documentação técnica e negocial	Cancelado	COSIS	Victor G.	Victor G.	Vitor P.	.	.	.	.	14/08/2019
2019	TI2436317: Revisão Anual do Manual de Contratações de Soluções de TIC 2019	Concluído	GOV	Diego M.	Diego M.	Diego M.	Flávio R.	.	.	.	12/08/2019
2019	TI2436333: Revisão 2019 do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	Concluído	GOV	Diego M.	Diego M.	Diego M.	Flávio R.	.	.	.	02/08/2019
2019	TI2433930: [TRT8 Corporativo] Módulo Contracheque - Mentorh	Concluído	COSIS	Alayr S.	Aline S.	Alayr S.	Paulo C.	.	.	.	05/07/2019
2019	TI2433932: [TRT8 Corporativo] Módulo Calendário Institucional	Concluído	COSIS	Alayr S.	Aline S.	Alayr S.	Paulo C.	.	.	.	05/07/2019
2019	TI2307910: [Wiki] Criação de Wiki para comportar todos os manuais dos sistemas	Cancelado	COSIS	Victor G.	Aline S.	Victor G.	.	.	.	.	04/07/2019
2019	TI2437484: [SABB] Implantação do Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários	Concluído	COSIS	Herbet S.	Ramon R.	Ramon R.	.	.	.	.	04/07/2019
2019	TI2107177: [EGPTI] Formalização das diretrizes para gestão do portfólio de projetos e	Concluído	COSIS	Diego V.	Leonardo F.	Diego V.	Aline S.	.	.	.	02/07/2019
Nenhum	TI2511284: [EPTI] Sistema de Gestão de Projetos para Portal de Governança Insitucional	Cancelado	COSIS	Leonardo F.	Aline S.	Leonardo F.	Aline S.	Flávio R.	Reinaldo C.	.	02/07/2019
2019	TI2465197: Configurar VPN client to site TRT8	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	21/05/2019
Nenhum	TI2481272: Aquisição de certificado digital A1 - ICP-Brasil	Cancelado	SI	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	.	16/05/2019
2019	TI2437292: Migração das regras do proxy para o novo firewall.	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	15/05/2019
2019	TI2433888: [GPPEC] Nacionalização do sistema de Gestão de Precatórios - Fase 1	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	10/05/2019
2019	TI2432506: [MySQL] Customização e implantação do template MySQL Zabbix	Concluído	COSIS	Abnatal J.	Daniel O.	Abnatal J.	.	.	.	.	10/05/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2378115: [PostgreSQL] - Disponibilização de cluster de dados próprio para	Concluído	COSIS	Anderson M.	Anderson M.	Anderson M.	.	.	.	.	08/05/2019
2019	TI2465192: Implantar o sistema de relatoria e logs	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Alfredo G.	.	.	.	.	06/05/2019
2019	TI2436330: Revisão anual do processo de Gestão do Plano de Capacitação dos	Concluído	GOV	Diego M.	Diego M.	Diego M.	.	.	.	.	25/04/2019
2020	TI2115345: Virtualização dos Desktops Corporativos	Cancelado	COINS	Rafael C.	Victor B.	Rafael C.	Victor B.	Alison S.	Lindalvo N.	.	22/04/2019
2019	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2018	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Diego M.	Leonardo F.	Flávio R.	.	.	08/04/2019
2019	TI2228483: [EJUD] Customização da estrutura e design do Campus Virtual do TRT8	Concluído	COSIS	Jose T.	Victor G.	Jose T.	.	.	.	.	08/04/2019
2019	TI2465273: Configurar no WAF proteção dos sistemas MentoRH e PJe Consulta	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	.	.	.	.	.	05/04/2019
2019	TI2465275: Configurar no WAF proteção dos sistemas PJe 2ª instância	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	.	.	.	.	.	05/04/2019
2019	TI2465320: Configurar no WAF proteção dos sistemas que não são críticos que	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	.	.	.	.	.	05/04/2019
2019	TI2465274: Configurar no WAF proteção dos sistemas PJe 1ª instância	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	.	.	.	.	.	05/04/2019
2019	TI2347977: [CSJT] Descentralização dos Atendimentos do PJe para os TRTs	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	Ramon R.	Diego V.	Alexandre A.	Thiago A.	03/04/2019
2019	TI2383406: [PostgreSQL] Aferir desempenho das operações de manutenção do banco	Cancelado	COSIS	Anderson M.	Anderson M.	Anderson M.	Abnatal J.	.	.	.	03/04/2019
Nenhum	TI2509612: Atualização do Sistema de Gerenciamento de Repositório de Software - GITLAB	Concluído	COINS	George F.	George F.	George F.	.	.	.	.	01/04/2019
2019	TI2380043: [PJe-Calc] Implementação de acesso à tela de cálculos	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	.	.	.	.	27/03/2019
2019	TI2380046: [PJe-Calc] Nó de Liquidação Prévia de Sentença Líquida	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Victor G.	.	.	.	.	.	26/03/2019
2019	TI2394151: [GPREC] Documentação da base de dados	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Renato S.	.	.	.	.	26/03/2019
2019	TI2433890: [PJe-Calc] Links para o PJe-Calc no PJe	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Victor G.	.	.	.	.	.	26/03/2019
2019	TI2437147: Estruturação da base de conhecimento na Wiki	Concluído	COINS	Geraldo D.	Cesar T.	Joao L.	Cesar T.	.	.	.	22/03/2019
2019	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019.	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	.	.	.	.	19/03/2019
2019	TI2465183: Limitador de banda de internet através do firewall	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	19/03/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
Nenhum	TI2495704: Criação de servidor SVN	Concluído	COINS	George F.	Diego V.	George F.	.	.	.	.	15/03/2019
2019	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do 2º grau	Concluído	COSIS	Diego V.	Victor G.	Ronald P.	.	.	.	.	13/03/2019
2019	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS, inclusive	Concluído	COSIS	Mônica G.	Aline S.	Avelino P.	.	.	.	.	25/02/2019
2019	TI2479549: Estudo técnico relacionado a demanda de certificados no TRT8	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	25/02/2019
2019	TI2465187: Implantar o WAF	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Alfredo G.	.	.	.	.	22/02/2019
2019	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Cancelado	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	14/02/2019
2019	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência do	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	Reinaldo C.	.	.	.	.	14/02/2019
2019	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	13/02/2019
2019	TI2119222: Implantar o Next Generation (Firewall) adquirido pelo Tribunal	Cancelado	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	11/02/2019
Nenhum	TI2507759: Implantar o NG Firewall adquirido pelo TRT8	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	.	.	.	.	11/02/2019
2019	TI2399974: GECJ - Rotina de cálculo de retroativo para Desembargadores	Concluído	COSIS	Diego V.	Avelino P.	Avelino P.	.	.	.	.	07/02/2019
Nenhum	TI2481436: Relatório Anual 2018 de Gestão (Prestação de contas TCU)	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	07/02/2019
Nenhum	TI2244472: [PJe] Integração PJe x SAPIENS via MNI	Concluído	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Adevaldo S.	.	.	.	.	04/02/2019
2019	TI2348886: [PJe-Calc] Anexar PJC no PJe	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	.	.	.	.	29/01/2019
Nenhum	TI2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos órgãos colegiados no Portal	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	Reinaldo C.	.	.	.	.	29/01/2019
2019	TI2386849: Planejamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Thiago G.	.	.	.	.	24/01/2019
2019	TI2386854: Elaboração e conformidade da Norma de Utilização de Recursos de TIC	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	.	.	.	.	24/01/2019
2019	TI2401095: [MySQL] Atualização do ambiente de desenvolvimento	Concluído	COSIS	Anderson M.	Abnatal J.	Abnatal J.	.	.	.	.	24/01/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2018	TI2118276: [APP TRT8] Evolução do aplicativo	Concluído	COSIS	Estillac F.	Aline S.	Alayr S.	.	.	.	.	23/01/2019
2019	TI2394172: [GPPEC] Acoplar funcionalidade de Remessa CNJ no GEP	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	.	.	.	.	22/01/2019
2018	TI2115197: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de Configuração e Ativos de	Concluído	COINS	Rafael C.	Rafael C.	Rafael C.	.	.	.	.	21/01/2019
Nenhum	TI2130473: [P]e-Calc] Atualização de Cálculo Externo	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Estillac F.	.	.	.	.	08/01/2019

Projetos

- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **06/12/2019**
- Data de ponto de corte do PRÓXIMO relatório: **31/12/2019**
