

# Portfólio de Projetos de TIC

Novembro de 2020

# Planejamento dos Projetos de TIC

Acumulado no ano




**PDTIC 2020:** projetos autorizados para serem executados em 2020 que constam na Portaria PRESI nº 375/2020.

**Não Previstos:** projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2020. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura “Nenhum” no campo PDTIC.


# Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Acumulado no ano

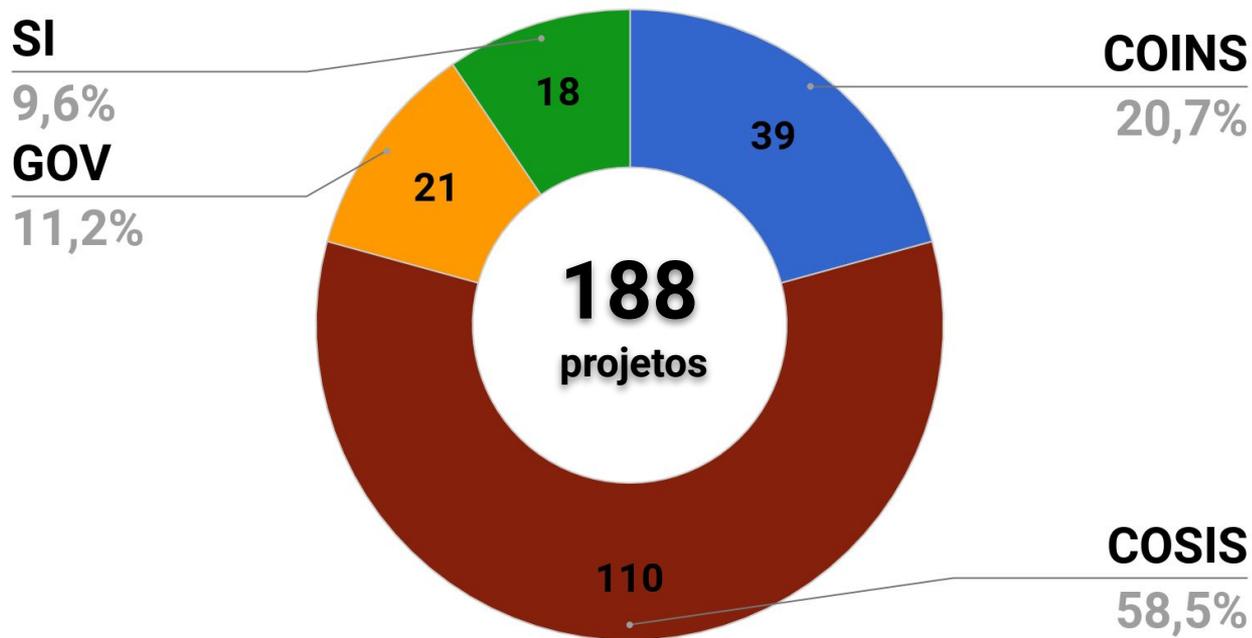

# Backlog de Projetos de TIC

## Situação atual

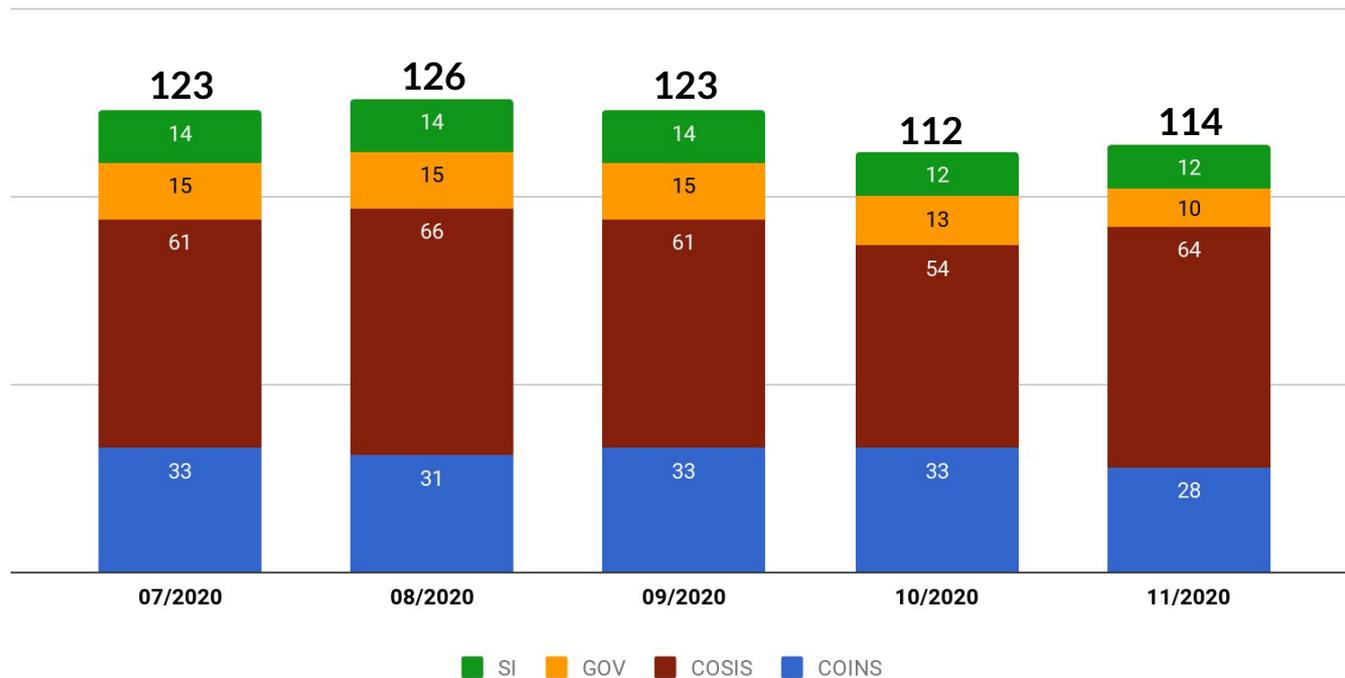

Novembro de 2020

**114**

Projetos Não Encerrados

Aumento do Backlog em  
relação ao mês anterior

# Backlog de Projetos de TIC

Situação atual



# Projetos do PDTIC 2020

Total de Projetos  
do PDTIC 2020

122

PROJETOS

Projetos Encerrados  
do PDTIC 2020

50

PROJETOS

Completo do  
PDTIC 2020

41 %

# Projetos Não Previstos em 2020

Total de Projetos  
Não Previstos  
Incluídos em 2020

66

PROJETOS

Total de Projetos  
Não Previstos  
Encerrados em 2020

24

PROJETOS

Completude  
Projetos Não Previstos

36%

# Total de Projetos da SETIN

**Encerrados  
em 2020**

**74**

**PROJETOS**

**Encerrados  
neste Mês**

**12**

**PROJETOS**

**Restam a  
Encerrar**

**114**

**PROJETOS**

# Projetos Paralisados por Pendência

Projetos Paralisados  
por Pendência

26

PROJETOS

Projetos Paralisados  
no Backlog

23%

dos PROJETOS

COINS

7

PROJETOS

COSIS

16

PROJETOS

SI

3

PROJETOS

# Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

PDTIC	Projeto	Grupo	Situação atual	Término Previsto	Gerente
2020	TI2729252: Adequação da Segurança da Informação para a LGPD	SI	Em Execução	29/10/2020	Alfredo G.
Nenhum	TI2850464: [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase II	COSIS.NUDES	Aprovação do Escopo	30/10/2020	Estillac F.
2020	TI2729250: Implantar sistema de controle de validade dos certificados digitais	SI	Em Detalhamento Técnico	16/11/2020	Alfredo G.
2020	TI2735011: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2021	GOV	Na Fila para Execução	20/11/2020	Diego M.
2020	TI2735022: Revisão (2020) do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	GOV	Na Fila para Execução	27/11/2020	Diego M.
2020	TI2735031: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2021	GOV	Em Execução	27/11/2020	Flávio R.
2020	TI2950987: Revisão 2020 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	COINS	Validação da Entrega Final	27/11/2020	José R.
2020	TI2729244: Treinamento e conscientização em Segurança da Informação	SI	Em Execução	30/11/2020	Alfredo G.
2020	TI2729261: Gestão de continuidade dos serviços essenciais de TIC	SI	Em Execução	30/11/2020	Alfredo G.
2020	TI2735026: Elaborar o PETIC 2021-2026	GOV	Especificação de Requisitos	30/11/2020	Flávio R.
Nenhum	TI2884918: [GPREC] Pagamento de precatórios fora da ordem cronológica	COSIS.NUDES	Validação da Entrega Final	30/11/2020	Renato S.
Nenhum	TI2867698: [Pje-Calc] Containerização dos Scripts de Banco	COSIS.NUDES	Especificação de Requisitos	30/11/2020	Estillac F.
Nenhum	TI2903770: [NUDES] Definição de Template Padrão de Projeto no Redmine	COSIS.NUDES	Na Fila para Execução	30/11/2020	Estillac F.

# Projetos Encerrados Neste Mês - Novembro de 2020

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	TI2726871: Revisão 2020 do processo de gerenciamento de Conhecimento	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	.	.	.	.	26/11/2020
2020	TI2731760: Aquisição e renovação do parque de scanners	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	.	.	.	.	26/11/2020
2020	TI2651225: [REDMINE] Desenvolvimento de Dashboards de Produtividade SETIN	Concluído	COSIS	Aline S.	Aline S.	Aline S.	.	.	.	.	24/11/2020
2020	TI2735019: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2020	Cancelado	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	.	23/11/2020
Nenhum	TI2862788: [PJe] Implantação do módulo Pesquisa Textual	Concluído	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Herbet S.	Erik S.	Cesar T.	Abnatal J.	.	20/11/2020
Nenhum	TI2847605: [PJe-Cor] Implantação da solução	Cancelado	COSIS	Herbet S.	Victor G.	.	.	.	.	.	17/11/2020
Nenhum	TI2784486: [e-Gestão] Desenvolvimento do Extrator do GPrec	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	.	.	.	.	16/11/2020
2020	TI2735010: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2020	Cancelado	GOV	Diego M.	Diego M.	.	.	.	.	.	12/11/2020
2020	TI2735094: Revisão 2020 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	11/11/2020
2020	TI2726869: Revisão 2020 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível	Concluído	COINS	Durães J.	Thiago A.	Durães J.	.	.	.	.	09/11/2020
2020	TI2726870: Revisão 2020 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de	Concluído	COINS	Durães J.	Thiago A.	Durães J.	.	.	.	.	09/11/2020
Nenhum	TI2910397: Revisão 2020 do processo de gerenciamento de central de serviços	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	.	.	.	.	09/11/2020

# Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	TI2726871: Revisão 2020 do processo de gerenciamento de Conhecimento	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	.	.	.	.	26/11/2020
2020	TI2731760: Aquisição e renovação do parque de scanners	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	.	.	.	.	26/11/2020
2020	TI2651225: [REDMINE] Desenvolvimento de Dashboards de Produtividade SETIN	Concluído	COSIS	Aline S.	Aline S.	Aline S.	.	.	.	.	24/11/2020
2020	TI2735019: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2020	Cancelado	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	.	23/11/2020
Nenhum	TI2862788: [PJe] Implantação do módulo Pesquisa Textual	Concluído	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Herbet S.	Erik S.	Cesar T.	Abnatal J.	.	20/11/2020
Nenhum	TI2847605: [PJe-Cor] Implantação da solução	Cancelado	COSIS	Herbet S.	Victor G.	.	.	.	.	.	17/11/2020
Nenhum	TI2784486: [e-Gestão] Desenvolvimento do Extrator do GPrec	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	.	.	.	.	16/11/2020
2020	TI2735010: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2020	Cancelado	GOV	Diego M.	Diego M.	.	.	.	.	.	12/11/2020
2020	TI2735094: Revisão 2020 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	11/11/2020
2020	TI2726869: Revisão 2020 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível	Concluído	COINS	Durães J.	Thiago A.	Durães J.	.	.	.	.	09/11/2020
2020	TI2726870: Revisão 2020 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de	Concluído	COINS	Durães J.	Thiago A.	Durães J.	.	.	.	.	09/11/2020
Nenhum	TI2910397: Revisão 2020 do processo de gerenciamento de central de serviços	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	.	.	.	.	09/11/2020
Nenhum	TI2850137: [COSIS] Revisão do processo de sustentação de software	Concluído	COSIS	Diego V.	Victor G.	Diego V.	.	.	.	.	23/10/2020
Nenhum	TI2931095: [COSIS] Revisão do processo de desenvolvimento de software	Concluído	COSIS	Estillac F.	Estillac F.	Estillac F.	.	.	.	.	22/10/2020
2020	TI2736563: [ORACLE] Migrar bancos de desenvolvimento e homologação para RAC com dois	Cancelado	SeBAD	Daniel O.	Abnatal J.	.	.	.	.	.	21/10/2020
2020	TI2118645: [PostgreSQL] Separação do cluster de dados do PJe	Cancelado	SeBAD	Anderson M.	Abnatal J.	Anderson M.	Abnatal J.	.	.	.	20/10/2020
Nenhum	TI2912709: [COGES] Implantação do Painel da Meta 9	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	Diego V.	Guido A.	.	.	16/10/2020
2020	TI2735024: IGov - CNJ 2020	Concluído	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Flávio R.	.	.	.	.	13/10/2020

# Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	TI2730106: Atualização de segurança dos notebooks corporativos	Concluído	SI	Alfredo G.	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	09/10/2020
2020	TI2735021: Revisão anual (2020) do processo de Gestão do Plano de Capacitação	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Diego M.	Leonardo F.	.	.	09/10/2020
2020	TI2436227: [GEC] Integração com o SIGEP - Recuperação de dados de pessoal	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Alexandre A.	.	.	.	.	06/10/2020
2020	TI2843764: [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase I	Concluído	COSIS	Estillac F.	Aline S.	Vitor P.	Sandro M.	.	.	.	02/10/2020
Nenhum	TI2867694: [PJe-Calc] Migração para JBoss Wildfly	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	.	.	.	.	29/09/2020
Nenhum	TI2890637: [COSIS] Módulo Centralizador de Integrações	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Sandro M.	Vitor P.	.	.	.	29/09/2020
2020	TI2118541: [PostgreSQL] Restaurar monitoramento através do Zabbix	Concluído	SeBAD	Abnatal J.	Daniel O.	Anderson M.	.	.	.	.	28/09/2020
Nenhum	TI2516955: [BANEX] Registro do número de processo na pesquisa realizada	Cancelado	COSIS	Renan F.	Victor G.	.	.	.	.	.	28/09/2020
Nenhum	TI2907012: [Círio 2020] Desenvolvimento de hot site para a Campanha do Círio	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Aline S.	Reinaldo C.	.	.	.	.	28/09/2020
2020	TI2238097: [GECJ] Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ por acúmulo	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Avelino P.	.	.	.	.	09/09/2020
2020	TI2380037: [PJe-Calc] Desenvolvimento de Assinatura de Sentença Líquida	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	.	.	.	.	09/09/2020
2020	TI2380032: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Homologação de Cálculo	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	.	.	.	.	09/09/2020
Nenhum	TI2610785: [RECAD] Desenvolvimento do Sistema de Recadastramento de Estagiários e Cedidos	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Aline S.	.	.	.	.	.	09/09/2020
Nenhum	TI2793717: [GPPEC] Conformidade com a Resolução CNJ 303/2019 - FASE II	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Felipe M.	.	.	.	09/09/2020

# Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
Nenhum	TI2736723: Workshop de Projetos e Metas da SETIN para 2020	Cancelado	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	.	.	.	.	.	02/09/2020
Nenhum	TI2837869: [DataJud] Base Nacional de Dados do Poder Judiciário - FASE I	Concluído	COSIS	Diego V.	Victor G.	Alexsandro S.	Reinaldo C.	Diego V.	.	.	28/08/2020
2020	TI2730235: Elaboração de parecer técnico relacionado a opções de garantia de suporte	Concluído	COINS	Rafael C.	Erik S.	Erik S.	Antonio F.	Alison S.	Rafael C.	.	12/08/2020
Nenhum	TI2789880: [SIGEC] Implantação do Sistema de Gestão de Contratos	Concluído	COSIS	Geraldo B.	Victor G.	Geraldo B.	.	.	.	.	11/08/2020
2020	TI2552081: Criação de um Processo de Atualização de Segurança dos Servidores de	Concluído	COINS	Erik S.	Rafael C.	Erik S.	Antonio F.	.	.	.	03/08/2020
2020	TI2584839: Desenvolvimento de um Assistente Virtual para Central de Serviços de TI	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	.	.	.	.	29/07/2020
2020	TI2734893: Padronização de inicialização das aplicações dos ambientes de produção, homologação e	Concluído	COINS	Erik S.	Antonio F.	Erik S.	Antonio F.	.	.	.	29/07/2020
2020	TI2575545: Sistema de Monitoramento do Plano de Contratações do TRT8	Cancelado	GOV	Diego M.	Victor G.	Diego M.	Flávio R.	Leonardo F.	.	.	28/07/2020
2020	TI2263129: [Progecom] Implantação do Programa de Gestão de Pessoas por Competências	Concluído	COSIS	Geraldo B.	Vitor P.	Daniel C.	.	.	.	.	14/07/2020
Nenhum	TI2799411: [AutoCCLE] Customização e implantação de nova versão	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Marcos O.	.	.	.	.	30/06/2020
Nenhum	TI2831159: [CadastradorCCLE] Disponibilização de ferramenta de automatização do CCLE no Pje	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Sandro M.	.	.	.	.	30/06/2020
2020	TI2763163: Migração do Pje para a nova arquitetura em containers	Concluído	COINS	Antonio F.	Rafael C.	George F.	Marcelo A.	Antonio F.	Erik S.	Alison S.	29/06/2020

# Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	TI2736566: [ORACLE] Realizar teste de atualização para a versão 2019	Concluído	SeBAD	Daniel O.	Abnatal J.	Daniel O.	.	.	.	.	23/06/2020
Nenhum	TI2772030: [APT] Registro da Conversão de Processos em Lote	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Ronald P.	Diego V.	.	.	.	19/06/2020
Nenhum	TI2339257: [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase I	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Aline S.	.	.	.	.	.	08/06/2020
Nenhum	TI2758353: [SEGEP] Concurso de Remoção Interna de Servidores - Online	Concluído	COSIS	Aline S.	Aline S.	Aline S.	Vitor P.	.	.	.	04/06/2020
Nenhum	TI2736522: [Portal GovTI] Migração do conteúdo do Portal GovTI para um Gerenciador	Cancelado	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	.	.	.	.	.	02/06/2020
Nenhum	TI2798911: [PJe-Calc] Atualização de Arquitetura	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	.	.	.	.	22/05/2020
2020	TI2593626: [Acervo Eletrônico] Implantação do Sistema Acervo Eletrônico	Cancelado	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Joel O.	.	.	.	.	20/05/2020
2020	TI2676635: [SIGEP] Migração das rotinas de extração de dados gerenciais	Concluído	COSIS	Rogério P.	Victor G.	Rogério P.	.	.	.	.	20/05/2020
2020	TI2683019: Implantação do Processo de Gerenciamento de Liberações	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Thiago A.	Durães J.	Paulo L.	.	14/05/2020
2020	TI2735030: IGGP - TCU 2020	Cancelado	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	.	14/05/2020
Nenhum	TI2763536: [GPREC] Conformidade com a Resolução CNJ 303/2019 - FASE I	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Felipe M.	.	.	.	08/05/2020
2020	TI2005293: Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudança	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Leonardo F.	.	.	.	27/04/2020
2020	TI2119184: [SIGEP] Migração de dados do MENTORH	Concluído	COSIS	Guido A.	Victor G.	Daniel O.	Guido A.	.	.	.	31/03/2020
2020	TI2729239: Planejamento da aquisição de certificados WildCard	Concluído	SI	Alfredo G.	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	23/03/2020
2020	TI2115507: [GPREC] Desenvolvimento do aprimoramento do registro de pagamentos fora da ordem	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	11/03/2020

# Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	TI2569167: [PAS] Desenvolvimento de Dashboards Gerenciais do Plano de Saúde	Concluído	COSIS	Aline S.	Aline S.	Aline S.	Vitor P.	Guido A.	.	.	06/03/2020
2020	TI2591687: [Garimpo] Implantação do Sistema de identificação de crédito trabalhista em processos	Concluído	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Marcos O.	.	.	.	.	02/03/2020
2020	TI2428044: [e-Gestão] Integração com o SIGEP - Implementação da carga de dados	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	.	.	.	.	28/02/2020
2020	TI2729228: Planejamento da prorrogação do contrato de suporte do Firewall	Concluído	SI	Alfredo G.	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	27/02/2020
2020	TI2685973: [e-Gestão] Evolução do Extrator do Legado para a versão 2.0	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	Diego V.	.	.	.	21/02/2020
2020	TI2754357: [PJe-Calc] Adaptação do Sistema para Nova Previdência	Concluído	COSIS	Sandro M.	Victor G.	Sandro M.	.	.	.	.	20/02/2020
2020	TI2119157: [FolhaWeb] Implantação do Sistema de Folha de Pagamento	Concluído	COSIS	Alex S.	Alex S.	Alex S.	.	.	.	.	19/02/2020
2020	TI2735014: Relatório Anual 2019 de Gestão (Prestação de contas TCU)	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	Diego M.	Flávio R.	.	.	12/02/2020
2020	TI2757562: [TrabalhoInfantil] Desenvolvimento de hotsite para a II Marcha de Belém contra	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Reinaldo C.	Reinaldo C.	.	.	.	.	07/02/2020
2020	TI2503310: [GEC] Desenvolvimento dos quadros do IGest	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Diego V.	Alexandre A.	.	.	.	05/02/2020
2020	TI2652094: [GEC] Desenvolvimento da Integração com Pje e Hórus	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Diego V.	Alexandre A.	.	.	.	05/02/2020
2020	TI2749253: Aquisição de Certificados Digitais 2020	Concluído	SI	Alfredo G.	Thiago G.	Thiago G.	Márcel M.	.	.	.	30/01/2020
Nenhum	TI2532941: Migração de Servidor DHCP Secundário	Concluído	COINS	Rafael C.	Lindalvo N.	Lindalvo N.	Fernando S.	Fabricao P.	.	.	27/01/2020

# Informações Extras

- PDTIC 2020 - Portaria PRESI N° 375/2020
- Data de ponto de corte deste relatório: **11/12/2020**
