# Portfólio de Projetos de TIC

## Setembro de 2022

Secretaria de Tecnologia da Informação

Tribunal Regional do Trabalho
8ª Região | Pará e Amapá

# Planejamento e Execução dos Projetos do PDTIC 2021-2022

## Planejamento

PDTIC 2021-2022

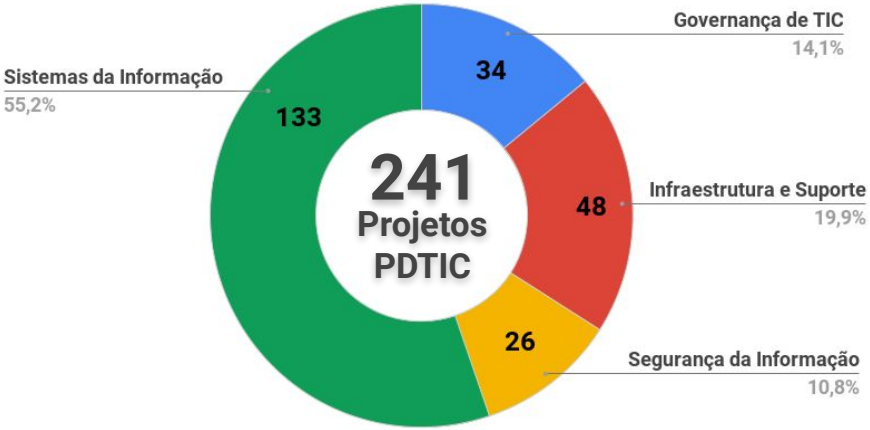


## Execução

Situação Atual

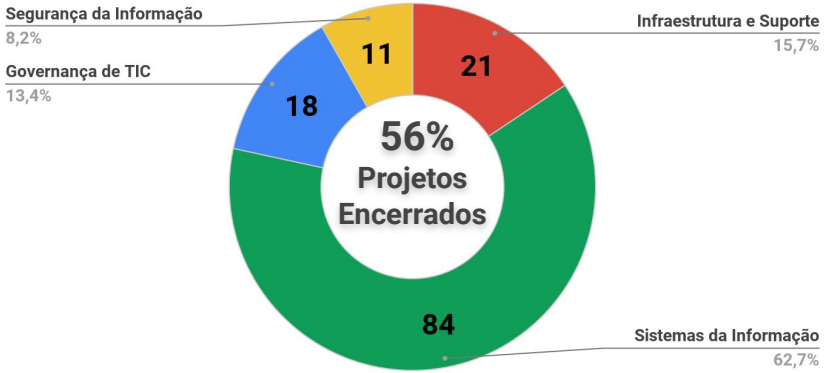


| Área/Situação | Encerrados | Para Execução |
|---|---|---|
| Sistemas da Informação | 84 | 49 |
| Infraestrutura e Suporte | 21 | 27 |
| Segurança da Informação | 11 | 15 |
| Governança de TIC | 18 | 16 |
| SETIN (Total) | 134 | 107 |

# Meta PDTIC 2021-2022

| Execução<br>Mês Anterior | Execução<br>Mês Atual | Meta PDTIC<br>2021-2022 |
|---|---|---|
| 53% | 56% | 60% |
| PROJETOS ENCERRADOS | PROJETOS ENCERRADOS | PROJETOS ENCERRADOS |

# Projetos Inicialmente Não Previstos no PDTIC

| Total de Projetos Não Previstos | Total de Projetos Não Previstos Encerrados | Restam a finalizar |
|---|---|---|
| 27 PROJETOS | 12 PROJETOS | 15 PROJETOS |

# Backlog de Projetos de TIC

## Situação atual

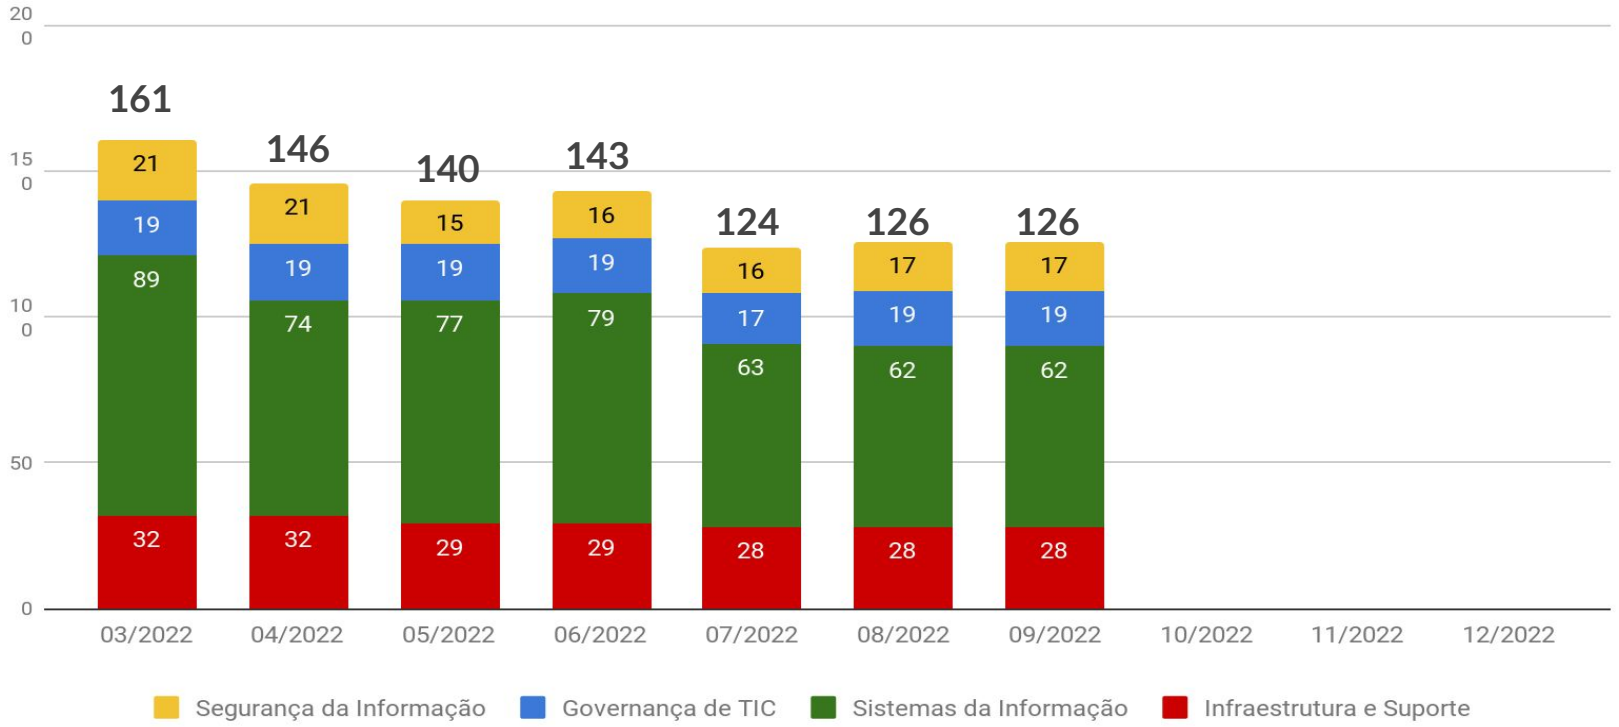

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

| COINS | COSIS | GOV | SI |
|---|---|---|---|
| 5 PROJETOS | 16 PROJETOS | 5 PROJETOS | 3 PROJETO |

Informação obtida através da ferramenta Strategic Adviser

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

COINS

| Código | Projeto | Gerente do Projeto | Situação Atual | Término Previsto |
|---|---|---|---|---|
| TI2987523 | Solução de descarte seguro de mídias | PAULO LOBATO | Em Execução | 31/08/2022 |
| TI2438424 | Integração entre G-Suite e Active Directory | LINDALVO NETO | Paralisado por Pendência | 27/06/2022 |
| TI2987512 | Migração do drive de rede para nuvem | LINDALVO NETO | Aguardando Planejamento | 30/09/2022 |
| TI2987527 | Construção de enlaces de fibra ótica | MARCELO DE OLIVEIRA | Aguardando Planejamento | 29/07/2022 |
| TI2997800 | Implantar o processo de Gerenciamento de Evento de TI | FABRICIO PINHEIRO | Aprovação do Escopo | 07/07/2022 |

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

COSIS

| Código | Projeto | Gerente do Projeto | Situação Atual | Término Previsto |
|---|---|---|---|---|
| TI0000874 | [MIRA] Assistente Virtual da JT8 | MÔNICA GUIMARÃES | Na Fila para Execução | 29/11/2021 |
| TI0000846 | [SUSTENTABILIDADE] Sistema de apuração de indicadores de sustentabilidade | ESTILLAC FILHO | Em Homologação | 30/09/2022 |
| TI0000845 | [MIRA] Desenvolvimento de solução para o Portal Institucional | ESTILLAC FILHO | Em Homologação | 19/09/2022 |
| TI2990200 | [PostgreSQL] Manutenção do cluster principal do PJe - 2022 | ANDERSON MAIA | Na Fila para Execução | 29/07/2022 |
| TI2995340 | [e-Social] Implantação do sistema - Eventos não periódicos - FASE II | ROGÉRIO PIMENTEL | Aguardando Planejamento | 01/11/2021 |
| TI2995218 | [Site PAS] Migração do Site do PAS para o Drupal 9 | DIEGO VALDEZ | Especificação de Requisitos | 31/08/2022 |
| TI2252727 | [Painel de Consumo] Desenvolvimento de dashboards de materiais de consumo e permanentes | ROGÉRIO PIMENTEL | Especificação de Requisitos | 30/06/2021 |
| TI2999045 | [SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento | ROGÉRIO PIMENTEL | Paralisado por Pendência | 31/05/2021 |
| TI2999040 | [SIGEP-SIGS] Implantação do Sistema de Gestão em Saúde | ROGÉRIO PIMENTEL | Especificação de Requisitos | 15/10/2021 |
| TI2989334 | [POWERBI] Construção dos Dashborads do PAS | MÔNICA GUIMARÃES | Na Fila para Execução | 23/07/2022 |
| TI2986166 | [SEGEP] Desenvolvimento e automatização dos relatórios de gestão | ROGÉRIO PIMENTEL | Aguardando Planejamento | 29/04/2022 |
| TI2903770 | [NUDES] Definição de Template Padrão de Projeto no Redmine | ESTILLAC FILHO | Em Execução | 30/09/2022 |
| TI2999103 | [COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2022 | ESTILLAC FILHO | Em Execução | 30/09/2022 |
| TI2676860 | [COSIS] Definição da arquitetura de desenvolvimento e seu processo de gerenciamento | ESTILLACFILHO | Especificação de Requisitos | 23/09/2022 |
| TI3033196 | [TRT8] Iniciativa de inovação 2022 - Archetype de Desenvolvimento | ESTILLACFILHO | Em Execução | 30/09/2022 |
| TI3005821 | [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.11.0 | ESTILLAC FILHO | Em Execução | 23/09/2022 |

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

GOV

| Código | Projeto | Gerente do Projeto | Situação Atual | Término Previsto |
|---|---|---|---|---|
| TI3003738 | Revisão anual (2021) do processo de Gestão do Plano de Capacitação dos Servidores de TIC | DIEGO MORAES | Em Execução | 30/06/2022 |
| TI3003764 | IGGP - TCU 2022 | FLAVIO RAMOS | Aguardando Planejamento | 11/04/2022 |
| TI3003759 | Pesquisa de satisfação de usuários internos 2022 | DIEGO MORAES | Na Fila para Execução | 02/09/2022 |
| TI3003736 | iGov - CNJ 2022 | LEONARDO FELICIANO | Aprovação do Escopo | 09/09/2022 |
| TI3004200 | Elaboração do Plano de Transformação Digital proposto pelo CNJ | DIEGO MORAES | Em Execução | 31/08/2022 |

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# SEG

| Código | Projeto | Gerente do Projeto | Situação Atual | Término Previsto |
|---|---|---|---|---|
| TI2991165 | Contratação de Solução para Análise de Vulnerabilidades | ALFREDO GONÇALVES | Na Fila para Execução | 01/07/2022 |
| TI2991149 | Gestão de continuidade dos serviços essenciais de TIC | ALFREDO GONÇALVES | Aguardando Planejamento | 30/07/2022 |
| TI0000710 | Implementação de política de acesso para a solução do PAM (Cyberark) para Endpoints | ALFREDO GONÇALVES | Em Execução | 19/08/2022 |

# Projetos Encerrados

Julho/2022

| Código | Projeto | Área | Gerente do Projeto | Analista de Req. | Executor 1 | Executor 2 | Situação Atual | Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI0000850 | [BANEX] Desenvolvimento de Módulo de Vistas de Documentos | COSIS | SANDRO MONTEIRO | SANDRO MONTEIRO | SANDRO MONTEIRO | | Concluído | 08/07/2022 |
| TI0000829 | [FROTA] Evolução do Sistema FROTA para expansão ao interior | COSIS | ESTILLAC FILHO | ALINE SILVA | LIVIO DOURADO | | Concluído | 25/07/2022 |

# Projetos Encerrados

Junho/2022

| Código | Projeto | Área | Gerente | Analista | Executor | Executor 2 | Executor 3 | Situação | Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI2730346 | Implantação de monitoramento do ambiente de microsserviços | COINS | RAFAEL DA CRUZ | RAFAEL DA CRUZ | ANTONIO FERREIRA | FRANCISCO DA SILVA | CESAR TABATA | Concluído | 07/06/2022 |
| TI2987536 | Adoção do Redmine na SeINF | COINS | RAFAEL DA CRUZ | RAFAEL DA CRUZ | ANTONIO FERREIRA | FRANCISCO DA SILVA | CESAR TABATA | Concluído | 07/06/2022 |
| TI2997776 | Revisão 2021 do processo de backup e restore de dados | COINS | CESAR TABATA | CESAR TABATA | CESAR TABATA | | | Concluído | 08/06/2022 |
| TI2730219 | Atualização do parque de videoconferência | COINS | RAFAEL DA CRUZ | RAFAEL DA CRUZ | JADIEL MOTA | RENAN DINIZ | LINDALVO NETO | Concluído | 08/06/2022 |
| TI2945765 | [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.10.0 | COSIS | ESTILLAC FILHO | ESTILLAC FILHO | ESTILLAC FILHO | SANDRO MONTEIRO | | Concluído | 20/06/2022 |
| TI0000847 | [PJe] Cálculos em Embargos | COSIS | ESTILLAC FILHO | RENAN FERREIRA | RENAN FERREIRA | | | Concluído | 28/06/2022 |
| TI0000843 | [PJe-Calc] Containerização dos Scripts de Banco | COSIS | ESTILLAC FILHO | ESTILLAC FILHO | SANDRO MONTEIRO | | | Concluído | 28/06/2022 |
| TI0000839 | [GPREC] Rotina de lançamento de movimentos no PJe | COSIS | ESTILLAC FILHO | VICTOR GONÇALVES | FELIPE MAIA | | | Concluído | 28/06/2022 |
| TI2228509 | [PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau | COSIS | HERBET DA SILVA | VICTOR GONÇALVES | MARCOS OHASHI | | | Concluído | 28/06/2022 |
| TI0000841 | [MIRA] Desenvolvimento - Fase II | COSIS | ESTILLAC FILHO | ABNATAL JUNIOR | PAULO DE CARVALHO | | | Concluído | 29/06/2022 |
| TI0000842 | [SARAIVA] Sistema de Autenticação do Serviço de Biblioteca via Keycloak | COSIS | ESTILLAC FILHO | RENAN FERREIRA | RENAN FERREIRA | | | Concluído | 29/06/2022 |

# Projetos Encerrados

Junho/2022

| Código | Projeto | Área | Gerente | Analista | Executor | Executor 2 | Executor 3 | Situação | Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI0000853 | [BANEX] Disponibilizar Solução em Container | COSIS | ESTILLAC FILHO | SANDRO MONTEIRO | SANDRO MONTEIRO | | | Concluído | 29/06/2022 |
| TI0000850 | [BANEX] Desenvolvimento de Módulo de Vistas de Documentos | COSIS | SANDRO MONTEIRO | SANDRO MONTEIRO | SANDRO MONTEIRO | | | Concluído | 08/07/2022 |

# Projetos Encerrados

Maio/2022

| Código | Projeto | Área | Gerente do Projeto | Analista de Req. | Executor 1 | Executor 2 | Situação Atual | Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI0000838 | [ID-PJ] Sistema de Identificação da Polícia Judicial | COSIS | ESTILLAC FILHO | ALINE SILVA | LIVIO DOURADO | | Concluído | 19/05/2022 |
| TI2995210 | [DataJud] Automatização de atualização da base local das TPU's | COSIS | DIEGO VALDEZ | DIEGO VALDEZ | LIVIO CARNEIRO | REINALDO CARVALHO | Concluído | 09/05/2022 |
| TI0000710 | Implementação de política de acesso para a solução do PAM (Cyberark) para Endpoints | SI | ALFREDO GONÇALVES | MÁRCIO SILVA | MÁRCEL MOTA | | Concluído | 13/05/2022 |
| TI2991162 | Implantação da Solução de PAM | SI | ALFREDO GONÇALVES | MÁRCEL MOTA | MÁRCEL MOTA | | Concluído | 10/05/2022 |
| TI2730127 | Avaliação de Riscos de TIC | SI | ALFREDO GONÇALVES | THIAGO GILLA | THIAGO GILLA | | Concluído | 13/05/2022 |
| TI2991170 | Elaboração e Revisão 2021 de Políticas e Normas de Segurança da Informação | SI | ALFREDO GONÇALVES | THIAGO GILLA | THIAGO GILLA | | Concluído | 13/05/2022 |
| TI3000231 | Elaboração e Revisão 2021 dos Processos da Segurança da Informação | SI | ALFREDO GONÇALVES | THIAGO GILLA | THIAGO GILLA | | Concluído | 13/05/2022 |
| TI2991182 | Conformidade da SETIN à LGPD no processo do TRT8 | SI | ALFREDO GONÇALVES | THIAGO GILLA | THIAGO GILLA | | Concluído | 13/05/2022 |

# Projetos Encerrados

Abril/2022

| Código | Projeto | Área | Gerente do Projeto | Executor 1 | Executor 2 | Executor 3 | Situação Atual | Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI2552393 | [Moodle] Atualização da ferramenta para a versão mais estável e conformidade de layout | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ | REINALDO CARVALHO | | | Concluído | 27/04/2022 |
| TI2305680 | [APT] Desenvolvimento do cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ | | | | Cancelado | 27/04/2022 |
| TI2703382 | [e-Gestão] Reformulação da Carga de Litigantes | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ | ALEXSANDRO SANTOS | | | Concluído | 27/04/2022 |
| TI2988812 | [Painel de Produtividade] Desenvolvimento de Painel de Produtividade COVID-19 | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ | | | | Cancelado | 11/04/2022 |
| TI2995207 | [DataJud] Aprimoramento da rotina de carga de dados do APT para base de dados local | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ | ALEXSANDRO SANTOS | DIEGO VALDEZ | REINALDO CARVALHO | Concluído | 01/04/2022 |
| TI2486277 | [COSIS] Migração dos serviços do servidor Arara | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | RENAN FERREIRA | | | Concluído | 28/04/2022 |
| TI2720685 | [GPREC] Desenvolvimento do ofício requisitório de RPV | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | | | | Cancelado | 27/04/2022 |
| TI3033064 | [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase IV | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | LIVIO DOURADO | | | Concluído | 28/04/2022 |
| TI2945760 | [COSIS] Revisão Anual do Processo de Sustentação - 2021 | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | | | | Cancelado | 27/04/2022 |
| TI2763537 | [GPREC] Integração com o PJe - Geração de Ofício Requisitório | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | | | | Cancelado | 27/04/2022 |
| TI2551538 | [CEJUSC] Ajustes no painel eletrônico - Implementação de Salas de Apoio | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | | | | Cancelado | 27/04/2022 |
| TI2999285 | [APP-TRT8] Refatoração do aplicativo | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | PAULO CARVALHO | | | Concluído | 28/04/2022 |
| TI2945759 | [COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2021 | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | ESTILLAC FILHO | | | Concluído | 28/04/2022 |
| TI2945764 | [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.9.0 | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | ESTILLAC FILHO | SANDRO MONTEIRO | | Concluído | 28/04/2022 |

# Projetos Encerrados

Abril/2022

| Código | Projeto | Área | Gerente do Projeto | Executor 1 | Executor 2 | Executor 3 | Situação Atual | Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI2968818 | [GPREC] Melhorias Arquitetural (Docker/Wildfly/Sonar) | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | SOLIMAR SILVA | FELIPE MAIA | | Concluído | 28/04/2022 |
| TI3011875 | [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.14.0 | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | | | | Cancelado | 27/04/2022 |
| TI3033182 | [TRT8] Iniciativa de inovação - 2021 | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO | SANDRO MONTEIRO | AVELINO PENA | | Concluído | 28/04/2022 |
| TI2998816 | Revisão 2021 da base de conhecimento da SeSUP | Infraestrutura e Suporte | SIMONNE CALLEGARIO | SIMONNE CALLEGARIO | | | Concluído | 06/04/2022 |
| TI3003746 | Relatório Anual 2021 de Gestão (Prestação de contas TCU) | Governança de TIC | DIEGO MORAES | DIEGO MORAES | LEONARDO FELICIANO | FLAVIO RAMOS | Concluído | 01/04/2022 |

# Planejamento e Execução dos Projetos do PTD

## Planejamento

PTD 2021-2022

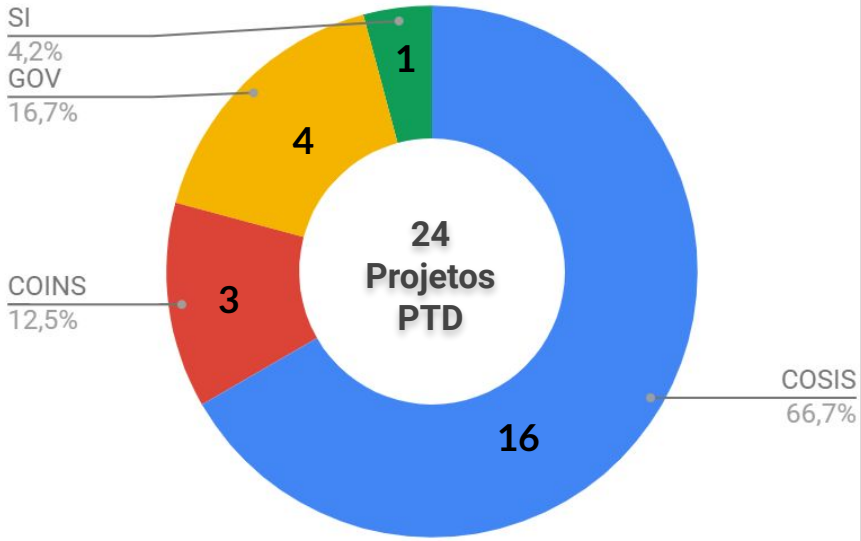


## Execução

Situação Atual

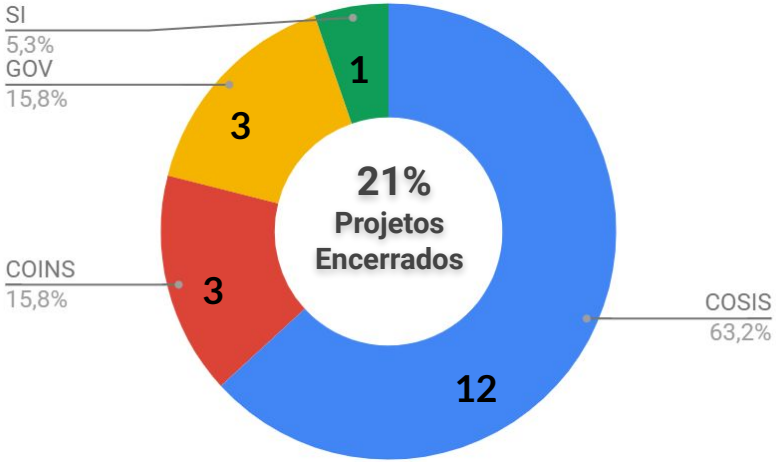


| Área/Situação | Encerrados | Para Execução |
|---|---|---|
| Sistemas da Informação | 4 | 12 |
| Infraestrutura e Suporte | 0 | 3 |
| Segurança da Informação | 0 | 1 |
| Governança de TIC | 1 | 3 |
| SETIN (Total) | 5 | 19 |

# Projetos Concluídos e Atrasados PTD

| Total de Projetos Concluídos | Total de Projetos Atrasados | Restam a finalizar |
|---|---|---|
| 5 PROJETOS | 5 PROJETOS | 19 PROJETOS |

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# PTD

| Código | Projeto | Gerente do Projeto | Situação Atual | Término Previsto |
|---|---|---|---|---|
| TI2987512 | Migração do drive de rede para nuvem | LINDALVO NETO | Aguardando Planejamento | 30/09/2022 |
| TI3033196 | [TRT8] Iniciativa de inovação 2022 - Archetype de Desenvolvimento | ESTILLAC FILHO | Em Execução | 30/09/2022 |
| TI0000846 | [SUSTENTABILIDADE] Sistema de apuração de indicadores de sustentabilidade | ESTILLAC FILHO | Em Homologação | 30/09/2022 |
| TI0000874 | [MIRA] Assistente Virtual da JT8 | MÔNICA GUIMARÃES | Na Fila para Execução | 29/11/2021 |
| TI0000845 | [MIRA] Desenvolvimento de solução para o Portal Institucional | ESTILLAC FILHO | Em Homologação | 19/09/2022 |

# Projetos

- O **Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br>** DEVE ser copiado aos e-mails relativos à projetos.

- Data de ponto de corte deste relatório: **14/10/2022**
